République du Cameroun
Paix – Travail – Patrie

Ministère de l'Economie de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

----
Secrétariat Général

Programme National de Développement Participatif

Republic of Cameroon
Peace – Work - Fatherland

Ministry of Economy, Planning, and Regional Development

General Secretary

National Community Driven Development Program

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DU PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

Execice 2008

Janvier 2009

Sommaire

SOMMAIRE **2**

SIGLES ET ABREVIATIONS **4**

RESUME EXECUTIF **5**

INTRODUCTION **6**

CHAPITRE I **7**

RAPPEL DES PREVISIONS DE L'EXERCICE 2008 ..... **7**

1. OBJECTIFS DU PROGRAMME POUR L'EXERCICE 2008 7
2. PLAN DE COUVERTURE 7
3. PROGRAMME DE TRAVAIL ET BUDGET PAR COMPOSANTE 8

CHAPITRE II **11**

PRINCIPALES REALISATIONS DE L'EXERCICE 2008 ..... **11**

1. INDICATEURS DE PERFORMANCE ..... - 12 -
2. INDICATEURS DECLENCHEURS DE PHASE ..... - 13 -

2. PRINCIPALES REALISATIONS PAR COMPOSANTE ..... **- 14 -**

1- COMPOSANTE 1 : AFDCR ..... - 14 -
Dans le secteur de l'éducation ..... *- 18 -*
Dans le secteur de la Santé ..... *- 19 -*
Dans le secteur de l'hydraulique ..... *- 19 -*
Dans le secteur du Transport ..... *- 20 -*
Dans le secteur de l'électrification ..... *- 20 -*
Dans le secteur des Infrastructures de développement économique ..... *- 20 -*
2- COMPOSANTE 2 : APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE DECENTRALISATION ..... - 22 -
2-1 Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées ..... *- 22 -*
2-2 Etude sur l'évaluation des besoins en personnel communal en vue de l'élaboration d'un tableau type des emplois communaux ..... *- 22 -*
2-3 Mise en application du nouveau plan comptable sectoriel ..... *- 22 -*
2-4 Etude sur la gouvernance locale ..... *- 23 -*
2-5 Recrutement des Agents Communaux ..... *- 23 -*
2-6 Renforcement des capacités des CTD ..... *- 23 -*
2-7 Impacts enregistrés à travers la composante B ..... *- 24 -*
3- COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS ..... - 24 -
3-1 Accompagnement des communes 2005 -2006 par les OAL ..... *- 24 -*
3-2. Sélection des OAL pour les communes 2007 ..... *- 25 -*
3.4 Impacts enregistrés au titre de la composante ..... *- 27 -*
4- COMPOSANTE 4 : COORDINATION, GESTION, SUIVI EVALUATION, COMMUNICATION. ..... - 27 -
4-1 Coordination ..... *- 28 -*
4-2 Gestion administrative ..... *- 28 -*
4-3 Gestion financière ..... *- 28 -*
4-4 Suivi Evaluation ..... *- 30 -*
4-5 Aspects socio-environnementaux ..... *- 30 -*
4.5.1. Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP) ..... *- 30 -*
4.5.2. Aspects environnementaux ..... *- 32 -*
4-6. Communication ..... *- 32 -*
5- AUTRES DOSSIERS ..... - 32 -
5.1. Projet de renforcement des capacités des communautés rurales en évaluation et gestion durable des plantes médicinales ..... *- 32 -*
5.2. Projet de Gestion Durable des Terres (PGDT) ..... *- 34 -*
ADAMAOUA ..... - 35 -
EXTREME NORD ..... - 35 -
NORD ..... - 35 -
OUEST ..... - 36 -
SUD ..... - 36 -
7. ANNEXES ..... - 42 -

SITE 01 – CELLULE NATIONALE DE COORDINATION ..... **- 43 -**

SITE 02 – CELLULE PROVINCIALE DE L'ADAMAOUA ..... - 48 -

COMPOSANTE 2 : APPUI AUX COMMUNES DANS LE PROCESSUS PROGRESSIF DE ..... - 55 -
DECENTRALISATION ..... - 55 -
COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS ..... - 55 -
COMPOSANTE 4 : COORDINATION, GESTION, SUIVI – EVALUATION COMMUNICATION ..... - 57 -
D-1 COORDINATION DU PROGRAMME ..... - 57 -
D-2 Gestion du programme ..... - 57 -
D- 3 Suivi Evaluation ..... - 57 -

SITE 05 : CELLULE PROVINCIALE E L'EXTREME-NORD ..... - 67 -

SITE 07 : CELLULE PROVINCIALE DU NORD 85

LES MISSIONS DE SUIVI DES CADRES DE LA CPP SE RESUMENT AU SUIVI DES ACTIVITES DU PROGRAMME QUE SONT LE SUIVI DE L'EXECUTION DES MICROPROJETS, CELUI DES ACTIVITES DES OALS AINSI QUE CELLE DES AGENTS COMMUNAUX 91

SITE 09 – CELLULE PROVINCIALE DE L'OUEST ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.

SITE 10 : CELLULE PROVINCIALE DU SUD 92

Annexe 3 : Liste des microprojets mis en œuvre 101

SIGLES ET ABREVIATIONS

AER	Agence d'Electrification Rurale
AFD	Agence Française de Développement
AFDCR	Appui Financier au Développement des Communautés Rurales
AVZ	Agent de Vulgarisation de Zone
BM	Banque mondiale
CAA	Caisse Autonome d'Amortissement
CANADEL	Centre d'Accompagnement de Nouvelles Alternatives de Développement Local
CC	Comité de Concertation de Base
CCS/PPTE	Comité Consultatif et de Suivi de la gestion des ressources PPTE
CEFAM	Centre de Formation de l'Administration Municipale
CNLS	Comité National de Lutte contre le Sida
CNOP	Comité National d'Orientation et de Pilotage
CNC	Cellule Nationale de Coordination
CPAC	Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Communal
CPAP	Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Provincial
CPP	Cellule Provinciale du Programme
CPAP	Comité Paritaire d'Approbation et de supervision de niveau Provincial
DAO	Dossier d'Appel d'Offre
DSRP	Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
ECAM	Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
EMF	Etablissement de Micro Finance
FEICOM	Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention intercommunale
FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial
FIDA	Fonds International pour le Développement Agricole
GEF	Global Environment Facility
GIC	Groupe d'Initiative Commune
GIE	Groupement d'Intérêt Economique
GTZ	Coopération Technique Allemande
IDA	International Development Association
JSDF	Japan Social Development fund
MC²	Mutuelle Communautaire de Croissance
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINATD	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINEDUB	Ministère de l'Education de Base
MINEP	Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature
MINFI	Ministère de l'Economie et des Finances
MINEPIA	Ministère de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales
MINESEC	Ministère des Enseignements Secondaires
MINFOF	Ministère de la Forêt et de la faune
MINEE	Ministère de l'Energie et de l'Eau
MINEPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MINTP	Ministère des Travaux Publics
MINT	Ministère des Transports
OAL	Organismes d'Appui Local
ONG	Organisation non Gouvernementale
PADC	Projet d'Appui au Développement Communautaire
PADDL	Le Programme d'Appui à la Décentralisation et au Développement Local
PASE	Projet d'Appui au Secteur Educatif
PDL	Plan de Développement Local
PDC	Plan de Développement Communal
PGDT	Projet de Gestion Durable des Terres
PMLS	Programme Multisectoriel de Lutte contre le Sida
PNDP	Programme National de Développement Participatif
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PPTE	Pays Pauvres Très Endettés
PTBA	Plan de Travail et Budget Annuel
PRSSAC	Programme de Réforme du Sous Secteur du Transport Aérien au Cameroun
UNESCO	Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture
UPP	Unité de Planification Participative

Résumé Exécutif

L'année 2008, marque la fin de la 1ère phase de mise en œuvre du Progamme après quatre ans d'exécution effective. Une enquête interne conduite par l'équipe du PNDP, en prélude à une évaluation indépendante a mis en évidence un niveau d'atteinte des résultats qui peut être jugé satisfaisant pour l'essentiel. En effet, les valeurs cibles de l'ensemble des indicateurs de fin de phase et celles de 8 des 9 déclencheurs ont été atteintes en fin 2008.

Déclinés suivant les composantes de mise en œuvre, les résultats du Programme au 31/12/2008 se présentent ainsi qu'il suit :

Au titre de l'«Appui financier aux communautés rurales », 394 conventions ont été signées pour un montant de l'ordre de 10,3 milliards de FCFA. Le processus d'exécution de ces conventions a été finalisé pour, 204 microprojets, lesquels sont fonctionnels et ont permis d'améliorer sensiblement les conditions de vie de plus de 852837 bénéficiaires. A titre d'illustration, on peut citer pour le secteur hydraulique, le passage du nombre d'habitants par point d'eau de 860 à 382. Pour l'éducation, le taux de fréquentation scolaire est passé de 92,4% à 93,4% ; le taux de passage en classe supérieur est passé de 66,7% à 80,3% et le taux de réussite aux examens officiels de 61,8% à 76,6%. Pour ce qui est de la santé, le nombre de consultation mensuel est immédiatement passé de 253 à 376 après l'intervention du PNDP, on a observé par ailleurs l'augmentation du nombre d'accouchement assisté par un personnel médical. Dans le domaine de transport, l'aménagement des routes à permis de faire passer en moyenne le trafic journalier de 1 à 10 véhicules par jour. Pour l'électrification, 3294 ménages ont pu se connecter au réseau électrique d'un potentiel de 9936 abonnements mis en place par le PNDP. Les infrastructures de développement économique notamment les marchés construits ont permis d'augmenter de 197 222 FCFA en moyenne les recettes des communes bénéficiaires de ces infrastructures.

Au titre de l'« Appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation », deux études majeures notamment l'étude sur la réforme de la fiscalité locale, et l'étude sur l'évaluation des bésoins en personnels communal ont été exécutées et ont abouti à des textes et décrets d'application en faveur de la décentralisation. Le PNDP a renforcé les capacités de 73 communes en matière de passation des marchés, de planification communale et de maîtrise d'ouvrage. De plus, les élus locaux des communes couvertes ont été formées et 28 agents spécialisés dans l'amélioration de la gestion communale ont été recrutés.Les premiers impacts de cet appui se traduisent par : (i) une amélioration du taux d'exécution budgétaire, qui a augmenté de 14% en moyenne dans 42,1% des communes touchées; (ii) du niveau de recouvrement des recettes propres de la commune qui a augmenté de 48,7% dans 39,7% des communes couvertes.

En ce qui concerne le «Renforcement des capacités des acteurs», 1681 plans de développement local et 67 plans communaux ont été élaborés par les communautés avec l'appui conseil du PNDP et des OAL recrutés à cet effet. Ce processus d'apprentissage a suscité dans les communes et communautés une prise en main de leur développement perceptible à travers la mobilisation de l'épargne locale pour la mise en œuvre des plans élaborés. Au stade actuel de la mise en œuvre des plans, les communautés ont investi un montant de l'ordre de 1 581 013 474 FCFA et disposent d'une épargne estimée à 420 054 840 FCFA pour la poursuite de l'exécution des actions contenues dans leurs plans.

Introduction

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) est l'un des cadres opérationnels de la stratégie de réduction de la pauvreté, mis en place par le Gouvernement camerounais avec l'aide de plusieurs partenaires techniques et financiers. Par cet outil, le Gouvernement camerounais entend donner aux populations à la base les moyens effectifs leur permettant de prendre elles mêmes en charge leur développement. Les actions du PNDP pour atteindre cet objectif se regroupent en quatre composantes : (i) *l'appui financier au développement des communautés rurales* qui est un fonds prévu pour co-financer des microprojets identifiés dans les localités au travers d'un diagnostic participatif. (ii) *l'appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation* dont l'objectif est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des communes, afin de leur permettre de s'ancrer de façon efficace dans la mouvance de la décentralisation. (iii) *le renforcement des capacités des acteurs* impliqués dans la mise en œuvre du Programme, à travers la formations, la sensibilisation et la communication ; (iv) *la coordination, la gestion, le suivi-évaluation des activités et la communication*.

Le PNDP est mis en œuvre de façon progressive sur l'étendue du territoire national en trois phases successives de quatre ans chacune. Dans sa première phase de mise en œuvre, il était initialement prévu de couvrir 153 communes des 5 provinces que sont l'Adamaoua, le Centre, l'Ouest, le Nord et le Sud. Au cours de cette phase, une extension du Programme a été réalisée dans la Province de l'Extrême Nord avec un financement de la coopération allemande. Par ailleurs, sur instruction du Gouvernement, le PNDP mène de façon exceptionnelle des actions ponctuelles dans la localité de Lom dans le cadre des mesures compensatoires au profit des populations riveraines concernées suite au démantèlement du pont de Lom consécutivement à la mise service du pipe-line Tchad Cameroun.

S'agissant des financements, le PNDP bénéficie, outre les ressources publiques internes (BIP, PPTE), des fonds publics externes régis par des conventions ou accords spécifiques signés avec la Banque mondiale (IDA), la Coopération Allemande (KfW), la Coopération Française (C2D), le Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM et les fonds de la coopération japonaise (JSDF). A ces financements s'ajoutent celui des bénéficiaires au titre de leur contribution en nature et/ ou en espèce dans le coût des microprojets.

Le présent rapport présente de façon détaillée, l'état de mise en œuvre des activités financées par le PNDP au 31 décembre 2008, ainsi que les principles leçons tirées de la phase I du Programme.

CHAPITRE I

RAPPEL DES PREVISIONS DE L'EXERCICE 2008

1. Objectifs du Programme pour l'exercice 2008

L'objectf majeur du PNDP pour l'année 2008 a été l'atteinte des cibles de la première phase tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Pour ce faire, priorité a été accordée au suivi du cadre des résultats en ce qui concerne l'ensemble des composantes afin d'atteindre au mieux les déclencheurs de phase.

En dehors de ce point majeur, l'extension du PNDP à l'Extrême nord devrait entrer dans une phase plus concrète, après une longue période de préparation. Les contraintes majeures causes de retards enregistrés par le passé dans le démarrage effectif des activités ont été levées suite à la simplification des mécanismes d'acheminement et de gestion des ressources de la KfW.

2. Plan de couverture

Les interventions du PNDP sont tributaires du plan de couverture. Celui-ci indique d'année en année le nombre de communes devant être couvertes par le Programme. A ce titre, le PNDP a depuis son lancement progressivement étendu ses activités sur 33 communes en 2005, 41 en 2006, 69 en 2007. Ce qui porte le nombre total de commune à 143, en tenant compte de la création de nouvelles unités administratives et communes, décidée par le Chef de l'Etat en 2007 ce nombre passe à 155 dans les six provinces. Le plan de couverture actualisé se présente ainsi qu'il suit :

Tableau 1 ***:*** Plan de couverture initial de la première phase

Province	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Total
	2005	2006	2007	2008	2009	
Adamaoua	0/2	5	6	3	-	16
Centre	2/11	16	18	15	-	60
Extrême Nord			24	12	12-	48
Nord	2/6	4	4	4	-	18
Ouest	3/7	11	11	8	-	37
Sud	3/7	5	6	4	-	22
Total	10/33	**41**	**69**	**46**	**12**	**201**

Tableau 1' ***:*** Plan de couverture actualisé de la première phase

Province	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5[1]	Total
	2005	2006	2007	2008	2009	
Adamaoua	0/2[2]	5	11	3	-	21

[1] Seul l'Extrême-nord est concerné

[2] Le premier chiffre à gauche représente les communes de la phase pilote (2004) et le deuxième chiffre à droite celles de la 1ère année de mise en œuvre (2005)

Centre	2/12	18	18	16	-	64
Extrême Nord			24	12	11-	47
Nord	2/6	4	4	7	-	21
Ouest	3/8	11	12	9	-	40
Sud	3/7	7	6	9	-	29
Total	10/35	**45**	**75**	**56**	**11**	**222**

3. Programme de Travail et Budget par Composante

Le Budget de l'année 2008 équilibré en emplois et ressources adopté par le CNOP en sa cinquième session était de **10,641** milliards de F CFA, réparti par composante et par bailleur comme indiqué dans le tableau ci-après.

Tableau 2 : Répartition du budget 2008 par source de financement (bailleur) :

Composante	%	IDA	PPTE Multi	C2D	KfW	Etat CP NUM KFW 60000	Etat CP NUM IDA 1052439	Etat CP I&T 992439	Bénéficiaires	TOTAL
		26,75%	0,70%	48,46%	12,10%	0,56%	3,20%	6,13%	2,11%	100,00%
Composante 1 : APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNES RURALES	**56,68%**	2 356 136	32 305	2 441 619	616 000	-	-	361 324	224 244	6 031 628
Composante 2 : APPUI AUX COMMUNES	**5,41%**	192 068	41 929	233 347	30 719	-	31 078	46 720	-	575 861
Composante 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS	**14,91%**	100 662	-	1 239 304	121 789	11 111	27 003	86 410	-	1 586 279
Composante 4 : COORDINATION, GESTION, SUIVI EVALUATION ET COMMUNICATION	**23,00%**	197 340	180	1 242 200	518 720	48 889	281 919	157 984	-	2 447 233
TOTAL PTBA 2008	**100%**	**2 846 205**	**74 414**	**5 156 470**	**1 287 228**	**60 000**	**340 000**	**652 439**	**224 244**	**10 641 000**

Les résultats prévus dans le cadre de l'exécution de ce budget par composante se présente ainsi qu'il suit :

A) APPUI FINANCIER AU DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES RURALES

Au titre de cette composante, le projet entendait canaliser des subventions en direction des communautés et des communes. Ces subventions serviront à co-financer les microprojets proposés par ces organisations et répondant à leurs besoins prioritaires, afin de réduire la pauvreté.

Sous cette composante, le PNDP sest proposé de financer au cours de l'exercice 2008 un total de 316 microprojets communautaires et 85 microprojets communaux pour un coût total de **6,031 milliards de F CFA**, soit 56,68% du budget global. Cette somme est répartie ainsi qu'il suit :

3,299 527milliards de F CFA TTC pour le financement des microprojets en direction des communautés (dont environ **116,723** millions F CFA du coût de l'ensemble des microprojets à la charge des communautés bénéficiaires);

2,732 101 milliards de F CFA pour le financement des microprojets en direction des Communes (**dont 107,521 millions FCFA** du coût total à la charge des communes bénéficiaires).

B) APPUI AUX COMMUNES DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION

Au cours de l'année 2008, les activités inscrites au titre de cette composante sont celles définies de manière concertée avec le MINATD depuis 2006 conformément à la convention cadre collaboration signée avec le MINPLAPDAT le 06 avril 2005. La mise en œuvre de certaines de ces activités débutées en 2007, se poursuivra au cours de l'année 2008. Il s'agit de :

- La validation de l'étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées ;
- La validation de l'étude sur l'évaluation des besoins en personnel communal en vue de l'élaboration du tableau type des emplois communaux;
- La mise en application du nouveau plan sectoriel comptable des communes, dans sa phase définition d'une solution informatique optimale à la gestion communale;
- Le recrutement des agents communaux ;
- L'acquisition du matériel informatique au profit des communes ;
- La formation et le coaching des communes en vue d'améliorer le niveau des recettes communales et leur gestion.
- L'appui institutionnel au MINATD.

Le montant global affecté à cette composante du Projet est de **575,861** millions de F CFA en TTC, soit 5,41% du budget total. Le tableau 6 ci-dessous donne le récapitulatif du budget consolidé.

C) RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU PROGRAMME

L'objectif général de cette composante vise à inciter les populations (bénéficiaires) à mettre davantage à profit l'initiative et l'énergie locale de façon concertée aux efforts de réduction de la pauvreté.

Cet objectif global a été poursuivi à travers les objectifs spécifiques suivants :

- Amener les acteurs locaux à s'impliquer dans le processus de prise de décision, de planification, de négociation, de mise en œuvre, de suivi-évaluation des initiatives de développement social et économique ;
- Renforcer les capacités techniques, organisationnelles et managériales des communautés et des structures d'accompagnement en vue d'assurer leur autopromotion ;
- Animer et sensibiliser les acteurs pour la mise en place d'un cadre de concertation ;
- Renforcer les capacités organisationnelles et de gestion des Etablissements de Micro Finance à la base tout en appuyant leur émergence et leur développement sur l'ensemble du territoire national.

Pour l'exercice 2008, le PNDP a focalisé son action sur :

- Le renforcement des capacités des OAL dans les six provinces pour l'accompagnement des communes de la première phase;

- Le suivi de la contractualisation des OAL au niveau des communes en vue de l'élaboration des plans de développement local et communal dans les 69 communes de 2007 ;
- La contractualisation des OAL pour les communes restantes de la première phase ;
- La sensibilisation des communautés aux approches participatives et sur la lutte contre les IST/SIDA ;
- La mise en œuvre du plan de formation du Programme.

Le budget total de cette composante est de 1,586 279 milliards F CFA soit 14,91% du budget total. Le tableau 7 ci-dessous présente le budget consolidé.

D) COORDINATION, GESTION, SUIVI-EVALUATION ET COMMUNICATION

L'objectif de cette composante est de mettre à la disposition de tous les acteurs du Programme et du secteur du développement rural en général, les informations et les outils de gestion et d'aide à la décision nécessaire à l'accomplissement de leurs responsabilités. Les objectifs spécifiques de la composante sont les suivants :

- Assurer la bonne gestion du programme par le truchement d'une meilleure organisation, d'une planification et d'un suivi technique, comptable et financier des activités ;
- Optimiser la gestion de l'ensemble des informations manipulées par les différentes unités de gestion du programme ;
- Garantir des liens stratégiques, techniques et opérationnels du Programme avec les stratégies sectorielles, les autres programmes et projets de développement et avec l'ensemble des acteurs concernés (en particulier avec les bénéficiaires).

Cette composante compte trois sous composantes :

- La Coordination et Gestion
- Le suivi-évaluation ;
- La communication

Au cours de l'exercice 2008, la priorité sera accordée au suivi des activités sur le terrain et à la maîtrise des outils de collecte des données.

Le budget de la composante 4 s'élève à 2, 447 233 milliards F CFA et représente 23,00 % du budget total.

CHAPITRE II

PRINCIPALES REALISATIONS DE L'EXERCICE 2008

1. Aperçu général

De manière global, le PNDP s'est evertué à atteindre en fin 2008 les valeurs cibles de ses indicateurs. Ainsi, en dépit de quelques difficultés inhérentes notamment à la mobilisation tardives des ressources en général et la non allocation de ressources PPTE, le Programme a poursuivi la mise en œuvre de ses activités.

De manière résumée, le bilan des réalisations se présente ainsi qu'il suit :

- Déploiement des activités du Programme dans 155 communes, y compris celles de l'Extrême Nord ;
- Financement de 111 microprojets communaux et communautaires ;
- Finalisation de l'étude sur la réforme de la fiscalité des CTD, sous la supervision du MINATD dans le cadre d'appui à la décentralisation ;
- Renforcement des capacités opérationnelles des communes à travers le recrutement des agents;
- Appui des maires à la finalisation du processus de contractualisation avec les OAL en vue de la couverture des 69 nouvelles communes ;
- Lancement effectif des activités dans la province de l'Extrême Nord;
- Financement des microprojets du Projet de Gestion Durable des Terres sur fonds FEM;
- Achèvement de la mise en œuvre de l'opération JSDF pour la gestion durable des plantes médicinales ;
- Finalisation de l'étude sur l'état des lieux des communes à l'Extrême-Nord ;
- Préparation des supervisions conjointes des activités par les bailleurs et mise en œuvre du plan d'action ;
- Communication sur les activités du Programme à travers divers outils.

Le tableau suivant donne un aperçu des progrès réalisés à la fin de l'exercice 2008, comparativement, aux résultats attendus à la fin de la première phase prévu en 2008. Une distinction est faite pour les cibles du Crédit IDA n° 3687-CM, qui est arrivé à la fin de la 1ère phase.

***Tableau 1** : Indicateurs de fin de phase et déclencheurs de phase*

1. Indicateurs de performance

Le tableau ci-après donne l'état de mise en œuvre des indicateurs de performance définis dan le PAD.

N°	Libellé	Valeurs attendues à la fin de la 1ère phase	Valeurs 20 octobre 2008	Valeurs atteintes par source de financement			
				IDA	PPTE	C2D	KFW
1.	Microprojets exécutés	500 (100 IDA)	**203**	**112**	**74**	**18**	**0**
			4792 754 986	**1 581 327 061**	**2 881 849 738**	**329 578 187**	**0**
2.	Nombre de communes couvertes	153 (38 IDA)	155	74	74	57	24
3.	Nombre de salles de classes équipées	150	**126**	**77 (6)**	**30 (11)**	**2**	**0**
			881 964 523	**557 922 593**	**308 625 530**	**15 416 400**	
4.	Nombre de point d'eau	150	**298**	**115**	**179**	**4**	
			1 257 080 908	**382 041 601**	**858 020 107**	**17 019 200**	
5.	Nombre de centre de santé	50	**16**	**12**	**4**	**0**	
			215909343	**158 004 400**	**57 904 943**		
6.	Nbre de communes ayant bénéficié d'une formation	153 (**38 IDA**)					**23**
7.	Textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation préparés	Cf*	Cf**	Cf***			
8.	Nombre de communes ayant amélioré leur taux de recouvrement fiscal (**de plus de 50%**) par rapport à la situation de référence (50% des communes ciblées-153)	75 (19 IDA)	**25**	**25**	**25**	**25**	
9.	Nombre de communes ayant amélioré leur taux d'exécution budgétaire **(de plus de 50%)** par rapport à la situation de référence (50% des communes cibles-153)	75 (19 IDA)	**24**	**24**	**24**	**24**	
10	Nombre de PDC élaborés	115 (**29 IDA**)	**67**	**67**	**0**	**0**	**0**
11.	Nombre de microprojets approuvés il y a au moins six mois et achevés		**15**	**12**	**3**	**0**	
12.	Nombre de microprojets opérationnels et entretenus	350 (70% des MP exécutés)	**178(92,2%)**				**0**
13.	Pourcentage de requêtes soumises à l'approbation des CPAP/CPAC et ayant reçu un avis motivé	95%	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**

* (i) Loi (s) et Décret d'application, sur la fiscalité locale et le régime financier des CTD; (ii) Arrêté sur le tableau type des emplois communaux et les organigrammes types des CTD; (iii) Décret sur la Charte de déconcentration et d'utilisation des services déconcentrés de l'Etat par els CTD ; (iv) Elaboration de la stratégie sectorielle/nationale de la décentralisation.

** (i) Loi D'orientation Générale; (ii) Loi Applicable aux Régions ; (iii) Loi Applicable aux Communes ; (iv) Décret portant création du Conseil National sur la Décentralisation ; (v) Décret portant création du Comité Interministériel des Services Locaux ; (vi) Décret portant création et fonctionnement des communautés urbaine ; (vii) Etudes sur la fiscalité locale et le régime financier des CTD en cours de finalisation; (viii) Etude sur le tableau type des emplois communaux et les organigrammes types des CTD en cours.

***Décret n° 2008/376 du 12 Novembre 2008 portant organisation administrative de la République du Cameroun (en prélude à la mise en place de la collectivité décentralisé au niveau régional)

2. Indicateurs déclencheurs de phase

N°	Libellé	Valeurs attendues à la fin de la 1ère phase	Valeurs 30 décembre 2008	Valeurs atteintes par source de financement			
				IDA	PPTE	C2D	KFW
1.	Nombre de communes ayant exécuté au moins un oprojet (25 % des communes disposant d'un PDC-75)	19 (**5**)	**39**	**4**	**31**	**4**	**0**
2.	Nombre de communautés ayant exécuté au moins un oprojet (50 % de communautés disposant d'un PDL-1150)	575 (**140 IDA**)	**164**	**108**	**43**	**13**	**0**
3.	Nombre de PDC élaborés (50% des communes cibles-153)	75 (**19 IDA**)	**67**	**67**	**0**	**0**	**0**
4.	Nombre de PDL élaborés (50% des communautés cibles-)	1150 (**285 IDA**)	**1681**	**1681**	**0**	**0**	**0**
5	Nombre de communes capables de recevoir et de gérer les s du PNDP ((10% DES communes cibles -153)	15 (**4 IDA**)	**55,1%**	**72,7%**	**66,67%**	**100%**	**0**
6.	Taux de décaissement de la composante 1 (au moins 25 % d'US $ 53 millions)	eq.US$13.25 (**US$ 2.75 IDA**)	**US$18.2**	**US.3.96**	**10.9**	**3.34**	**0**
7.	Nombre de communes ayant bénéficié d'une formation % des communes cibles -153 153)	75 (**19 IDA**)	**109**	**74**	**0**	**12**	**23**
8.	Textes législatifs et réglementaires sur la décentralisation préparés	Projets de textes préparés	Voir ** ci dessus	**100%**	**0**	**0**	**0**
9.	Charte sur le statut et l'organisation des communes arée	Organigramme type des munes	Etude en cours				

Du tableau qui précède, on constate que 8 déchencheurs de phase sur les 9 ont été atteints. Le dernier indicateur à consolider est le nombre des communautés ayant achevé un microprojet.

En effet, il était attendu comme un des déchnecheurs de la première phase qu'au moins 575 soit 50% des communautés dont 140 sur financement IDA, disposant d'un PDL aient exécuté avec succès un microrprojet. A ce jour on est à 104 et le gap est de 36. Au regard du nombre des microprojets en cours, on peut esperer que d'ici la clôture du crédit en septembre2009, cet indicateur sera atteint voire dépassé

2. Principales Réalisations par Composante

1- Composante 1 : AFDCR

En fin 2007, le PNDP avait déjà signé 283 conventions pour le financement de microprojets communaux et communautaires dans les provinces de sa zone d'intervention. En fin 2008, 111 nouvelles conventions ont été signées, ce qui porte à 394 le nombre total de conventions à l'actif du Programme au 31 décembre 2008. Ces conventions signées se déclinent en **139** microprojets en attente de financement ou en cours de passation de marchés, **51** en cours d'exécution et **204** microprojets achevés et fonctionnels.

Tableau 2 : Situation de mise en œuvre des microprojets au cours de l'année 2008

Libellé	CNC	Adamaoua	Centre	Extrême Nord	Nord	Ouest	Sud	Cumul
Nombre total de Microprojet	**-**	**24**	**22**	**4**	**26**	**15**	**20**	**110**
Conventions signées en cours de passation de marchés	-	18	5	1	12	4	7	47
En cours d'exécution	-	2		3	-		5	10
Achevés et opérationnels	-	4	17	-	14	11	7	53
Montant total Microprojet	**-**	**300 653 803**	**372 688 029**	**345 167 363**	**303 633 926**	**417 581 699**	**351 760 543**	**2 091 485 363**
Conventions signées en cours de passation de marchés	-	135 668 927	95 844 009	81 113 850	1 727 704	180 498 283	173 183 975	518 036 748
En cours d'exécution	-	134 984 876		264 053 513	85 023 919	78 627 109	55 992 901	606 087 318
Achevés et opérationnels	-	30 000 000	276844020	-	216 882 303	158 456 307	122 583 667	967 361 297
Montant total par Volet	**-**	**300 653 803**	**372 688 029**	**345 167 363**	**303 633 926**	**417 581 699**	**351 760 543**	**2 091 485 363**
Projet socio collectif	-	263 839 535	358 804 029	257 057 714	303 633 926	341 912 140	278 704 695	1 803 952 039
Equipements publics marchands	-	36 814 268	-	88 109 649	-	75 669 559	73 055 848	273 649 324
Gestion des ressources naturelles	-	-	13 884 000	-	-	-	-	13 884 000
Appui aux EMF	-	-	-	-	-	-	-	-
Montant total par secteur	**-**	**300 653 803**	**372 688 029**	**345 167 363**	**385 197 081**	**417 581 700**	**351 760 543**	**2 173 048 519**
Education	-	88 076 285	26 406 404	98 830 537	211 383 539	49 098 075	33 166 000	506 960 840
Santé	-	-	-	-	87 144 562	22 424 553		91 516 090
Hydraulique	-	75 791 830	158 979 009	81 113 850	11 856 674	96 612 455	213 986 835	670 019 498
Electrification rurale	-	53 715 247	146 956 182	77 113 327	-	92 535 506	31 551 860	401 872 122
Piste rurale	-	15 530 397	14 379 105	-	74 812 306	58 766 695	-	163 488 503
Gestion des ressources naturelles	-	-	13 884 000	-	-	-	-	13 884 000
Agriculture	-	-	-	-	-	-	-	-
Elevage	-	-	-	-	-	-	-	-
Sport et loisir	-		-	-	-	18 650 011	-	5 024 191
Promotion de la femme	-	30 725 776	-	-	-	3 824 846	-	34 550 622
Infrastructure développement économique	-	36 814 268	12 083 329	88 109 649	-	75 669 559	73 055 848	285 732 653
Montant total par localisation	**-**	**300 653 803**	**372 688 029**	**345 167 363**	**385 197 081**	**417 581 699**	**351 760 543**	**2 173 048 518**
Communautaires	-	300 653 903	372 688 029	345 167 363	385 197 081	160 672 479	237 989 723	1 802 368 578
Communaux	-			-		256 909 220	113 770 820	370 680 040
Montant total par genre	**-**	**300 653 903**	**372 688 029**	**345 167 363**	**385 197 081**	**417 581 699**	**351 760 543**	**2 091 485 463**
Féminin	-	-	-	-	-	3 824 846	-	3 824 846
Masculin	-	-	-	-	-	-	-	-
Mixte	-	300 653 903	372 688 029	345 167 363	385 197 081	413 756 853	351 760 543	2 087 660 617

En comparaison avec le Plan de Travail et Budget Annuel 2008, sur des prévisions de mise en œuvre de 401 microprojets pour la seule année 2008, le PNDP a pu financer seulement 110 microprojets, soit un taux de réalisation de 27,7%. Cet écart est imputable à l'insuffisance et au déblocage tardif des fonds alloués au Programme au titre de l'exercice 2008. Toutefois, le processus d'élaboration des requêtes a suivi son cours et un stock important de requêtes est disponible et sera financé au cours de l'année 2009.

Tableau N°3 : Situation consolidée de financement des microprojets au 31 décembre 2008

Libellé	CNC	Adamaoua	Centre	Extrême Nord	Nord	Ouest	Sud	Cumul
Nombre total de Microprojet	**4**	**39**	**93**	**4**	**87**	**98**	**68**	**393**
Conventions signées en cours de passation de marchés	2	24	24	1	33	42	12	138
En cours d'exécution	2	2	10	3	5	12	18	52
Achevés et opérationnels		13	59		49	44	38	203
Montant total Microprojet	**107 038 169**	**951 722 376**	**2 790 243 618**	**345 167 363**	**1 829 425 012**	**2 818 071 890**	**1 462 264 603**	**10303933031**
Conventions signées en cours de passation de marchés	61 144 490	300653903	432047103	81113850	497276695	1158487978	170 263 710	2700987729
En cours d'exécution	45 893 679	134984876	862976361	264053513	311692493	550389765	603 364 379	2773355066
Achevés et opérationnels		516083597	1495220154		1020455824	1109194147	688 636 514	4829590236
Montant total par Volet	**107 038 169**	**951 722 376**	**2 790 243 618**	**345 167 363**	**1 829 425 012**	**2 818 071 890**	**1 462 264 603**	**10303933031**
Projet socio collectif	107 038 169	816737500	2308864527	257057714	1629505527	2288384979	1 236 667 405	8644255821
Equipements publics marchands		134984876	467495091	88109649	199919485	529686911	209 313 848	1629509860
Gestion des ressources naturelles			13884000		0	0	16 283 350	30167350
Appui aux EMF					0	0		0
Montant total par secteur	**107 038 169**	**951 722 376**	**2 790 243 618**	**345 167 363**	**1 910 988 167**	**2 818 071 891**	**1 462 264 603**	**10385496187**
Education	12 924 490	158341937	363350488	98830537	966613213	343686522	215 296 594	2159043781
Santé	48 220 000	61595473	14963801		268028114	156971872	28 026 291	577805551
Hydraulique		363193327	711115918	81113850	199905357	571287182	869 302 096	2795917730
Electrification rurale		187350590	927615718	77113327	145612318	647748540	112 415 549	2097856042
Piste rurale	45 893 679	15530397	249863551		130909680	411366865		853564172
Gestion des ressources naturelles			13884000		0	0	16 283 350	30167350
Agriculture						0		0
Elevage						0		0
Sport et loisir			29871722		0	130550078	11 626 875	172048675
Promotion de la femme		30725776			0	26773921		57499697
Infrastructure développement économique		134984876	479578420	88109649	199919485	529686911	209 313 848	1641593189
Montant total par localisation	**107 038 169**	**951 722 376**	**2 790 243 618**	**345 167 363**	**1 829 425 012**	**2 818 071 890**	**1 462 264 603**	**10303933031**
Communautaires	61 144 490	527998348	1947940200	345167363	1121773012	1019707352	683 273 404	5707004169
Communaux	45 893 679	423724028	842303418		707652000	1798364538	778 991 199	4596928862

Montant total par genre	**107 038 169**	**951 722 376**	**2 790 243 618**	**345 167 363**	**1 829 425 012**	**2 818 071 890**	**1 462 264 603**	**10 303 933 031**
Féminin					0	26773921		26773921
Masculin					0	0		0
Mixte	107 038 169	951722376	2790243618	345167363	1829425012	2791297969	1 462 264 603	10277159110

De manière cumulée, le PNDP a signé 393 conventions et achevés 203 microprojets contre 500 attendus à la fin de la première phase, tous financement confondus. Ce gap bien qu'important traduit le fait que le plan de financement initial du PNDP n'a pas été bouclé notamment pour ce qui est des fonds PPTE. Pour ce qui est de l'achèvement des microprojets, un accent particulier a été mis sur leur achèvement au cours du 2ème semestre 2008 et des mesures ont été prises en vue de lever les blocages observés dans la mise en œuvre de certains microprojets.

1.1 Mise en œuvre des microprojets par Province

Graphique 1 : Niveau de mise en œuvre des microprojets par Province

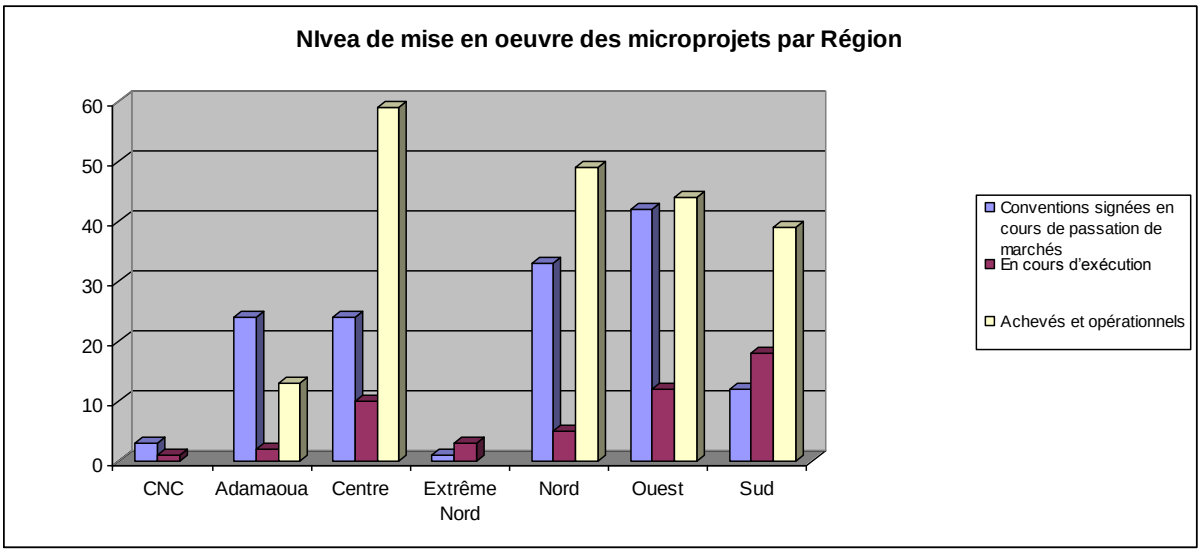

La présence des pics de conventions signées en cours de passation de marché, est due au fait que, avec l'arrivée tardif des fonds C2D, les comptes des microprojets n'ont été approvisionnés que vers la fin du 3 trimestre 2008. Le processus de passation desmarchés engagé aussitôt après n'a pas pu être finanlisé avant la finde l'exercice 2008. Toutefois, le processus suit sont cours et cette situation sera inversée au 1ere trimestre 2009.

1.2 Répartition des financements par secteur

Graphique 2 : Répartition des microprojets par secteur

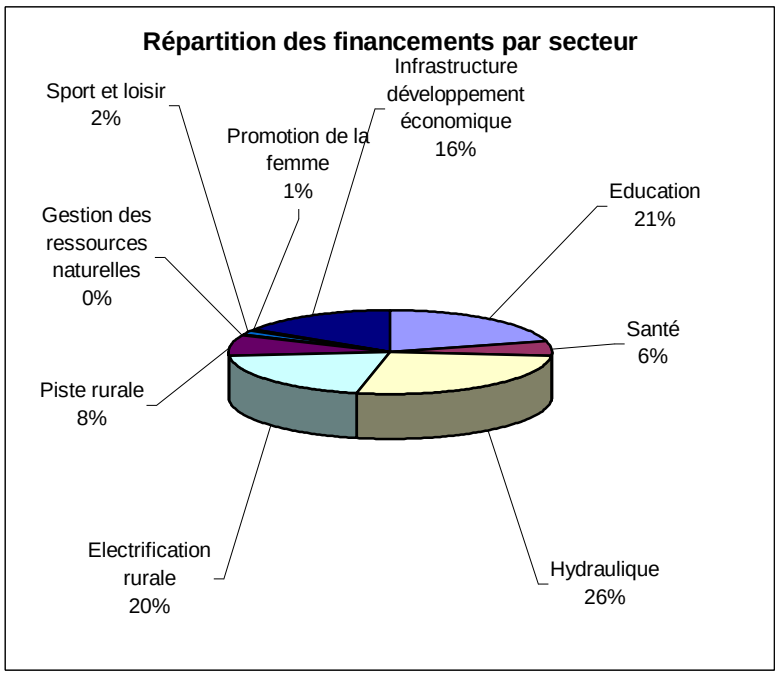

La répartition des financements par secteur des microprojets du porte feuille du PNDP épouse assez bien l'ordre de priorité des besoins des bénéficiaires tel qu'exprimé dans le DSRP. En effet, Le besoin en eau vient en tête, suivi dans l'ordre de l'électrification, l'éducation, les infrastructures de développement économique, les pistes rurales et la santé. La présence des infrastructures de développement économique dans ces priorités vient du fait que les microprojets de ce secteur sont généralement coûteux.

1.5. Cadre de résultat de la composante A

Tableau 5 : Indicateurs de la composante 1

Ouvrages et infrastructures issus des microprojets dans les principaux secteurs

Les ouvrages réalisés par le PNDP au titre de la composante A sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Secteur/domaine	**Biens/Service délivrés**	Nombre (avec Unités)
Education	Tables bancs	2 972
	Manuels scolaires	16 424
	Blocs de bureaux administratifs	7
	Logements d'enseignants	2
	Salle de classe	126**
Eau et assainissement	Forages	17
	Bornes fontaines	99
	Puits	147
	Sources aménagées	35
	Latrines	40
Santé	Centres de santé construits/aménagés y compris les maternités	15
	Centres de santés équipées y compris les maternités	16
Transport	Aménagement de piste (km)	161

	Ouvrages de franchissement (buses, ponceaux etc.)	80
Electricité	Longueur moyenne tension (m)	101 796
	Longueur basse tension (m)	83 842
	Groupes	6
	Transformateurs	13
Infrastructures de développement économique	Comptoirs de marchés	974
	Hangar de marchés	32
	Boutiques de marchés	156
	Parcs à bétails	2
	Magasin de stockage	7

Tableau n°13 : Taille de la population touchée par secteur

Secteur	**Population directement touchée par Les infrastructures du PNDP**
Education	90344
Electrification	198278
GRN	250
Hydraulique	198 616
Infrastructure Economique	172800
Promotion femme	7000
Santé	58 711
Sport Loisir	8415
Transport	118 423
Total	**852837**

***Source** : rapport enquête interne*

Dans le secteur de l'éducation

Le taux de fréquentation s'est globalement amélioré de 1% par rapport à son niveau initial qui était de 92,38 % dans les établissements scolaires. Cette amélioration est très sensible de la première (+ 4%) à la deuxième (+6%) année après l'intervention et elle a tendance à se stabiliser. Il est faut noter ici que les salles de classes construites et équipées viennent souvent en substitution des salles faites en matériaux provisoires où les élèves s'assayent à même le sol et écrivent sur leurs genoux (voir photos ci-dessous).

AVANT PNDP	APRES PNDP

Le taux moyen de passage en classe supérieure est passé de 66,77 à 80,30% dès la première année et s'est stabilisé les deux années suivantes.

Le taux de réussite aux examens officiels s'est amélioré dans la plupart des établissements où le PNDP est intervenu à travers la construction des salles de classe ou la fourniture des manuels scolaires. Ce taux est passé de 61,84% avant, à 76,63% dès la première année, a atteint 79,58 à la deuxième et 87,70 à la troisième année après l'intervention du PNDP.

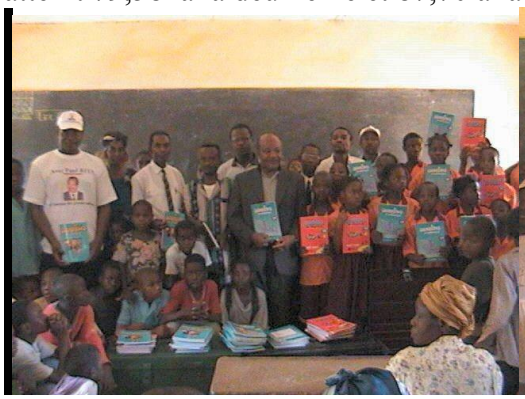
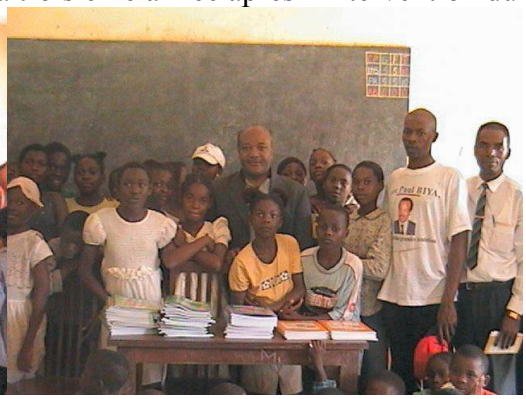

Dans le secteur de la Santé

Le nombre global d'accouchement assisté par un personnel médical ont atteint 773, le nombre d'enfants de 0 à 5 ans vaccinés est de 11 649 et 8234 cas de paludisme ont été traités.

Par ailleurs, le nombre moyen de consultations mensuelles dans les centres de santé est passé de 253,2 avant l'intervention du PNDP à 376,8 une année après pour se stabiliser les deux années suivantes à 279. Cette augmentation est due à l'amélioration du cadre, à l'affectation d'un personnel médical et à la présence d'un équipement minimum pour le fonctionnement d'un centre de santé.

AVANT PNDP	APRES PNDP

Dans le secteur de l'hydraulique

De façon globale le nombre d'habitant par point d'eau est passé de 859,81 à 381,95. Cette évolution cache des spécificités observées d'une province à l'autre. Ainsi, dans la province du Centre on est passé de 1199,77 à 577,03 ; tandis qu'au Nord et à l'Adamaoua ce nombre est respectivement passé de 717,46 à 467,19 et de 792,24 à 336,93.

Les 298 points d'eau ont permis l'accès à 198 616 personnes qui jadis s'approvisionnaient dans les ruisseaux et les sources non aménagées et par conséquent utilisaient une eau impropre à la consommation humaine.

De manière résumée, 87% des populations estiment que la prévalence des maladies d'origine hydrique a considérablement baissée.

Dans le secteur du Transport

Le coût de transport estimé au kilomètre a chuté dès l'intervention du Programme. Il est passé de 235 F CFA à 110 F CFA un an après pour lune légère hausse de 40 F CFA la deuxième et troisième année. Cette hausse peut s'expliquer par la dégradation progressive de la chaussée due au ruissellement des eaux de pluies. Cependant, pistes ainsi réhabilitées restent praticables en toute saison du fait que les ouvrages de franchissements construits demeurent en bon état.

Le trafic journalier évalué en termes de nombre de passage de véhicules est passe de 1,46 avant le PNDP à 10,38 dès la première année suivant l'intervention.

Dans le secteur de l'électrification

L'électrification de 56 localités a permis l'accès potentiel à l'énergie électrique de 198 278 personnes. Les projets réalisés dans ce secteur sont soit en décentralisé soit à connexion au réseau SONEL. Que ce soit en décentralisé ou la connexion au réseau national les populations ont du mal à bénéficier de cette énergie qui reste pourtant leur priorité. Seules 9936 personnes soit environ 5% du potentiel, disposent d'un branchement et desquelles seules 3294 disposent d'un abonnement complet avec compteur.

Dans le secteur des Infrastructures de développement économique

Marchés

Le programme a réalisé 12 marchés constitués de hangars, de boutiques et abattoirs. La commune cède ces espaces aux commerçants contre un bail dont le taux est fixé de commun accord. De manière globale l'enquête révèle que la moyenne de recettes générées par les marchés est de 197 222 F CFA par mois ce qui améliore le niveau des recettes propres des communes.

Ecotourisme

Le PNDP qui ne répond qu'au besoin exprimé par le bénéficiaire n'a financé qu'un centre d'écotourisme dans une communauté riveraine du Park national de Campo-ma'an. Deux cases y ont été construites offrant ainsi une capacité d'accueil de six (6) lits. Avec une fréquentation moyenne mensuelle de quatre (4) visiteurs, ce centre a créé cinq (5) emplois directs et indirects et permet à la communauté d'enregistrer des recettes moyennes mensuelles de l'ordre de 50 000 FCFA, susceptibles d'être réinvestis dans les actions de développement du village.

Foyers communautaires

Trois (3) foyers communautaires d'une capacité moyenne de 380 ont été construits dans 3 villages leur offrant la possibilité de générer des recettes estimées à une moyenne de 63 125 F CFA par trimestre.

Parcs à bétail

Les deux (2) parcs à bétail ont été construits dans les marchés communaux ; Ces parcs offrent une capacité d'accueil moyenne d 350 têtes de bétail et génère à la commune une moyenne de recettes mensuelles de 123 500 F CFA.

Magasin de stockage

Sept (7) magasins de stockage ont été construits offrant une capacité total de 1281 m^3 ce magasin ont permis d'améliorer la sécurité alimentaire en réduisant la variation du coût des denrées entre le période de récolte et la période de soudure. La figure ci-dessous montre que

cette variation passe de 18000 F CFA (le sac de mil) avant la magasin à 8000 F CFA une année après construction du magasin.

2- Composante 2 : Appui aux Communes dans le Processus Progressif de Décentralisation

Dans le cadre de l'appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation, le PNDP, en collaboration avec le MINATD met en œuvre (i) une étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées ; (ii) une Etude sur l'évaluation des besoins en personnels des communes en vue de l'élaboration d'un tableau-type des emplois communaux ; (iii) une étude sur l'analyse de l'application de gestion comptable et budgétaires des communes, dans le cadre de la mise en application du nouveau plan comptable sectoriel des communes, (iv) étude sur la bonne gouvernance. Comme autres activités, le Programme procède à la préparation d'une série renforcement des capacités des communes avec l'appui technique du CEFAM, ainsi que le recrutement des agents communaux et l'équipement des communes en matériels informatiques.

2-1 Etude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées

Cette étude a pour objectif de proposer une réforme de la fiscalité et un régime financier applicable aux collectivités territoriales décentralisées, allant dans le sens de renforcer leurs capacités financières par l'accroissement de leur autonomie à travers une proportion plus importante des recettes issues de la fiscalité locale, sans affecter l'équilibre budgétaire de l'Etat. Au cours de l'année 2007, le rapport final ainsi que des projets de lois ont été envoyés à la CNC le 15 octobre 2007, puis examiné par le comité de suivi de l'étude. Un comité ad hoc mise en place par le MINATD a par la suite été mandaté d'exploiter le rapport. Les travaux de ce comité ont été bouclés au cours du mois de juillet 2008. Des projets de lois issus de cette étude ont été préparés et soumis au Premier Ministre pour transmission à l'Assemblée Nationale, organe d'adoption des lois.

2-2 Etude sur l'évaluation des besoins en personnel communal en vue de l'élaboration d'un tableau type des emplois communaux

A travers cette étude, le Programme de concert avec le MINATD entend faire un diagnostic des ressources humaines au sein des communes à l'effet de proposer une formule d'emploi adaptée aux besoins des communes. Les cabinets de la liste restreinte élaborée au cours de l'année 2006 ont été consultés et le Consortium AGORA Consulting & AXES management a été retenu pour réaliser l'étude. Celle-ci a été lancée le 05 octobre 2007 et finalisée par la production du rapport provisoire le 22 mai 2008. Le rapport final a donné lieu à un projet d'arrêté qui est en cours de finalisation au MINATD.

2-3 Mise en application du nouveau plan comptable sectoriel

Cette étude vise à doter les communes d'un outil informatique adapté, pour améliorer la gestion au sein de l'institution municipale. La première phase de mise en œuvre de cette activité est la «*recherche d'une application informatique adaptée, permettant de gérer la comptabilité et le budget communal* ». Le processus de sélection du consultant a abouti par la signature du contrat avec le cabinet ALBATRES, en date du 14 juillet 2008. Un comité interministériel de suivi de l'étude a été mis en place. Le premier rapport de l'état des lieux a été approuvé par ledit comité en septembre 2008 et le deuxième rapport qui présente l'application informatique adaptée à la comptabilité communale a été déposé à la CNC et sera examiné le 26/01/2009.

2-4 Etude sur la gouvernance locale

Cette étude vise à proposer une stratégie opérationnelle de gouvernance locale assortie d'un plan d'actions à mettre en œuvre dans le cadre du processus de décentralisation, à travers l'identification des risques en matière de gouvernance locale ainsi que les mesures d'atténuation y afférents dans le cadre du PNDP. Le cabinet 2AC retenu à l'issue du processus de recrutement a présenté les premières conclusions de l'étude le 03 juillet 2008 en présence des partenaires techniques et financiers ainsi que des représentants des ministères sectoriels. Le rapport provisoire a été déposé le 09 juillet 2008 et le rapport définitif à la fin du même mois. Cette étude a permis de dresser une matrice d'actions préventives aux fins de réduire les risques de corruption dans la mise en œuvre du PNDP.

2-5 Recrutement des Agents Communaux

Au cours de l'année 2008, le PNDP a poursuivi avec le recrutement d'agents communaux au profit de communes dans la perspective de l'amélioration du niveau gestion à travers notamment l'augmentation des recettes communales et du taux d'exécution budgétaire. Le tableau suivant présente la progression du processus province par province :

Tableau 6 : Situation du recrutement des agents communaux

Province	Nombre de communes concernées	Nombre d'agent recrutés et pris en charge
Adamaoua	7	5
Centre	27	10
Extrême Nord	0	0
Nord	10	4
Ouest	18	5
Sud	12	4
Total	**74**	**28**

Au sein des communes, ces ces agents opérationnels appuient les maires à l'identification de nouveaux gisements fiscaux et à la maîtrise du fichier des contribuables. Avec ces appuis, les maires des 28 communes ont noté comme effect intermédiaires, (i) une meilleur visibilité des ressources communales, (ii) une amélioration sensible des recettes, (iii) une meilleure préparation des comptes administratifs, (iv) une meilleure préparation du compte de gestion, (v) une meilleure préparation du budget et (vi) une amélioration du taux d'exécution budgétaire.

2-6 Renforcement des capacités des CTD

Au titre des autres renforcements des capacités des CTD, au cours de cette année le PNDP a signé des conventions avec le CEFAM et l'ARMP pour une nouvelle vague de formation des élus locaux et du personnel communal, ainsi que des comissions communales de passation des marchés.

Avec le CEFAM, 56 personnels des communes ont été formées sur : (i) l'amélioration de la gestion budgétaire volet dépense, (ii) l'amélioration de la gestion budgétaire volet recette, (iii) la comptabilité communale et (iv) la gestion du patrimoine.

A la suite de ces formations, six communes dans la provinces du Centre (Dibang, Bibey, Ngambe Tikar, Monatele, Batschenga, Mengang) et 05 communes dans l'Extrême Nord (Makary, Kousseri, Maroua 1er, Mokolo, Mogodé) ont été formées par le CEFAM. Pour ces communes, des contrats ont été signés avec des coachs à l'effet de les accompagner dans la mise en pratique des techniques acquises auprès du CEFAM.

S'agissant des fomrations des commissions de passation des marchés placées auprès des communes, avec l'appui de l'ARMP, le PNDP a formé plusieurs membres de commissions communales, sur le code nationa des marchés, les procédures simplifiées de la Banque mondiale et le classement des documents de marchés.

2-7 Impacts enregistrés à travers la composante B

Pour mesurer les impacts des actions du PNDP au titre de cette composante, 4 indicateurs ont été retenus. Il s'agit de : (i) Taux de recouvrement des recettes fiscales locales de la commune, (ii) Taux d'accroissement des recettes de la commune , (iii) Taux d'exécution budgétaire (annuel), (iv) Nombre de comptes administratifs adoptés durant les trois dernières années.
Les données relatives à ces indicateurs, collectées au cours de l'enquête annuelle du PNDP a permis d'obtenir de se rendre compte que 42,1% des communes ayant des données fiables sur leurs budgets ont amélioré leurs taux d'exécution budgétaire d'une moyenne 14,99%. S'agissant de l'évolution du niveau des recettes propres, 39,1% des communes disposant de données fiables ont amélioré leur taux de recouvrement fiscal d'une moyenne d'augmentation de l'ordre de 48,7%.

Il importe de signaler que ces augmentations sont le résultat de la conjugaison de plusieurs actions du Programme, notamment le recrutement de l'agent, l'élaboration du PDC et la formation en passation des marchés et dans certains cas à la réalisation du microprojet (marché, parc à bétail, etc.).

3- Composante 3 : Renforcement des Capacités des acteurs

Au titre du renforcement des capacités des acteurs, les activités menées ont concernée : (i) le suivi des OAL dans les 74 communes des années 2005 à 2006, (ii) le suivi de la sélection des OAL par les communes de l'année 2007, (iii) les ateliers et (iv) la formation du personnel.

3-1 Accompagnement des communes 2005 -2008 par les OAL

Produits	**Adamaoua**		**Centre**		**Extrême Nord**		**Nord**		**Ouest**		**Sud**		**Total**		
	2008	**2009**	**2008**	**2009**	**2008**	**2009**	**2008**	**2009**	**2008**	**2009**	**2008**	**2009**	**2008**	**2009**	
PDC élaborés	**5**	**5**	**29**	**29**	**0**	**1**	**6**	**8**	**7**	**22**	**7**	**13**	**54**	**78**	
PDL élaborés	**287**	**493**	**684**	**688**	**0**	**399**	**322**	**414**	**264**	**436**	**207**	**207**	**1764**	**2637**	
Requêtes élaborées		**217**	**466**	**673**	**23**	**28**	**313**	**266**	**180**	**316**	**219**	**219**	**1201**	**1719**	

3-2. Sélection des OAL pour les communes 2007

Après la revue à mi-parcours, il a été convenu de procéder à la décentralisation du processus de sélection des OAL et d'élaborer un nouveau type de contrats, basé sur les appels à commandes. Ce processus lancé au cours de l'année 2007, a abouti au cours du premier sémestre à la sélection des OAL dans certaines communes après avis de non objection du PNDP sur les dossiers de sélection transmis par les commissions de passation des marchés placées auprès des communes. Le tableau ci-dessous donne la répartition de ces OAL par province.

Province	commune	Nbre UPP	Phase 1	Phase2	Phase 3	Total	OAL RECRUTE
ADAMAOUA	NGAOUNDERE	145	72 500 000	15 950 000	18 850 000	107 300 000	ACTION DIX
	BANYO	51	25 500 000	5 610 000	6 630 000	37 740 000	SADER
	DIR	37	18 500 000	4 070 000	4 810 000	27 380 000	SADER
	KONTCHA	19	9 500 000	2 090 000	2 470 000	14 060 000	CNJD
	MAYO BALEO	37	18 500 000	4 070 000	4 810 000	27 380 000	ADDUCOB
	GALIM TIGNERE	24	12 000 000	2 640 000	3 120 000	17 760 000	ADDUCOB
NORD	BIBEMI	54	27 000 000	5 940 000	7 020 000	39 960 000	GIC-ADER
	DEMBO	33	16 500 000	3 630 000	4 290 000	24 420 000	GIC-ADER
	MADINGRING	23	11 500 000	2 530 000	2 990 000	17 020 000	TERDEL
	POLI	36	18 000 000	3 960 000	4 680 000	26 640 000	GIC-ADER
OUEST	BANJA	25	12 500 000	2 750 000	3 250 000	18 500 000	CDCV
	BAFOUSSAM I	12	6 000 000	1 320 000	1 560 000	8 880 000	ACAFIA
	BATIE	15	7 500 000	1 650 000	1 950 000	11 100 000	ACAFIA
	FOKOUE	12	6 000 000	1 320 000	1 560 000	8 880 000	CENTRE IMMANUEL
	KEKEM	10	5 000 000	1 100 000	1 300 000	7 400 000	ENVIRO PROTEC
	BAYANGAM	14	7 000 000	1 540 000	1 820 000	10 360 000	CIFOR
	FOUMBOT	24	12 000 000	2 640 000	3 120 000	17 760 000	GIC-VODER
	BAZOU	16	8 000 000	1 760 000	2 080 000	11 840 000	CENTRE IMMANUEL
	BABADJOU	24	12 000 000	2 640 000	3 120 000	17 760 000	DK-INTERNATIONAL
CENTRE	NGOG MAPOUBI	9	4 500 000	990 000	1 170 000	6 660 000	ASAFRO
	NDIKINIMEKI	18	9 000 000	1 980 000	2 340 000	13 320 000	CPDD
	AKONOLINGA	41	20 500 000	4 510 000	5 330 000	30 340 000	PRODEPAD

Province	commune	Nbre UPP	Phase 1	Phase2	Phase 3	Total	OAL RECRUTE
	AWAE	23	11 500 000	2 530 000	2 990 000	17 020 000	AIDER
	NTUI	24	12 000 000	2 640 000	3 120 000	17 760 000	LUDEPRENA
	NGUIMBASSAL	13	6 500 000	1 430 000	1 690 000	9 620 000	RADA
	NANGA EBOKO	48	24 000 000	5 280 000	6 240 000	35 520 000	PAN'ART
	NGORO	17	8 500 000	1 870 000	2 210 000	12 580 000	AFEDEM
	EVODOULA	21	10 500 000	2 310 000	2 730 000	15 540 000	CPD
SUD	MVENGUE	15	7 500 000	1 650 000	1 950 000	11 100 000	ATIPAD
	LOLODORF	13	6 500 000	1 430 000	1 690 000	9 620 000	PLANET SURVEY
	MEYOMESSALA	41	20 500 000	4 510 000	5 330 000	30 340 000	ADECOL
	BIYONG BANE	14	7 000 000	1 540 000	1 820 000	10 360 000	CAIPE
	NIETE	9	4 500 000	990 000	1 170 000	6 660 000	CEPFILD
CNC	BATCHAM	27	13 500 000	2 970 000	3 510 000	19 980 000	GAID
	BAFANG	22	11 000 000	2 420 000	2 860 000	16 280 000	FONDATION KAMGA
	MENDONG	16	8 000 000	1 760 000	2 080 000	11 840 000	CEW
EXTREME-NORD	MOGODE	22	11 000 000	2 420 000	2 860 000	16 280 000	CEDC
	MOZOGO	33	16 500 000	3 630 000	4 290 000	24 420 000	CAPROVI
	MOKOLO	42	21 000 000	4 620 000	5 460 000	31 080 000	PI-PNVRA
	BOGO	20	10 000 000	2 200 000	2 600 000	14 800 000	PI-PNVRA
	PETTE	34	17 000 000	3 740 000	4 420 000	25 160 000	CADEGIE
	TOKOMBERE	35	17 500 000	3 850 000	4 550 000	25 900 000	CADEPI
	MORA	50	25 000 000	5 500 000	6 500 000	37 000 000	CAPROVI
	WAZA	11	5 500 000	1 210 000	1 430 000	8 140 000	CADEPI
	LOGONE BIRNI	23	11 500 000	2 530 000	2 990 000	17 020 000	SANA-LOGONE
	KARHAY	13	6 500 000	1 430 000	1 690 000	9 620 000	INSTRAD
	GOBO	24	12 000 000	2 640 000	3 120 000	17 760 000	SANA-LOGONE
	MOULVOUDAYE	20	10 000 000	2 200 000	2 600 000	14 800 000	GIC-APD
	KAÏ-KAÏ	42	21 000 000	4 620 000	5 460 000	31 080 000	SANA-LOGONE
	KAELE	35	17 500 000	3 850 000	4 550 000	25 900 000	CADEPI
	YAGOUA	39	19 500 000	4 290 000	5 070 000	28 860 000	CERAD
	MAROUA I	15	7 500 000	1 650 000	1 950 000	11 100 000	GIC-APD
	MERI	21	10 500 000	2 310 000	2 730 000	15 540 000	SAILD
	MOUTOURWA	22	11 000 000	2 420 000	2 860 000	16 280 000	GEFRADER
	MAROUA II	20	10 000 000	2 200 000	2 600 000	14 800 000	GIC-ADER
	MAKARY	53	26 500 000	5 830 000	6 890 000	39 220 000	
	NDOUKOULA	15	7 500 000	1 650 000	1 950 000	11 100 000	ALD CONSULT
	KOUSSERI	5	2 500 000	550 000	650 000	3 700 000	
	MAROUA III	20	10 000 000	2 200 000	2 600 000	14 800 000	
TOTAL		**1 559**	**779 500 000**	**171 490 000**	**202 670 000**	**1 153 660 000**	

3-3. Renforcement des capacités du personnel

Au cours de l'année 2008, plusieurs ateliers ont été organisés au niveau national. Il s'agit de :

(i) L'atelier de finalisation du cadre de résultat du PNDP et d'élaboration des chronogrammes qui s'est tenu du 17 au 26 avril 2008. Cet atelier a permis d'arrêter avec les principaux partenaires du Programme, les indicateurs de performance et d'impact du cadre de résultat du PNDP et d'élaborer le chronogramme de mise en œuvre du PTBA 2008.

(ii) L'atelier de consolidation des bases de données comptables. Cet atelier a été l'occasion pour la Cellule Administrative et Financière du Programme de consolider les bases de données en vue de la production des états financiers de l'exercice 2007 et la préparation de l'audit financier externe du PNDP.

(iii) L'atelier de capitalisation des activités du JSDF tenue à Mbalmayo du 10 au 12 juillet 2008

(iv) L'atelier de formation des formateurs des OAL tenue à Kribi du 23 au 27 juin 2008

(v) L'atelier semestriel de bilan et reprogrammtion du 01 au 05 septembre 2008 à Bafoussam

(vi) L'atetier annuel de programmation tenue à Kribi au cours du mois de décembre 2008.

3.4 Impacts enregistrés au titre de la composante

La mesure de l'impact au titre du renforcement des capacités des acteurs a été faite au moyen d'indicateurs d'appropraition du processus participatif, se traduisant par la prise en charge du développement par les communautés rurales. A titre d'illustration, on peut souligner qu'à la suite des interventions du Programme, 81% des comités de concertation, organes chargés du suivi de la mise en œuvre des plans sont fonctionnels et gèrent de façon autonome les questions de développement de leurs locaités. De plus, 92% des cas, les communautés ayant renouvelé leur CC (bureau élu pour 2 ans) l'on fait sur leur propre initiative.

Sur un tout autre plan, 70% des localités accompagnées disposent désormais une épargne locale destinée au développement et dont la somme totale est estimée à 420 millions de F CFA. Le montant estimé des investissements des communautés dans la mise en œuvre de leurs PDL est de 1,5 milliards FCFA. Ceci traduit un réel éveil au sein des populations à la suite du travail des OAL recrutés par le PNDP.

4- Composante 4 : Coordination, Gestion, Suivi Evaluation, Communication.

Au titre de cette composante, les principales activités ont été : (i) la tenue de la 6ème et la 7ème session du Comité National d'Orientation et de Pilotage du PNDP, la tenue des Comités Paritaires d'Approbation de niveau Provincial et de niveau communal (CPAP et CPAC), (ii) les missions de supervision et de suivi de la Cellule Nationale de Coordination et des Cellules provinciales du Programme, (iii) une mission de supervision conjointe Gouvernement–Baileurs, (iv) la mobilisation des fonds et (v) les actions de communication.

4-1 Coordination

- *Interne*

Le 20 février 2008, s'est tenue à l'Hôtel Hilton de Yaoundé, la 6ème session du Comité National d'Orientation et de Pilotage du PNDP. Au cours de cette session le rapport d'activités de l'exercice 2007, ainsi que le Plan de Travail et Budget Annuel 2008 ont été validés. La 7ème session s'est tenue le 04 juillet 2008 et s'est penchée entre autres sur les conclusions de la revue à mi-parcours et les recommandations de la mission conjointe Bailleurs-gouvernement du mois de mai 2008.

- *Avec les partenaires techniques et financiers*

La coordination des actions avec les partenaires au cours de cette année a concerné essentiellement le partage des plans d'activités entre les partenaires au cours des comités de pilotage des différents projets et programmes. C'est ainsi que le Coordonnateur National du PNDP a pris part : (i) au comité de pilotage du PADC, (ii) au comité de pilotage du PADDL en date du 4 avril 2008. Par ailleurs, les partenaires du programme à savoir la SNV, le PADC, le PADDL, le FEICOM, etc. ont été invités à prendre part aux deux sessions du CNOP.

Cette année a également été marquée par l'institution de rencontres périodiques du Programme avec ses bailleurs. Deux sessions se sont tenues au cours de l'année 2008 et la 3ème a eu lieu le 14 janvier 2009.

S'agissant des collaborations spécifiques, le processus de sélection des coachs pour appuyer les communes dans l'amélioration de leurs recettes fiscales a été mené avec le PADDL. Le PNDP a été représenté par le Responsable de la Formation à un séminaire de formation des coachs des communes organisé par le PADDL/GTZ.

Pour ce qui est de la plateforme de collaboration avec le FEICOM, un plan d'action a été élaboré au cours de l'année 2007. La mise en œuvre de ce plan d'action a démarré par une mission conjointe. Comme autres actions, il est prévu d'élaborer un manuel simplifié de procédures de collaboration entre les deux structures, notamment en ce qui concerne les mécanismes de financement conjoint des microprojets.

4-2 Gestion administrative

Au cours de l'année le processus de remplacement de certains cadres a été lancé et suivi. Ainsi, des appels à candidatures ont été lancés pour le recrutement : d'un consultant à temps partiel pour appuyer à la mise en œuvre du Projet de Gestion Durable des Terres, d'un Responsable Provincial du Suivi Evaluation pour le Nord, d'un Comptable Provincial pour le Nord et d'un Responsable Provincial de la Formation et de la Communication pour l'Ouest. Des sous-commissions ont été désignées par la commission spéciale des marchés du PNDP pour l'analyse des dossiers de candidature qui ont été déposés à la CNC. Le processus a été finalisé pour le consultant à temps partiel pour appuyer à la mise en œuvre du Projet de Gestion Durable des Terres, tandis qu'il est en cours pour les autres postes. Pour ces derniers dossiers, le rapport d'évaluation final a été sousmis à la commission spéciale de passation de marché placé auprès du PNDP. Le processus sera finalisé au cours du mois de janvier 2009.

4-3 Gestion financière

Le budget de l'exercice 2008, validé au cours de la 6ème session du CNOP s'élevait à **10,641 milliards F CFA,** réparti entre les bailleurs ainsi qu'il suit :

COMPOSANTES	SOURCES DE FINANCEMENT S								
	TOTAL	IDA	PPTE	C2D	KFW	ETAT NUM KFW	ETAT NUM	ETAT FCG IMP. & TAXES	BÉNÉF
AFDCR	6 031 628	2 356 136	32 305	2 441 619	616 000	-	-	361 324	224 244
APPUI AUX COMMUNES	575 861	192 068	41 929	233 347	30 719	-	31 078	46 720	-
RENF.CAPACITES DES ACTEURS	1 586 279	100 662	-	1 239 304	121 789	11 111	27 003	86 410	-
COORD, GESTION, SE & COM.	2 447 233	197 340	180	1 242 200	518 720	48 889	281 919	157 984	-
Total	**10 641 000**	**2 846 205**	**74 414**	**5 156 470**	**1 287 228**	**60 000**	**340 000**	**652 439**	**224 244**

4.3.1 Mobilisation des ressources

- ***Fonds de contrepartie***

Le Programme a obtenu une inscription budgétaire d'un montant de 400 millions. Ces fonds ont été engagés par Bon N° E041878 du 16 juin 2008. Le paiement a été effectué le au cours du 3ème trimestre 2008.

- ***Fonds IDA***

A la fin de l'année 2008, le reliquat des fonds IDA s'élève à 2,01 milliards FCFA La mobilisation des fonds IDA s'est faite de façon régulière. Il a été accordé au PNDP la possibilité de procéder à des Demandes de Remboursement des Fonds, aussi bien sur la base des pièces comptables nationales que provinciales.

- ***Fonds PPTE***

Pour l'exercice 2008, il n'a pas été inscrit de fonds PPTE pour le MINEPAT. Le Programme ne pouvant donc avoir aucune provision de fonds PPTE pour l'année. Au cours de la 7ème session du CNOP, cette situation a été une fois de plus examinée par les commissaires. Il a été demandé au PNDP de se rapporcher des services du Premier Ministre pour suivre les évolutions relatives aux fonds PPTE 2008. Au cours du second trimestre 2008, un dossier a été monté et soumis à l'attention du Chef du Gouvernement et au Ministre des Finances. En parallèle, des actions ont été initiées au niveau du MINEPAT et une réunion a été sollicitée par la Direction du Budget du MINEPAT pour aborder la question avec le MINFI. EN fin de compte, il a été demandé au PNDP de préparer un Avant Projets d'Exécution pour l'exercice 2009 et de la soumettre à la tutelle en préparation des affectations de fonds PPTE de l'année 2009.

- ***Fonds C2D***

Les fonds inscrits pour le PNDP pour l'année 2008 s'élèvent à 4,445 milliards FCFA. L'Avant Projet Détaillé a été examiné par le STADE au cours de sa session du 27 février 2008. Les Bons d'engagements, ont été signés le 11 juin 2008 pour chacune des rubriques de financement du C2D. Suite à quelques erreurs certains Bons d'engagement émis pour la mobilisation de ces fonds, seul 4 milliards ont été virés au Programme le au cours du 3ème trimestre 2008. Le paiement du reliquat est intervenu au 4ème trimestre 2008.

N° Bon engagement	Libellé	Montant
N°E003982	Subvention de fonctionnement aux Etablissements Publics Administratifs et autres organismes	640280320
N°E003981	Subventions, autres transferts courants aux unités administratives (Coordination, Gestion et Suivi Evaluation)	416013820
N°E003980	Appui au renforcement des capacités des acteurs	1069214780
N°E003979	Appui aux communes dans le processus progressif de décentralisation	119011700
N°E003978	Appui au développement des communes et communautés rurales, subventions, autres transferts courants aux unités administratives	2118813520

N°E003977	Subvention d'investissement aux EPA	81665860
TOTAL		**4445000000**

4-4 Suivi Evaluation

Au cours de cet exercice, la Cellule Nationale de Coordination, a conduit une enquête interne afin de mesurer les performances et l'impact des activités du PNDP. Cette évaluation s'est faite dans les cinq (05) provinces couvertes depuis 2005. En la CNC a effectué deux missions globale de supervision dans les 6 provinces de sa zone actuelle d'intervention respectivement en avril et en août 2008. Au niveau provincial, plusieurs missions ont été effectuées, pour le suivi et supervision des activités sur le terrain et l'appui aux OAL dans l'exécution de leurs contrats.

En outre, le processus de lancement des études relatives à la qualité des ouvrages, initiées au cours de l'année 2008 ont été poursuivies. Il s'agit de :

L'étude en vue de l'élaboration des référentiels et prescriptions techniques des ouvrages et équipements des bases. Les TDR de cette étude ont été améliorés et transmis à l'AFD le 24 juillet 2008 pour avis de non objection, ainsi que l'appel à manifestation d'intérêt et le dossier d'appel d'offres. Les dernières observations de l'AFD sont officiellement parvenues au PNDP en fin décembre 2008, ces observations ont été intégrées et le processus de passation de marchés suit son cours.

L'Audit Technique des réalisations du PNDP et l'Evaluation de la performance socio-environnmentale du PNDP, démarrés en 2007, ont été finalisés. Les rapports définitifs ont été améliorés suite aux observations du PNDP.

Au cours de cette année également, deux études relatives aux systèmes appropriés de traitement des déchets de marchés et des déchets médicaux dans le cadre du PNDP a été exécutés.

En prélude à la 2ème phase d'exécution du PNDP, une étude portant sur l'impact potentiel des microprojets hydrauliques du PNDP sur les eaux internationales a été éxécutée. Le rapport final a été transmis à la commission du Bassin du Lac Tchad et à l'Autorité du Bassin du Niger pour compétence.

4-5 Aspects socio-environnementaux

Aspects sociaux

4.5.1. Plan de Développement des Peuples Pygmées (PDPP)

Mis en œuvre de manière complémentaire et en cohérence avec le Progamme dans son ensemble, l'objectif général du PDPP est d'assurer que le processus de développement engagé favorisera le respect total de la dignité, des droits de la personne et la culture des peuples autochtones. En raison de leur mise en œuvre séquentielle, les résultats et effets obtenus ont été capitalisés.

Cette opération spécifique est mise en œuvre dans 9 communes de la province du Sud (Akom II, Niété, Campo, Bipndi, Lolodorf, Lokoundjé, Djoum, Mintom et Oveng, le PDPP s'est

décliné depuis bientôt un an, sur le plan opérationnel en un plan d'action structuré autour de 05 composantes à savoir la citoyenneté, l'éducation, la santé, l'agriculture et gestion des produits forestiers non ligneux, le dialogue intercommunautaire et sécurisation foncière.

En terme de résultats, la première phase du programme a permis à la suite d'un processus participatif de mettre en place un dispositif institutionnel assorti d'un certain nombre d'outils notamment les Conventions, les protocoles d'accord, les contrats programmes, etc., capable de canaliser et d'optimiser toutes les ressources techniques, matérielles, actuelles et potentielles en faveur des PP.
Sur le plan opérationnel, au delà de ce dispositif institutionnel, les activités de la première phase ont permis de toucher/sensibiliser 183 campements dans les 09 communes, et d'avoir une meilleure connaissance de la problématique de ces PP estimés à 8200 personnes.

En matière de citoyenneté, 170 personnes venant des PP ont été formées à l'éducation citoyenne et au leadership. Le processus a permis d'améliorer la représentativité des PP dans les instances de décision au niveau local : 20 PP supplémentaires sont à ce jour représentés dans les comités de développement, les associations de parents d'élèves, le COSA, COGE, et d'autres instances locales. 287 cartes nationales d'identité et 723 actes de naissance sont en cours d'établissement, et ces chiffres devront être portés respectivement au moins à 2600, et 2200 d'ici juin 2009. Un système d'enregistrement systématique des naissances des enfants pygmées a été mis en place ou renforcé dans 03 des 09 communes d'intervention.

En matière de santé, les capacités de 60 accoucheuses traditionnelles ont été renforcées ; 08 séropositifs sont identifiés et suivis de manière rigoureuse ; 06 leaders PP ont été identifiés et suivent une formation en soins élémentaires dans les CMA, 10 femmes enceintes sont suivies pendant leur grossesse ; les formations sanitaires de 03 communes ont reçu des appuis nutritionnels et en médicaments essentiels. De même, 02 structures d'accueil notamment le FONDAF et le Foyer Petits Samaritains ont reçu des appuis nutritionnels pour améliorer l'alimentation des enfants pygmées. Il est prévu de renforcer les structures d'accueil du FONDAF, et le processus de marché y relatif est en cours

Dans le domaine de l'éducation, 990 kits scolaires ont été mis à la disposition des écoles primaires fréquentées par les enfants pygmées, et bénéficient à la fois au bantou ; 45 enseignants du primaire ont été formés aux techniques ORA et d'apprentissage aux minorités. Il est également prévu la réhabilitation des CEB et des écoles maternelles notamment à Djoum, Akom II et à Mintom.

Dans le domaine de l'agriculture et gestion des PFNL, les capacités de 905 agriculteurs ont été renforcées en termes de matériel agricole, d'organisation et de gestion des PFNL et il est prévu l'acquisition du matériel végétal d'ici le début de la campagne agricole en mars 2009.
Pour ce qui est de la sécurisation foncière, le processus de négociation des parcelles en faveur des PP, amorcé par le Projet AGESFO et PADES, s'est poursuivi dans 03 campements dans de Djoum et Mintom, et devra permettre aux PP de jouir des droits d'usufruit sur des espaces reconnus légalement par l'administration et les bantous.

Le suivi de la mise en œuvre de ces activités est assuré par les services étatiques concernés qui bénéficient des appuis logistiques du PNDP. Globalement, les résultats actuels seront significativement améliorés d'ici juin 2009, date prévue pour l'évaluation du plan annuel d'action dont le coût global est estimé à 380 millions.

Comme difficultés, ont peut citer :

- La lenteur de mobilisation des fonds nécessaires au financement des activités retenues ;
- La mobilité importante des maires, et même des représentants des PP signataires des comptes abritant les fonds des activités, ce qui allonge des délais de signature et porte un coup à la célérité du processus.
- Le manque de professionnalisme plusieurs prestataires de service a également considérablement allongé les délais de passation des marchés, et de valorisation des fournitures et équipements sollicités notamment les appuis nutritionnels, le matériel roulant et les fournitures scolaires
- La charge de travail et l'étendue de la zone d'intervention

4.5.2. Aspects environnementaux

Au cours du premier semestre 2008, l'étude sur l'Evaluation de la Performance Environnementale et Sociale du PNDP a été réalisée en mai 2008. Elle fournit un ensemble des mesures correctrices à mettre en œuvre pour certains microprojets. De même, l'étude sur les systèmes de traitement des déchets des marchés a été réalisée et devra permettre de mettre en place des systèmes adaptés des traitements des déchets des marchés financés par le PNDP. Les conclusions de ces études sont en cours d'exploitation pour leur mise en œuvre. Enfin, l'utilisation du formulaire du screening environnemental et social pendant l'élaboration des microprojets devient de plus en plus systématique.

Conformément aux conclusions de la dernière mission conjointe de supervision des bailleurs de mai 2008, le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature a été saisi par le MINEPAT à l'effet d'amorcer les discussions pour la facilitation des procédures des études d'impacts environnemental, et d'organiser une série de formations en environnement des parties impliquées dans la chaîne de mise en œuvre du PNDP, en l'occurrence le personnel du MINEP. Enfin, quelques indicateurs de suivi des aspects socio-environnementaux ont été définis pour être intégrés dans le système de suivi et évaluation du PNDP. Au cours de l'enquête interne du Programme, on noté une amélioration sensible du pourcentage de microprojets exécuté ayant fait l'objet d'un screening environnement.

4-6. Communication

Au cours de cette année, les actions de communication, outre la participation au Salon de l'entreprise PROMOTE 2008, qui s'est tenu à Yaoundé du 05 au 20 décembre 2008, ont surtout concerné les tâches récurrentes de communication, notamment la couverture médiatique des évènements, l'information sur le Programme à travers les dépliants et les plaquettes et la diffusion des réalisations du Programme à travers le site Internet.

5- AUTRES DOSSIERS

5.1. Projet de renforcement des capacités des communautés rurales en évaluation et gestion durable des plantes médicinales

Financé par un don de la Coopération Japonaise (Japanese Social Development Fund), ce projet est arrivé sur le plan institutionnel à son terme avec laclôture de l'Accord de Don le

04 juillet 2008. Il, a été mis en œuvre dans 02 provinces (Ouest et Sud), en deux phases successives, avec deux Organisations non Gouvernementales (OPED et CARFAD). La première phase couvrant 20 communautés concernées, soit 15 dans le Sud et 5 à l'Ouest, a été mise en œuvre par OPED. Les enseignements tirés de cette première phase (pilote) ont été capitalisés et valorisés lors de la deuxième phase couvrant 39 communautés, soit 27 dans le Sud et 12 à l'Ouest. Cette deuxième phase a été mise en œuvre simultanément par les deux ONG suscitées, soit OPED au Sud et CARFAD à l'Ouest. Cette mise en œuvre progressive a permis de consolider les acquis en particulier dans les premières communautés bénéficiaires.

Les principaux résultats de cette opération se présentent ainsi qu'il suit composante par composante :

Composante 1 : Formation des communautés

Sous cette composante dont l'objectif est le renforcement des capacités des communautés dans la gestion durable des ressources naturelles et particulièrement des plantes médicinales, 900 personnes comprenant environ 20% de femmes ont été formées dans les 59 communautés bénéficiaires du projet aux techniques d'inventaire et de gestion durable des plantes médicinales. Au delà de cette formation, un guide pratique en gestion durable des ressources naturelles et des plantes médicinales en particulier à l'usage des paysans a été édité en 500 exemplaires. Aussi, le projet a procédé à une série de campagne de sensibilisation des parties aux objectifs et au bien fondé du projet, par le biais des réunions, des causeries éducatives et des médias. La diffusion des spots et des articles dans les médias publics et privés, la préparation et la distribution de 2000 dépliants présentant le projet ont permis d'atteindre de nombreuses communautés non couvertes par le projet. Au total, au moins 20 000 personnes ont été sensibilisées, et ont participé de manière directe ou indirecte au succès de l'opération.

Composante 2 : **Evaluation qualitative et quantitative des ressources en plantes médicinales**

Au titre de cette composante dédiée à l'évaluation des ressources en plantes médicinales, de leurs valeurs socio-économique et à l'identification des espèces potentiellement menacées et de déterminer le niveau viable de récolte au regard des données d'enregistrement des récoltes.

Comme résultats pour cette première phase près de 2038 espèces de plantes dont 766 représentant les herbacées et 1272 arbres et arbustes ont été inventoriés. Pour la seconde phase, près 421 espèces de plantes médicinales recensées à l'Ouest et reparties dans 113 familles botaniques et 242 plantes médicinales appartenant à 67 familles. S'agissant de la détermination d'un niveau viable des récoltes des plantes médicinales, une liste des espèces pouvant être considérées comme menacées ou en voie de disparition, ont été déterminées.

Composante 3 : Elaboration des plans de gestion durable des plantes médicinales

L'objectif de la composante est d'aider les communautés sur la base des données du diagnostic socio-économique, des données d'inventaires et des informations contenues dans les registres de déclaration des récoltes , à élaborer et mettre en œuvre leurs plans de gestion durable des plantes médicinales et autres produits forestiers non ligneux . En terme de résultats, 59 communautés bénéficiaires sur les 60 prévues ont élaboré de manière participative un plan de gestion durable de leurs plantes médicinales. Le processus d'élaboration a débouché au niveau de ces communautés, à la mise en place de 38 comités de gestion dont 15 à ce jour, un statut légal. La mise en œuvre de ces plans est effective dans la plupart de ces 59 communautés bénéficiaires.

Composante 4 : Audits annuels

L'objectif de la composante est de faire un audit afin d'avoir une bonne visibilité sur la gestion des fonds du Don JSDF. Pour atteindre cet objectif, les audits ont été régulièrement réalisés et les recommandations formulées ont été mises en œuvre.

5.2. Projet de Gestion Durable des Terres (PGDT)

De façon globale, la mise en œuvre du PGDT a connu quelques retards dus à la spécificité de cette opération.

Les résultats capitalisés au titre de cette opération sont les suivants :

i. Information/sensibilisation des parties prenantes impliquées dans la problématique de gestion des terres dans les zones d'intervention du Projet;
ii. Mise au point d'outils pratiques de diagnostic participatif et de planification locale des actions de gestion des terres;
iii. Mise au point d'un canevas de préparation des microprojets de gestion des terres assorti d'une liste d'indicateurs d'impacts potentiels.
iv. Élaboration/actualisation de 36 PDL et de 09 PDC desquels 41 microprojets sont en cours de financement ou d'exécxution, et devront permettre à plus de 35 communautés et communes dans le Nord, l'Adamaoua, l'Ouest et le Centre d'adopter des bonnes pratiques de gestion durable des terres
v. Signature effective de 41 conventions de cofinancement des microprojets réparties ainsi qu'il suit :

- NO : 25 conventions signées dont, 10 Mp achevés ; 12 en cours d'exécution et d'exécution
- AD : 9 conventions signées pour MP dont 3 achevés, 9 en cours d'exécution
- CE : 3 conventions signées et le processus de fiacement est en cours
- OU : 4 conventions, 1 communale signée et 3 communautaires.

6. ACTIVITES EN PERSPECTIVES

Au niveau National

- Mission de pré-évaluation du PNDP phase II
- Organisation de la 8ème session du Comité National d'Orientation et de Pilotage
- Organisation d'une mission de supervision des CPP
- Suivi de l'étude sur l'élaboration des référentiels type des microprojets

Au niveau provincial

Adamaoua

- Le suivi des OAL dans l'accompagnement des communes et leurs communautés ;
- La sélection, la formation et la contractualisation des nouveaux OAL ;
- Le renforcement des capacités du personnel des communes, du personnel de la CRP et des prestataires ;
- Le suivi du processus de sélection des agents communaux et l'équipement en matériel informatique de certaines communes partenaires ;
- Le lancement du coaching des communes ;
- Le suivi de l'exécution des microprojets communaux et communautaires;
- Le suivi de l'approbation des PDL, PDC et des nouvelles requêtes de financement des microprojets;
- La formation des membres des conseils municipaux élargis aux sectoriels (nouvelle formule du CPAC) dans les nouvelles communes;
- Le renforcement de la concertation avec les différents partenaires du développement rural ;
- La signature des protocoles d'accord avec les dernières communes de la région;
- Le suivi des activités du Projet de Gestion Durable des Terres.

Extrême Nord

- Suivi de l'exécution des microprojets communaux ;
- Suivi de l'exécution du coaching dans les communes ;
- Suivi des OAL dans l'accompagnement des communes et communautés ;
- Supervision de la sélection des prestataires pour la réalisation des microprojets communaux et communautaires ;
- Sélection, formation et contractualisation des nouvelles OAL ;
- Mise en place et formation des CPAC ;
- Approbations des PDL, PDC, Requêtes
- Mise en place du SIG ;
- Remplacement temporaire des Assistants Techniques.

Nord

- Déploiement des activités dans les quatre dernières communes 2008 et celles issues de l'éclatement de la Communauté urbaine de Garoua (03).
- Préparation du financement de 10 MP communaux et 80 MP communautaires au cours de l'année 2009.
- Lancement du processus de recrutement de 10 agents communaux ;
- Dotation de 6 communes en matériel informatique.

- Préparation du renforcement de capacités des OALs et élus ;
- Information du public sur les activités du Programme par davantage de Communication afin d'amener les communautés et les Communes à s'approprier véritablement des outils de Développement mis à leur disposition.

Ouest

- Poursuivre le suivi de la mise en œuvre et la réception des MP en cours d'exécution;
- veiller aux impacts des microprojets achevés et réceptionnés ;
- Poursuivre le cofinancement des MP approuvés par les COMES/CPAR et dont les contributions des bénéficiaires sont mobilisées depuis 2006 ;
- Poursuivre le renforcement des capacités de 40 communes et la prise en charge des agents communaux ;
- Clôturer les contrats des structures d'accompagnement dans les 12 communes de 2007 et poursuivre le processus de la mise en œuvre des activités du PNDP dans les 10 communes de 2008 ;
- Compléter les effectifs de la cellule régionale pour l'Ouest
- Améliorer la coordination, la communication, la collaboration et l'harmonisation des interventions avec les autres acteurs
- Poursuivre le suivi de la mise en œuvre du Projet de gestion durable des terres.
- Consolider la base des données
- Préparer l'évaluation de la première phase (2005- 2008) du programme par les partenaires techniques financiers et définir les orientations du PNDP2.
- Poursuivre le suivi de la mise en œuvre du Projet JSDF

Sud

- Suivi des activités des OALs sur le terrain ;
- Recrutement des consultants en vue du montage des requêtes communales (pour ce qui est des Communes 2007) ;
- Poursuite de la mise en œuvre effective du PDPP dans les 9 Communes concernées ;
- Relance des marchés communaux de Djoum, Akom II, et Zoetele et exécution des ouvrages ;
- Réception des microprojets communaux et communautaires achevés ;
- Tenue de la session du CPAR/Sud en vue de la validation des PDC et des requêtes de financement des microprojets communaux.

6. PROBLEMES RENCONTRÉESRES ET SOLUTIONS ENVISAGEES

COMPOSANTE A

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
A1	La plupart des microprojets achevés ont un problème de fonctionnalité. Les comités de gestion de ces microprojets existent mais ne sont pas opérationnels.	- S'assurer que le mécanisme de pérennisation des microprojets, notamment la mise en place du comité de gestion et son mécanisme de fonctionnement, est bien défini dans la requête du microprojet **(CPP)** - Renforcer les capacités des membres des comités de gestion (sensibilisation, formation, **appui à l'élaboration des plans d'action** pour l'exploitation, la maintenance et l'entretien des microprojets) **(CPP)** - La désignation des comités de gestion doit se faire par une décision des maires. Cette décision devra entre autre préciser les missions du comité mis en place **(CPP)**
A2	Certains microprojets (Electrification en décentralisé, Marchés, Réseaux d'adduction d'eau potable) induisent des charges d'exploitation importantes, mais génèrent également des revenus. L'exploitation de ces MP requiert de ce fait des compétences dont ne disposent très souvent ni la commune, ni les comités de gestion	- Elaborer des outils pour favoriser la gestion et l'exploitation optimales de ces microprojets **(CNC)** - Former et accompagner les comités de gestion sur la base de ces outils **(CNC)**
A3	La qualité de certains microprojets achevés reste perfectible, les finitions ne sont pas bien faites. Ce qui pose le problème des normes et des standards techniques par type d'ouvrage.	- Accélérer le processus d'élaboration des standards techniques et des normes par type de microprojets **(CNC)**
A4	Le diagnostic n'est pas approfondi dans la préparation des microprojets communaux, avec pour conséquence, le choix d'options techniques non viables.	- S'assurer que les sectoriels (publics/privés) proposent au préalable plusieurs scénarii lors de l'étude de faisabilité, (laquelle fait par partie intégrante de la requête de financement), et soumettent ces options à la validation du maître d'ouvrage et du PNDP avant le développement technique de l'option choisie**. (CPP)**
A5	Les délais d'exécution ne sont pas respectés dus entre autres au manque de rigueur dans l'exécution et le suivi de l'exécution des contrats ;	- Tenir des réunions avec tous les partenaires des microprojets en retard à l'effet de les sensibiliser sur les risques encourus par le PNDP et les mesures dissuasives prévues par la réglementation en vigueur **(CPP)** - Appliquer des pénalités contractuelles

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
		et des sanctions administratives prévues par la réglementation à tous les niveaux de mise en œuvre **(CPP)**
A6	Existence des disparités dans les coûts des microprojets de même nature	- Veiller au strict respect des procédures de passation des marchés, notamment la règle de publication des offres, de concurrence et la justification des coûts anormalement bas ou anormalement élevés **(CPP)** - S'assurer désormais que les coûts des microprojets sont alignés sur les devis des plans types disponibles dans certains secteurs **(CPP)** - Les cas avérés de collusion ou de conflit d'intérêt doivent être sanctionnés **(CNC)**
A7	Les microprojets ne sont pas accompagnés des mesures adéquates permettant leur utilisation optimale	Dans l'élaboration des microprojets, prévoir des mesures d'optimisation des microprojets tels que : plantation d'arbres, mini aire de jeu, point d'eau, latrine, mini hangar pour commerce, etc. **(CPP)**
A8	Les microprojets achevés dans les communes déjà couvertes ne font plus l'objet de suivi de la CPP.	Définir avec les maires et mettre en place un mécanisme de pérenne de suivi des actions de développement au niveau communal **(CPP)**
A9	Plusieurs contrats d'exécution de microprojets et d'OAL ont fait l'objet de résiliation, mais les structures concernées sont susceptibles de changer de nom pour échapper aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur	Envoyer systématiquement à l'ARMP les dossiers des contrats résiliés **(CNC)**
A10	Il existe un nombre inquiétant de microprojets à l'abandon ou à l'arrêt depuis plus d'un an. C'est le cas des microprojets communaux de : Akom II, Djoum, Ma'an et Zoétélé dans le Sud ; marchés communautaires d'Akono dans le Centre ; marché communal de Pitoa et Electrification de la ville de Béka dans le Nord	Mettre en place en urgent une commission polyvalente composée de techniciens, financiers et juristes pour traiter définitivement ces cas et établir les responsabilités. **(CNC)**
A11	Il y a risque de ne pas pouvoir mobiliser à temps les financements attendus en vue de la réalisation des microprojets en cours de préparation	- Elaborer un chronogramme du processus de passation de marché pour chaque microprojet **(CPP) ;** - Rendre systématique l'élaboration des plans de passation des marchés dans chaque commune avec une première consolidation au niveau des CPP et un deuxième niveau de consolidation à la CNC pour partage avec l'ARMP**. (CPP) ;** - Elaborer le plan de trésorerie pour le

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
		financement desdits microprojets **(CPP).**
A12	Il y a une tendance à systématiser les études géophysiques préalables au montage des requêtes des microprojets d'hydraulique. Cependant, la fréquence d'échecs observés consécutivement au manque de matériels adéquats lors des différents sondages des sols, interpelle sur la nécessité de s'assurer de la présence d'une nappe phréatique suffisante en vue de l'implantation du microprojet.	Intégrer le coût des études géophysiques dans le montant de la requête et prévoir désormais la rubrique : *« Etude géophysique »* dans les DAO, afin de transférer au prestataire le risque inhérent à la faiblesse des études géophysiques pendant les études préalables des microprojets d'hydraulique. **(CPP)**
A13	Compte tenu de la nouvelle formule de contractualisation avec les OAL qui n'intègre plus le montage des requêtes, les CPP éprouvent des difficultés à financer cette rubrique dès lors que le bouclage du financement n'intervient qu'au terme du montage de la requête d'une part, et que la mobilisation de la contribution du PNDP est conditionnée par la signature de la convention de cofinancement et la disponibilité des fonds d'autre part.	Payer les avances des frais d'élaboration des requêtes sur les fonds propres des bénéficiaires mobilisés dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan de développement. (CPP)

COMPOSANTE B

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
B1	L'intérêt du protocole d'accord cadre avec les communes n'est pas encore bien perçu par les CPP et les maires. Par conséquent leur signature est considérée par ces derniers comme une simple formalité administrative.	Instaurer et systématiser au cours des missions de supervision, la revue des indicateurs de suivi du protocole d'accord contenu dans le cadre de résultat. Ces revues seront menées trimestriellement au niveau communal. Les évolutions constatées seront présentées dans les rapports trimestriels d'activités. **(CPP)**
B2	Les résultats du Programme obtenus au titre de cette composante, sont présentés de manière narrative et diffuse.	Présenter les résultats de cette composante sous la forme du tableau des indicateurs du cadre de résultats ; tableau devant permettre de voir les évolutions et les impacts desdites activités **(CPP)**
B3	Les CPP ne maîtrisent pas le mécanisme de paiement des agents communaux	Procéder au paiement des agents communaux au niveau provincial, en s'assurant de l'émission par le maire d'un bulletin de paie au nom de l'agent concerné accompagné de son rapport mensuel d'activités. **(CPP)**
B4	L'établissement des contrats programme avec les sectoriels n'obéit pas à la rigueur professionnelle nécessaire à leur mise en œuvre. Par conséquent les engagements souscrits ne sont pas respectés par les parties impliquées (Maire, CPP, Sectoriels)	Veiller à ce que les termes des contrats programmes, c'est-à-dire les engagements des parties et les modalités de mise en œuvre soient clairement définis. **(CNC)** Transmettre aux CPP un exemple de contrat

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
		programme bien rempli **(CNC)** S'assurer du respect par chaque partie des engagements souscrits dans les contrats programme **(CPP)** Sensibiliser la commune sur ses responsabilités en matière de maîtrise d'ouvrage**. (CPP)**

COMPOSANTE C

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
C1	Les PDC et PDL semblent secondaires par rapport aux microprojets dans la logique des maires.	Cf point B1 **(CPP)**
C2	Qualité faible d'examen des PDC/PDL par les CPP et même les CPAP/CPAC avec risque d'existence de PDC/PDL « passe-partout »	Préparer et mettre à la disposition des CPP des outils d'analyse de la qualité des PDC, PDL et des requêtes de financement **(CNC)**
C3	Suivi approximatif des OAL sur le terrain avec pour conséquence un faible niveau d'appropriation par les bénéficiaires	S'assurer de l'effectivité du travail des OAL sur le terrain à travers des missions ciblées de contrôle, avant paiement des tranches. **(CPP)**
C4	Il y a un risque que le processus de sélection des OAL échappe au contrôle des CPP du fait de son transfert aux communes	S'agissant des OAL en cours de sélection dans les communes 2007, la CPP doit suivre le processus de négociation mené auprès desdites communes, en s'assurant qu'elle est copiée de toutes les correspondances jusqu'à l'attribution du marché et la signature des contrats. **(CPP)**

COMPOSANTE D

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
D1	Qualité faible de la supervision technique des OAL et prestataires des microprojets.	Préparer et mettre à la disposition des CPP des outils de supervision des OAL et des prestataires **(CNC)**
D2	la centralisation du paiement des OAL a des répercussions sur leur présence effective sur le terrain et affecte la qualité des prestations.	Décentraliser le paiement des OAL de 2005-2006 au niveau des CPP **(CNC)**
D3	Les résultats du Programme sont très souvent présentés de manière narrative et diffuse.	Outre la partie descriptive des rapports, systématiser la présentation des résultas du Programme (composante 1,2,3 notamment) en respectant le canevas des indicateurs de performance et d'impact retenus dans le cadre des résultats du PNDP **(CPP)**
D4	Absence d'un système d'archivage des dossiers de passation des marchés au niveau des CPP et des communes	Acquérir du matériel (cartons, chemises…) et du mobilier spécifique pour le classement et l'archivage des dossiers de passation des marchés de la CPP. **(CPP)**

N°	CONSTATS	RECOMMANDATIONS
D5	Persistance des malaises dans la gestion du personnel avec pour conséquence un déficit de collaboration au sein de certaines unités de gestion notamment dans les CPP Sud, Ouest, Centre et Extrême Nord	Améliorer l'animation et la coordination au sein des unités de gestion à travers notamment des réunions périodiques d'évaluation interne. **(CPP)**

7. ANNEXES

1. Bilan détaillé des activités par composante ;
2. Liste détaillée des microprojets par province;
3. Plan de travail des six prochains mois.

4. *Annexe 1 : Bilan détaillé des activités des unités de gestion*

Site 01 – Cellule Nationale de Coordination

Etat d'avancement : Dans le cadre de la mise en oeuvre des actions compensatrices du Gouvernement aux populations riveraines du Pont sur le Lom, démantelé lors passage du Pipe Line Tchad Cameroun, le Premier Ministre avait instruit le PNDP de déployer ces actions dans ces localités. Suite à un travail d'animation communautaire, efectué par l'OAL CPDD, des plans de développement ont été élaborés dans les localités de LomI, LomII, Liguim et Tête d'Eléphant. De ces plans 4 idées de projets ont été identifiées et ont donné lieu à l'élaboration de 4 requêtes de financement dans les localités concernées.

AC113 : Aménagement des pistes rurales (01 - CNC)

Etat d'avancement : Dans la commune de Bélabo, la microprojet a consisté à l'aménagement de 16 Km de route sur le tronçon Goyou-Lom II. A cet effet, une requête de financement a été élaborée et soumise au financement du PNDP.

Au cours de l'année 2007, la société COTCO qui intervient dans la localité avait engagé une action de reprofilage de la route. Il avait alors été convenu que le projet à réaliser par le PNDP aille dans le sens de renforcer l'action alors entreprise par la COTCO. A cet effet, la requête de financement du microprojet a été ajustée et la convention amendée au début de cette année 2008.

A l'issue du processus de passation de marché, l'entreprise ETS BATI a été retenu pour réaliser l'ouvrage sous le contrôle technique des services du MINTP. Les travaux sont en cours d'achèvement et la réception provisoire interviendra d'ici au 30 janvier2009.

Observation : Il faut noter que le financement de ce microprojet a été fait de manière exceptionnelle sur instruction du PM du fait que le plan de couverture de la première phase du PNDP ne prenait pas en compte a province de l'Est.

Difficultés rencont : La difficulté rencontrée a été l'absence d'une équipe provinciale du PNDP pour assurer le suivi de proximité du microprojet. Ceci a eu pour conséquence un allongement des délais de réalisation et parfois la démotivation des populations bénéficiaires. Pour pallier à cette situation, la Cellule Nationale de Coordination s'est appuyée sur les services provinciaux des ministères sectoriels notamment le MINEPAT et le MINTP.

AL105 : Constr/réhabili/équipement CSI (01 - CNC)

Etat d'avancement : Le microprojet retenu par les populations de Liguim a porté sur la construction et l'équipement d'un Centre de Santé Intégré. Une convention a été signée le _____ avec la communauté de Liguim dans la commune de Bétaré Oya. Au cours de l'année 2008, les travaux ont été réalisés et le microprojet sera réceptionné d'ici le 30 janvier 2009.

B1101 : Etudes sur les réformes institutionnelles (01 - CNC)

Etat d'avancement : Au titre des études sur les réformes institutionnelles, le PNDP a mené en collaboration avec le MINATD, ue étude sur les besoins en personnels des CTD en vue de l'élaboration d'un tableau type des emplois communaux. Cette étude entend faire un diagnostic des ressources humaines au sein des communes à l'effet de proposer une formule d'emploi adaptée aux besoins des communes. L'étude a été menée a terme et le Consortium Axes Mangagement et Agora a déposé son rapport le 22 mai 2008. Les conclusions de cette étude ont été examinées par le comité de pilotage mis en place par le MINATD et un projet d'arrêté a été élaboré et soumis à la signature du MINATD.

B1201 : Etudes sur les réformes financières er fiscales (01 - CNC)

Etat d'avancement : Dans le cadre des études sur les réformes financières et fiscales, le PNDP a financé une étude sur la réforme de la fiscalité locale et le régime financier des CTD. Cette étude réalisée par le cabinet AGORA a été achevée depuis fin 2007. Le comité ad-hoc mis en place par le MINATD pour examiner le rapport a tenu sa 4ème session le 3 juillet 2008. Cette étude a abouti à la proposition de 2 projets de lois qui ont été soumis à l'examen d'un comité ad hoc, mis en place par le MINATD. Il est prévu que ces projets de lois soient par la suite transmis au Premier Ministère avant d'être envoyés à l'Assemblée Nationale.

B2102 : Prise en charge agents communaux (01 - CNC)

Etat d'avancement : Au cours de l'année 2008, il a été convenu d'évaluer l'apport des agents communaux déjà récrutés dans l'amélioration de la gestion au sein des communes avant d'envisager de lancer de nouveaux appels à candidatures. Au total, 58 appels à candidatures ont été lancés. Le processus a abouti dans 24 communes et les agents recrutés ont pris service et sont en fonction.

Observation : Une enquête menée auprès des maires des communes dans lesquelles les agents sont déjà en fonction a montré que cette activité permet d'améliorer sensiblement la gestion au sein des communes.

Difficultés rencont : La difficulté rencontrée dans l'exécution de cette activité reste la réticence de certains maires à lancer le processus et le suivre.

recommandations :

B2201 : Renforcement capacité élus locaux (CEFAM et autre) (01 - CNC)
Etat d'avancement : Le PNDP au cours de cette année a poursuivi le programme de formation démarré les années précédentes avec l'appui technique du CEFAM. Ces formations ont porté sur 4 thèmes suivants : (i) Exécution budgétaire volet recette; (ii) Exécution budgétaire volet dépense; (ii) comptabilité communale; (iv) patrimoine communale. ___ personnes additionnelles réparties dans _____ communes ont bénéficié de ces formations en 2008, ce qui ramène à ____ le nombre total de personnes formées par le PNDP avec l'appui technique du CEFAM.

B2202 : Renforcement capacité personnel/commiss° communal (01 - CNC)
Etat d'avancement : Le PNDP au cours de cette année a formé avec l'appui technique de l'ARMP ____ membres de ____ commissions de passation des marchés placées auprès des communes. Ces formations ont porté sur le code national des marchés publics, les procédures simplifiées des bailleurs et le classement des documents de marchés. Les formations se sont déroulées du 22 au 16 octobre 2008 selon le calendrier ci-dessous :
- OU (11) : Bafoussam 22 au 25/09/08
- NO (4) et AD (6) : Garoua 13 au 16/10/08
- CE (18) : Mbalmayo 28/09/08 au 01/10/08
- SU (6) : Kribi 02 au 05/10/08

Observation :
Difficultés rencont :
recommandations :

B2203 : Coaching des communes (01 - CNC)
Etat d'avancement : A la suite de la formation des élus et du personnels communal par le PNDP avec l'appui technique du CEFAM, des coachs ont été recrutés pour appuyer les communes bénéficiaires desdites formations dans la mise en oeuvre des techniques apprises auprès du CEFAM. Une première vague de 7 coachs dont 5 dans le Centre et 2 dans l'Extrême Nord sont à pied d'oeuvres dans 11 communes. Les contrats des coachs du centre ont été signés par le Coordonnateur National le 10 juin 2008 eet la prestataion a débuté au cours du mois d'août 2008. Les premiers résultats de cet accompagnement seront évalués au cours du mois de février 2009. Le processus sera également mené dans les communes ayant déjà bénéficié de la formation avec le CEFAM.
Les communes concernées sont les suivantes :
CENTRE : DIBANG, BIBEY, NGAMBE TIKAR, MONATELE, BATSCHENGA et MENGANG
Extrême Nord: : Makary, Kousseri, Maroua 1er, Mokolo, Mogodé. Deux coachs ont été recrutés pour les 05 communes et un super coach a également été recruté pour suivre les coaches et sera pris en charge par le PADDL.

C1101 : Formation des OALs (01 - CNC)
Etat d'avancement : La formation des OAL au cours de cette année a été s'est inscrite dans le processus de sélection de ces consultants. Tous les OAL des listes restreintes communales ont été invité à la formation qui s'est déroulée du 21 juillet au 02 aout 2008 dans les provinces du PNDP selon le programme ci-dessous :

AD : 21 au 31 juillet 2008
CE : 21 au 31 juillet 2008
EN : 14 au 24 juillet 2008
NO : 22/23 juillet au 01/02 août 2008 (contrat de Touboro et Béka résiliés, sélection en cours pour associer ces OAL à la formation)
OU : 21 au 31 juillet 2008
SU : 21 au 31 juillet 2008

Ces formations ont été précédées d'une formation des formateurs qui s'est déroulée du 23 au 27 juin 2008 à Kribi. Les formateurs provinciaux ont par la suite déployé les formations dans leurs régions respectives sous la supervision des responsables de la CNC.
Observation : Il convient de signaler qu'au cours de cette formation, l'approche de planification locale a été revue. D'une approche globale, il a été question de demander aux OAL d'accompagner désormais les communes et communautés effectuer une planification secteur, afin de mettre en exergue les besoins de tous les secteurs.

C1202 : Sélection des OALs (01 - CNC)
Etat d'avancement : Au cours de cette année, le PNDP a expérimenté unenouvelle approche de sélection des OAL. Sur le plan technique, il a été retenu de séparer toutes les séquences du travail des OAL et les définir sous forme de contrats à commande. Un OAL ne peut prétendre à poursuivre le processus que si l'étapes précédente à été réceptionnée avec satisfaction par le PNDP.

Du point de vue de la maîtrise d'ouvrage du recrutement, les CCPM se sont chargée d'effectué la sélection avec l'aide du PNDP qui a appuyé les communes dans l'élaboration des list restreintes.
Observation : Il faut noter que le programme a exigé que les resultats de la sélection soient en dernier ressort soumis à l'avis de non objection de la CNC pour vérification du respect de ses procédures.
Difficultés rencont : Une difficulté rencontrée a été des cas où certains OAL se retrouvaient en tête de sélection dans plus d'une commune avec le même personnel.
recommandations :

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes (01 - CNC)
Etat d'avancement : Pour l'exécution des contrats des OAL des communes 2006 et ceux des communes 2007 ont poursuivi leurs travail d'accompagnement des bénéficiaires. Comme résultats, ____ PDC, __ PDL et ___ requêtes ont été élaborés au cours de cette années. De manière cumulative, le PNDP a appuyé les communes dans l'élaboration de ___ PDC, ___ PDL et __ requêtes
Observation :
Difficultés rencont : Le PNDP s'est butté a l'examen des documents des OAL (PDC, PDL et requêtes) avant leur adoption par les organes compétents de délibération. A cause du volume de travail énorme au sein des Unités de Gestion du Programme. cette situation a eu pour conséquence des délais longs dans le paiemnt des tranches des OAL qui ne peuvent être libérées que lorsque les résultats du travail de l'OAL sont jugés conformes à leurs cahiers de charge.
recommandations : Il a été demandé aux CRP de prévoir au cours de leurs budgets futurs des séances de validation des documents soumis au Programme par les OAL.

C2201 : Formation, atelier et seminaires (01 - CNC)
Etat d'avancement : Au titre des formations et ateliers le PNDP a organisé et/ou financés __ ateliers et __ formations au niveau national. Il s'agit de :

(i) L'atelier de finalisation du cadre de résultat du PNDP et d'élaboration des chronogrammes qui s'est tenu du 17 au 26 avril 2008. Cet atelier a permis d'arrêter avec les principaux partenaires du Programme, les indicateurs de performance et d'impact du cadre de résultat du PNDP et d'élaborer le chronogramme de mise en oeuvre du PTBA 2008.

- Atelier PTBA 2009 du 05 au 12 décembre 2008
- Atelier d'arrêt des comptes 2007 du __ au ___
-Atelier de formation des formateurs d'OAL du __ au ___
-atelier d'initiation des cadres à l'utilisation du GPS dans la perspective de la mise en place d'un SIG au sein du PNDP
-Atelier de capitalisation des résultats du JSDF du ___ au ____
- Atelier semestriel de bilan et programmation du ____ au ____

C2202 : Stages/voyages d'études (01 - CNC)
Etat d'avancement : Le PNDP a financés ___ stages et voyages d'échanges/études à l'étranger. Le listing de ces stages et vyages est le suivnat :
- Formation du CNA à La Rochelle du __ au ___;
- Formation du RFC à La Rochelle du __ au ___;
- Formation du SSE à La Rochelle du __ au ___;
- Formation de ASCOM à Paris par TOMATE du __ au ___;
-Voyage de l'agent communal de Monatélé à Koutaba et Kouoptamo duu __ au ___.

D1101 : Fonctionnement du CNOP (01 - CNC)
Etat d'avancement : Au cours de cette année 2 sessions du CNOP ont été organisées conformément au récommandations de la 5ème. La 6ème session s'est tenue le 20 février 2008 et a porté sur l'adoption du budget 2008. La 7ème session s'est tenue le 04 juillet 2008 et a permis de présenter l'état de mise en oeuvre du PNDP ainsi que les prochaines échéances du Programme arrivé à la fin de sa première phase de mise en oeuvre.

D1102 : Fonctionnement de la CSM (01 - CNC)
Etat d'avancement : La commission spéciale de passation des marchés à régulièrement focntionnée au cours de l'année 2008. Au total ___ sessions se sont tenues pour la passation de ___ marchés.
Observation : En fin d'année , le Premier Ministre a désigné un nouveau Président en la personne de M. NGUE pour cette commission des marchés du PNDP en remplacement de M. Wallah.

D1201 : Mise en oeuvre convention collaboration partenaire (01 - CNC)

Etat d'avancement : Au titre de la collaboration entre le PNDP et ses partenaires, plusieurs actions ont été menées enpartenariat avec le PADDL dans l'Extrême Nord, Plan dans le Nord, le FEICOM dans toutes les provinces conjointement couvertes.
Observation : Il faut noter que le suivi de la conventon entre le PNDP et le FEICOM a été difficile au cours de cette année à cause d'une charge de travail importante. Aucune des réunions programmée n'a pu être effectuée, toutefois des missions conjointes ont été organisées dans le cadre du suivi des microprojets, notamment dans la commune de Bafia.

D1301 : Atelier semestriel de bilan & programmation (01 - CNC)
Etat d'avancement : Le traditionel atelier de bilan et reprogrammation du PNDP s'est tenu à Bafoussam du ____ au ____ 2008. Cet atelier a permis de définir de nouvelles priorités et exigence pour le PNDP arrivée en fin de phase. Il s'est agit notamment : (i) de l'amélioration de la qualité de mise en oeuvre des microprojets, qui pour ce qui est des fonds IDA devront désormais être financés à partir de la CNC; (i) la mobilisation des fonds en vue d'atteindre les objectifs du Programme et (iii) la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption au sein du PNDP

D2201 : Prise en charge consultants fonctionnaires (01 - CNC)
Etat d'avancement : La prise en charge des personnels fonctionnaires de la CNC a été régulière cette année. Tous les 12 mois d'honoraies ont été payés du fait de la disponibilité des fonds C2D et des fonds de contrepartie de l'Etat

D2202 : Prise en charge consultantsprivée/consultant (01 - CNC)
Etat d'avancement : La prise en charge des consultants privés a été régulière.
Observation : La categorie 3 des fonds IDA étant épuisés, des ajustements s'avèrenet nécessiares pour équilibrer de manières globales les catégories de financement de l'IDA

D2203 : Prise en charge Personnel d'appui (01 - CNC)
Etat d'avancement : Les personnels d'appui ont été régulièrement payés.

D2204 : Prise en charge consultant courte durée (01 - CNC)
Etat d'avancement : La CNC a fait appels au cours de l'année quelques consultants de courte durée en appui à la Cellule financière. Au total __ contrats de courtes durée ont été passés pour persmettre de diligenter les dossiers en préparation notamment aux audits et autres échéances.

D2205 : Charges sociales CNPS (01 - CNC)
Etat d'avancement : Des discussions ont eu lieu avec la CNPS afin de régulariser la situation du personnel du PNDP. Une dotation spéciale du Gouvrnement a été accordée au PNDP pour apurer une partie de la dette du Programme envers la CNPS. Les échanges se poursuivent pour finaliser le processus.

D2210 : Loyers et charges locative (01 - CNC)
Etat d'avancement : Les locaux actuels de la CNC s'avèrent étroits au vue de l'accroissement des activités et le recrutement de nouveaux cadres. La prospection de nouvaeu locaux est en cours en vue de permettre la CNC d'être dans de meilleures conditions de travail.

D2217 : Frais conseil juridique (01 - CNC)
Etat d'avancement : Au cours de cette année, le PNDP a fait face à de nombreux contencieux. ___ dossiers ont été porté à l'attention du conseil juridique du PNDP.
recommandations : A titre préventif les dossiers contracuels du Programme doivent être soumis à l'examen du conseil juridique du PNDP avant signature par les parties.

D3101 : Elaborat° du PTBA (01 - CNC)
Etat d'avancement : L'atelier d'élaboration du PTBA 2009 s'est déroulé du ___ au __ à Kribi. Le projet de PTBA 2009 a été soumis à l'examen des bailleurs du PNDP le 19 décembre 2008 et le 14 janvier 2009. Ce document sera soumis à l'approbation du Gouvernment au cours de la 8ème session du CNOP prévue pour le mois de février 2009.

D3201 : Missions de suivi et de supervision (01 - CNC)
Etat d'avancement : La CNC a organisé au cours de l'année ___ missions de supervision générale des Unités de gestion. De plus ___ missions spécifiques ont été organisées pour apporter un appui aux Cellules provinciales pour des appuis particuliers
Observation : La fréquence moyenne des missions de supervision est d'une mission par trimestre.

D3302 : Enquête annuel de suivi (01 - CNC)
Etat d'avancement : Le PNDP a organisé en interne une évaluation de ses résultats et impacts. Cette évaluation a été menée sur la base d'une enquête interne menée par la Cellule de Suivi Evaluation du Programme et les cadres chargés des communes et des communautés. Les résultats de cette enquête seront exploités par une évaluation indépendante qui sera réalisée par le cabinet CRETES resruté à cet effet.

D3303 : Audit financier externe du Programme (01 - CNC)
Etat d'avancement : Le cabinet KPMG a exécuté sa mission d'auit des comptes 2007 au cours du premier semestre 2008. Un autre auditeur (OKALLA OHANDA) a été recruté pour auditer les comptes de la KfW.

D3307 : Evaluation d'impact (01 - CNC)
Etat d'avancement : Le cabinet CRETES a été recruté pour menée l'évaluation d'impact du PNDP en cette fin de phase I. L'étude est en cours depuis le 22 décembre 2008 et la rapport provisoire est attendu au plus tard le 30 janvier 2009.

D3308 : Fonctionnement du SGI (01 - CNC)
Etat d'avancement : De manière gloabe, les logiciels du SIG fonctionnent et permettent d'obtenir l'essentiel des informations des rapports du Programme.
Difficultés rencont : Une réelle difficulté qui persiste est l'interconnectivité des différents logiciels de la gamme TOMATE à savoir : Tecpro, Tompro et Tommarché.
recommandations : Il importe de se pencher de manière particulière sur ce problème pour le regler définitvement avant d'entrée dans la deuxième phase du Programme.

D4103 : Product° des plaquettes et dépliants (01 - CNC)
Etat d'avancement : Le PNDP a régulièrement produits des plaquettes et dépliants pour présenter ses activités au public. Au total ___ plaquettes et __ dépliants ont été produits et diffusés depuis le début du programme.

D4105 : Couverture médiatique activité (01 - CNC)
Etat d'avancement : Les activtés du Programme au cours de l'année ont été généralement couvertes par la CRTV télévisée et audio, ainsi que par le quotidien national.

D4106 : Gesti° du site internet (01 - CNC)
Etat d'avancement : Au cours de cette année, le PNDP a pu actualiser assez fréquemment son site en publiant de manière régulière les différentes activités en cours. Des réflexions sont en cours au sein de la CNC en vue d'une amélioration de la configuration actuelle du site.

Site 02 – Cellule provinciale de l'Adamaoua

AL000 : Appui financier aux communautés

Il est important de signaler que les informations que nous donnons sous le code analytique (AL 000) ne concernent que les activités menées en vue de financer des éventuels microprojets communautaires. Les informations relatives aux microprojets en cours d'exécution n'y figurent pas.

Etat d'avancement

Dans les communautés de Tignère, Bankim, Méiganga, et Bélel, la mobilisation des contributions des apports propres se fait de façon timide. Les maires de ces cinq communes se sont engagés à appuyer financièrement celles de leurs communautés les plus dynamiques en complétant leurs apports propres.
Dans la commune de Tibati par contre, 11 communautés ont mobilisé leur apport propre pour la réalisation de leurs microprojets et les conventions de cofinancement avec ces communautés ont été signées.

Difficultés rencontrées

L'une des difficultés qui persiste est la faible mobilisation des apports propres des bénéficiaires dans les communes partenaires.

Recommandations

Les OAL, les exécutifs communaux des communes partenaires et les autorités administratives doivent trouver des stratégies efficaces pour amener les bénéficiaires à mobiliser leurs apports propres.

AL105-01 : Construction et équipement du centre de santé de Djoundé (Commune de Ngaoundal)

Etat d'avancement

Le microprojet a été réceptionné définitivement le 18 octobre 2007.

Difficultés rencontrées

A ce jour la communauté n'a pas encore trouvé une résidence à l'Infirmier. Ce dernier est obligé de se loger dans l'enceinte du centre, ce qui n'est pas apprécié par certains bénéficiaires et peut être un facteur de blocage pour certains malades.

Observations

Le centre est déjà fonctionnel et reçoit en moyenne cinq (05) malades en consultation chaque jour. Le centre a reçu un lot de médicaments du Centre d'Approvisionnement Pharmaceutique Provincial (CAPP) au mois de mai 2008 pour une valeur de 571.500 F CFA et un commis a été désigné par le COSA. Ce centre a également reçu un appui de 150 000 fcfa de la commune pour son fonctionnement.

Recommandations

La commune et la communauté doivent fournir des efforts pour trouver un logement à l'Infirmier en service dans ce centre de santé. L'infirmier en collaboration avec le Maire et le président de CC doivent rendre opérationnel le COSA et le COGE mis en place.

Al 103-01 Réhabilitation de la Station Scan Water de Danfili Mambal (Commune de Ngaoundal)

Etat d'avancement

Le microprojet a été réceptionné définitivement le 15 mai 2008.

Difficultés rencontrées

Le circuit électrique de cet ouvrage est complexe, ce qui explique les multiples pannes électriques enregistrées.

Observations

L'ouvrage est en panne depuis quelques semaines. Un microprojet d'électrification rurale a été réalisé dans la communauté sur fonds BIP. Le comité de gestion de l'ouvrage pourra négocier le raccordement de la station au réseau électrique.

Recommandations

Il a été demandé aux membres du CC de prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre l'infrastructure en fonctionnement et assurer la pérennisation de l'ouvrage.

AL 103 – 02 Construction de deux puits busés équipés de pompes à motricité humaine à Pangar (Commune de Ngaoundal)

Etat d'avancement
La réception définitive a eu lieu le 24 septembre 2007.

Observations
Les deux puits réceptionnés sont opérationnels.

Recommandations
Il a été proposé au Maire de Ngaoundal de faire un suivi appui permanent au comité de concertation de Pangar en vue de pérenniser ces deux ouvrages.

AL 103 - 03 Réhabilitation de la station Scan Water de Béka Gotto. (Commune de Ngaoundal)

Etat d'avancement
Le microprojet a été réceptionné définitivement le 15 mai 2008.

Observations
L'ouvrage est en panne depuis quatre semaines pour des raisons liées au circuit électrique alimentant le château d'eau.

Recommandations
Le comité de gestion doit mieux s'organiser pour remettre l'ouvrage en marche et s'assurer de sa pérennité.

AL105-02 : Construction et équipement du centre de santé Demgoya (Commune de Ngaoundal)
Etat d'avancement
La réception provisoire de ce microprojet s'est effectuée le 17/10/2007 et la réception définitive a eu lieu le 17 /01/2008

Observations
Le centre de santé est déjà opérationnel et reçois en moyenne huit malades par jour. Le centre a également reçu une dotation en médicaments essentiels de la CAPP d'une valeur de 571 500 fcfa et un appui financier de 150 000fcfa de la Commune. Le centre a utilisé une partie du financement de la commune pour creuser un puit au sein de l'hôpital et fabriquer le placard pour arranger les médicaments essentiels. Le COSA et le COGE ont été mis en place.

Recommandations
Le Maire et les membres du comité de gestion doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour la pérennisation de cette infrastructure et que les médicaments de première nécessité soient disponibles à tout moment.

AL105-03 : Construction et équipement du centre de santé Bétara Gongo (Commune de Ngaoundal)

Etat d'avancement
La réception provisoire a été faite le 15 septembre 2007 en présence de toutes les parties prenantes et la réception définitive a eu lieu le 21 janvier 2008

Observations
Le centre de santé est déjà opérationnel et reçois en moyenne six malades par jour. Quinze accouchements y ont été eu lieu. Il a reçu un lot de médicaments du Centre d'Approvisionnement des Produits Pharmaceutique (CAPP) de l'Adamaoua au mois de mai 2008 pour une valeur de plus de 571.500 F CFA et un commis a été désigné par le COSA.

Recommandations
Les bénéficiaires ont été invités à maintenir le centre de santé toujours propre et d'assurer la pérennisation de cet ouvrage. L'infirmier doit accélérer les démarches auprès de la Délégation Provinciale de la santé publique pour que le centre soit régulièrement ravitaillé en médicament essentiel.

AL 107-01 Construction et équipement d'une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Kassa (Commune de Ngaoundal)
Etat d'avancement
Le microprojet a été réceptionné définitivement le 28 octobre 2008.

AL 107-02 Construction et équipement d'une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Salo Salassa (Commune de Ngaoundal)
Etat d'avancement
. Le microprojet a été réceptionné définitivement le 28 octobre 2008.

AL 107-03 Construction et équipement d'une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Bella Foukou (Commune de Ngaoundal)
Etat d'avancement
Le microprojet a été réceptionné définitivement le 28 octobre 2008.

Observations
Le microprojet est bien opérationnel et l'école abrite à ce jour près de 70 (soixante dix) élèves avec un Maître des parents.

AL 107-03 Construction et équipement d'une salle de classe + un bureau + un bloc latrine à Bella Foukou (Commune de Ngaoundal)
Etat d'avancement
Le microprojet a été réceptionné provisoirement le 19 juin 2008.

Observations
L'école a ouvert ses portes avec le bâtiment construit sur cofinancement PNDP. Près de soixante élèves sont inscrits dans cet établissement à la rentrée de septembre 2008 pour les classes de SIL et CP. Un instituteur a été recruté par les parents d'élèves. Les cours franco arabe se déroulent également dans cette classe pendant les week end. Près de soixante dix jeunes y sont formés. Toutes les réserves émises lors de la réception provisoire ne sont pas encore levées.

Recommandations
Le président de CC doit s'assurer que les réserves émises lors de la réception provisoire sont levées avant la réception définitive

AL 111 -01 Construction d'un foyer communautaire équipé pour la promotion de la femme et du jeune à Meng (Commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008, la convention a été signée le 03 juin 2008 et le virement de la contribution du PNDP s'est fait le 11 août 2008. L'avis d'appel d'offres national a été publié le 05 septembre 2009 et l'ouverture des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué aus Ets DAHIROU AMADOU. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Cet avis d'appel d'offres a été largement diffusé à travers la radio CRTV Adamaoua, le journal de l'ARMP et les affichages dans les lieux publics.

Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les travaux commencent à temps.

AL 107 –04 Construction de deux salles de classe équipées plus un bloc latrines opérationnelles à Gongotoua (commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin 2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s'est fait le 11 août 2008. L'avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué aux Ets BANDEH ENTERPRISE. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d'appel d'offres est publié dans le journal de l'ARMP.

Recommandations
Le Maire de la commune de Tibati, maître d'ouvrage de ce microprojet devra s'assurer du respect des procédures et accélérer la signature du contrat afin que les travaux commencent à temps.

AL 111 -02 Construction d'un foyer communautaire équipé pour la promotion de la femme et du jeune à Meidjamba (Commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin 2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA. Le virement des fonds s'est fait le 11 août 2008. L'avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à **l'Entreprise DEWA IBRAHIMA**. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d'appel d'offres est publié dans le journal de l'ARMP.

Recommandations
Le Maire de la commune de Tibati, maître d'ouvrage de ce microprojet devra s'assurer du respect des procédures et accélérer la signature du contrat afin que les travaux commencent à temps.

AL 103- 04 Mise en place d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Djaouro- Kombo (Commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin 2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA . Le virement des fonds s'est fait le 11 août 2008. L'avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à **la société DJIBO**. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Cet avis d'appel d'offres a été largement diffusé à travers la CRTV Adamaoua, le journal de l'ARMP et les affichages. Les forages ont l'objet d'un seul marché.

Recommandations
Le Maire de la commune de Tibati, maître d'ouvrage de ce microprojet devra s'assurer du respect des procédures lors de l'ouverture et l'analyse des offres pour ce marché.

AL- 105 -04 Construction et équipement d'un centre de santé à Mbirim (commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin 2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s'est fait le 11 août 2008. L'avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué aux **Ets RAHAMA & Fils**. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d'appel d'offres est publié dans le journal de l'ARMP.

Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les travaux commencent à temps

AL 107 – 05 : Construction de deux salles de classe et d'un bloc latrines opérationnelles à Minim (commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin 2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s'est fait le 11 août 2008. L'avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à **l'Entreprise NGOURA & Fils**. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d'appel d'offres est publié dans le journal de l'ARMP.

Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les travaux commencent à temps.

AL 107 – 06 : Construction de deux salles de classe et d'un bloc latrines opérationnelles à au C.E.S de Mbakaou (commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin 2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s'est fait le 11 août 2008. L'avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué aux **Ets OUMAROU YERIMA**. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Une large diffusion de ces offres a été faite par la commune de Tibati et la CPP AD. Cet avis d'appel d'offres est publié dans le journal de l'ARMP.

Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les travaux commencent à temps.

AL 103- 05. Mise en place d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Maïssaba (Commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin 2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s'est fait le 11 août 2008. L'avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à **la société DJIBO**. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Cet avis d'appel d'offres a été largement diffusé à travers la CRTV Adamaoua, le journal de l'ARMP et les affichages. Les forages ont l'objet d'un seul marché.

Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les travaux commencent à temps.

AL 107 – 07 Réfection de deux salles de classe à Mbella Assom (Commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin 2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s'est fait le 16 octobre 2008. L'avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre

2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à la société **La RELANCE**. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Cet avis d'appel d'offres a été largement diffusé à travers la CRTV Adamaoua, le journal de l'ARMP et les affichages.

Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les travaux commencent à temps.

AL 103- 06 Mise en place d'un forage équipé de pompe à motricité humaine à Tongo (Commune de Tibati)

Etat d'avancement
La requête de ce microprojet a été approuvée le 04 mars 2008. La signature de la convention a eu lieu le 03 juin 2008. Ce microprojet est financé sur fond IDA .Le virement des fonds s'est fait le 11 août 2008. L'avis d'appel d'offres pour le recrutement d'un prestataire pour exécuter ce microprojet a été lancé le 05 septembre 2008 et le dépouillement des offres a eu lieu le 06 octobre 2008. Le marché a été attribué à la **société DJIBO**. Le contrat est en cours de signature.

Observations
Cet avis d'appel d'offres a été largement diffusé à travers la CRTV Adamaoua, le journal de l'ARMP et les affichages. Les forages ont l'objet d'un seul marché.

Recommandations
Il est souhaitable que le Maire fasse des efforts pour respecter le plan de passation de ce marché afin que les travaux commencent à temps.

A.C. ***Appui financier au développement des communes rurales***

AC 106 - 01: Electrification rurale de la ville de Mbé (Commune de Mbé)

Etat d'avancement
La réception définitive a eu lieu le23 septembre 2008 toutes les réserves ont été levées.

Observations
Le microprojet est achevé et opérationnel. A l'heure actuelle, près de quatre vingt clients sont abonnés avec une dizaine d'activités génératrice des revenus crées.

Difficultés rencontrées
Elles sont surtout en particulier financière et concernent surtout l'achat du carburant pour ravitailler le groupe électrogène.

Recommandation*s*
Le comité de gestion doit veiller à ce que ce microprojet soit géré de façon durable. Le comité de gestion doit faire une bonne sensibilisation pour que le maximum des ménages s'abonne à l'électricité.

AC 106 -02 Microprojet d'électrification de la ville de Bélel (Commune de Bélel)
Etat d'avancement
Le marché a été attribué aux Ets Univers Cycle B.P 1626 Garoua. Les travaux sont achevés. La réception provisoire a eu lieu le 23 mars 2008. La réception définitive est prévue pour le 22 mars 2009.

Difficultés rencontrées
Pour l'instant la difficulté réside au niveau de la consommation du carburant et la nécessité d'avoir un agent bien formé en électricité pour faire des branchements chez les clients.

Observations
Les travaux ont été bien faits. Le microprojet est opérationnel. A l'heure actuelle la commune compte 115 abonnés et 15 clients en attente de branchement.

Recommandations
Le Maire doit veiller à ce que le comité de gestion de ce microprojet soit opérationnel et dynamique pour la gestion durable de cette infrastructure.

AC103-01 : Adduction en eau potable de la ville de Ngaoundal (Commune de Ngaoundal)
Etat d'avancement
Le microprojet a été réceptionné provisoirement le 09 février 2008. La réception définitive est prévue au 08 février 2009.

Observations
Les délais d'exécution de ce marché ont été dépassés. Le prestataire a saisi le CN du PNDP Maître d'ouvrage de ce marché pour solliciter une remise des pénalités à travers le Maire chef service dudit marché. Une suite favorable a été réservée à cette demande. Mais les avoirs du prestataire ont été saisis par le tribunal à la requête des créanciers dudit prestataire.

Difficultés rencontrées
Le prestataire a beaucoup souffert pour livrer ce marché. A cela se sont ajouté les multiples injonctions de la justice relatives à certaines créances de la société **LACAPES** vis-à-vis de certains de ses partenaires.

Recommandations
Le comité de gestion de ce microprojet doit développer des stratégies pour la pérennisation de cette infrastructure. La facture du prestataire ne pourra être payée que sur ordre du tribunal et à qui de droit.

A.C 103-02. Microprojet de réhabilitation de la Station SCAN WATER et son raccordement au réseau AES SONEL de la ville de Tignère (Commune de Tignère)

Etat d'avancement
Le microprojet a été réceptionné provisoirement le 06 juillet 2007. La réception définitive qui devrait avoir lieu le 05 juillet 2008 ne l'a pas encore été a cause du fait que l'ouvrage ne fonctionne pas correctement pour des raisons liées au circuit électrique entre le forage et le château.

Difficultés rencontrées
Elles ont été surtout d'ordre technique et sont surtout liées à la complexité de l'ouvrage et particulièrement son circuit électrique.

Recommandations
Le Maire doit saisir le prestataire afin qu'il corrige les défaillances observées et que l'ouvrage soit réceptionné définitivement. Le comité de gestion doit veiller à la bonne marche de cet ouvrage.

A.C 201-02. Microprojet de construction de deux bâtiments modernes au marché de Méiganga (Commune de Méiganga).

Etat d'avancement
Le marché pour l'exécution de ce MP a été attribué aux Ets ADIS. Les travaux sont en cours d'exécution. Les travaux sont au niveau de la finition des enduits. Toutefois, la pénurie généralisée de ciment retarde l'avancée des travaux.

Difficultés rencontrées
Les travaux connaissent à ce jour un grand retard dû à la lenteur du prestataire.

Observations
Une lettre de mise en demeure a déjà été servie à ce prestataire par le Maire Maître d'ouvrage de ce marché.

Recommandations
Le comité de suivi de ce microprojet doit veiller à la bonne exécution de ce marché et s'assurer du respect du cahier des charges.

A.C 201-01. Microprojet de construction d'un marché moderne dans la ville de Tibati (Commune de Tibati).
Etat d'avancement

Le marché a été attribué aux ETS HAMIDOU HAMADICKO pour un montant de 67.516.129 f CFA. Le contrat a été signé. Les travaux sont achevés à 95% à ce jour. La réception technique est prévue pour le 05 janvier 2009.

Observations
Aux dires des techniciens, la qualité des travaux est appréciable.
Recommandation :
Le prestataire doit accélérer les travaux pour les livrer à date

<u>Composante 2</u> : Appui aux communes dans le processus progressif de Décentralisation

B2101. Equipement des communes en matériel informatique et outil de gestion
Etat d'avancement
Les communes de Mbé et de Ngaoundal ont été dotées en outil informatique. Chacune de ces communes a reçu un ordinateur plus une imprimante laser et autres accessoires (onduleurs, baffles et tubes d'encre). L'appel d'offres pour l'acquisition de cinq autres ordinateurs plus leurs accessoires est en cours à la CNC pour équiper les communes de 2006.

B2102 : Recrutement d'un agent communal dans les communes
Etat d'avancement
La situation au 31 décembre 2008 se présente comme suit :

N°	**Commune concernée**	**Nom de l'agent retenu**	**Date de signature de contrat**
01	Ngaoundal	DJOMBAYE Bersala	06 février 2008
02	Méiganga	FANY DADY Landry	06 février 2008
03	Belel	MOHAMADOU	24 juin 2008
04	Tignère	HAMAN MISSA	01 août 2008
05	Tibati	MAMADOU	20 décembre 2008
06	Mbé	En cours	
07	Bankim	Appel non encore lancé	

Observations
Le Préfet de Mayo Banyo a été saisi à ce sujet et une mission conjointe CRP administration est prévue dans la commune de Bankim du 20 au 27 janvier 2009

<u>Composante 3</u> : Renforcement des capacités des acteurs

C1202 : Sélection des OALs

Etat d'avancement
En prélude à la sélection définitive des OAL qui devront accompagner les communes de 2007, un appel national à manifestation d'intérêt des OAL a été lancé le 10 septembre 2007 dans le quotidien national Cameroon Tribune. Le dépouillement et l'analyse des différentes propositions des OAL sont faits depuis le mois de janvier 2008. Les rapports des différentes commissions communales ont été transmis à la CNC pour l'arbitrage et la non objection. La publication des résultats a été faite et un OAL a été sélectionné dans chaque commune.
Les OAL retenus ont déjà signé leur contrat respectif.
Il s'agit de :
- ✓ GIC Sal pour accompagner la commune de Dir;
- ✓ SADER pour accompagner la commune de Banyo;
- ✓ GRADEV pour accompagner la commune de Galim Tignère ;
- ✓ ADDUCOB pour accompagner la commune de Mayo Baléo ;
- ✓ CNJD pour accompagner la commune de Kontcha ;
- ✓ Action Dix pour accompagner les communes de Ngaoundéré I, II, III, Nganha, Martap et Nyambaka.

Observations
La formation des OAL en planification locale et communale a eu lieu en juillet 2008.

C1203 : Contractualisation des OAL pour l'élaboration des PDL et PDC

Commune de Ngaoundal

Etat d'avancement

L'OAL CDCV a bouclé sont contrat d'accompagnement de la commune et les communautés de Ngaoundal depuis le 30 juin 2007.

Commune de Mbé

Etat d'avancement

L'OAL ADDUCOB a bouclé sont contrat d'accompagnement de la commune et les communautés de Mbé en 2008.

Commune de Bankim, Belel, Méiganga, Tibati et Tignère

Etat d'avancement

L'exécution des contrats respectifs dans ces communes est en cours. Les monographies sont déjà élaborées. La planification locale est achevée dans toutes les communes. L'élaboration des PDL est achevée. Les formations spécifiques sont réalisées à Tignère, Tibati et Bélel.

Les résultat obtenus pour l'instant se présentent comme suit :

OAL	Commune	Date signature contrat	Nbre de PDL élaboré	Nbre de PDL validé par le CPAC	Nbre de requêtes élaborées	Nbre de requêtes validées par le CPAC	Autres activités menées	Niveau d'appropriation du processus participatif	Obs
CAFED	Bankim	18/12/06	36	28	33	11	Monographie de la commune réalisée, Accompagnement en cours	Bon	Comm diffi l'
CANALDEV	Belel	15/01/2007	32	32	29	10	Monographie de la commune réalisée, PDC en cours	Bon	- Te réunio réguli CC - Réal certai activit CC attend extéri
GRADEV	Tignère	15/01/2007	28	28	26	24	Monographie de la commune réalisée, Accompagnement en cours	Bon	
SADER	Tibati	21/12/2007	44	44	44	44	Monographie de la commune réalisée, Accompagnement en cours	Assez bon	
SYDEV	Méiganga	12/03/07	49	49	13	13	L'OAL a élaboré des APD avec les sectoriels de la localité	Passable	

Difficultés

L'accompagnement des communautés n'est pas toujours conforme à ce que souhaite la CPP/AD. Il est demandé aux responsables des OAL d'effectuer une visite tous les quinze jours dans la communauté après la planification locale. Le comité de concertation doit respecter les recommandations qui leur seront données lors de ces visites. Ce calendrier n'est pas toujours respecté par les OAL.

C2201 : Formation – Ateliers – Séminaires
Atelier de validation du cadre de résultat et de mise à jour des bases de données du PNDP

Du 17 au 27 mars 2008, le RPSE a participé à Mbalmayo à l'Atelier de validation du cadre de résultat et de mise à jour des bases de données du PNDP organisé par la CNC.
Les résultats attendus de cet atelier étaient :

- ✓ Le PNDP dispose d'un cadre de résultats pour toutes ses composantes ;
- ✓ Le SGI est totalement fonctionnel et adapté au besoin en information du PNDP ;
- ✓ Les bases de données sont mises à jour et des états tests sont produits;
- ✓ Les chronogrammes sont disponibles et saisis pour l'année 2008 ;
- ✓ Les interfaces entre les logiciels sont fonctionnelles.

B- Recyclage à la maîtrise des NTIC des cadres de la CPP AD
Etat d'avancement
La deuxième formation prévue n'a pas finalement eu lieu et est reportée à l'année 2009.

<u>Composante 4</u> : Coordination, Gestion, Suivi – Evaluation Communication

D-1 Coordination du programme

D11 Fonctionnement des organes de délibération

D1104 Fonctionnement CPAC
Etat d'avancement
Au cours de l'année 2008, la session CPAC de Bankim s'est tenue le 09 mai 2008 et 10 requêtes ont été approuvées.

D-13 Coordination interne

D-1302 Réunion de suivi des prestataires et OAL

Etat d'avancement
Au cours de l'année 2008, neuf réunions de coordination mensuelle des activités des OAL et prestataires se sont tenues. Au cours de cette réunion, il a été question de passer en revue les activités des OAL pour le mois écoulé et de faire la programmation pour le prochain mois.

Recommandations
Les recommandations suivantes ont été formulées à l'endroit des OALs:

- Les OAL doivent déposer toujours leurs rapports sur format hard et électronique au secrétariat de la CPP/AD.
- Les OAL doivent se rapprocher des sectoriels pour les informer de l'évolution de leurs activités sur le terrain.

D-2 Gestion du programme

D2201 : Personnel fonctionnaires et privés
Etat d'avancement
.
Les a honoraires dus aux fonctionnaires et aux privés ont été payés régulièrement

D- 3 Suivi Evaluation
D31 Programmation

D3102 : Elaboration du PTBA 2009
Etat d'avancement
Du 19 au 24 novembre 2008 s'est tenu à Kribi l'atelier national d'élaboration du PTBA 2008 du PNDP. Tous les cadres de la CPP AD ont participé à cet atelier.

D32 Mission de suivi et de supervision
D3201 Mission de suivi et de supervision

Au courant l'année 2008, l'équipe de la CPP AD a effectué quarante missions de terrain, reçu quatre missions de supervision de la CNC et une mission conjointe de supervision CNC/Banque Mondiale et quatre missions de supervision de la Délégation Régionale du MINEPAT dans les communes.

D3308 – Fonctionnement du SGI

D3308-01 : Saisie des données

Etat d'avancement

A l'issue de la consolidation des bases des données du SGI, la mise à jour des données dans les logiciel Tompro et Tecpro se fait au quotidien. L'atelier de Mbalmayo nous a permis de mettre les bases à jour et de produire les rapports en tenant compte des indicateurs de résultats qui ont été validés avec les bailleurs de fonds

Site 03 – Cellule provinciale du Centre

AC103 : Approvisionnement en eau, Ngambè Tikar

Etat d'avancement *:* La convention de cofinancement a été signée et le Maire invité à compléter la contribution de la Commune d'un montant de 650 000 CFA pour que la CRP effectue le virement de la quote part du Programme dans le compte conjoint ouvert à cet effet.
Observations *:* Le Maire évoque des difficultés et malentendus avec son Receveur Municipal pour que ce dernier lui débloque la situation. Il importe de signaler qu'il reste incompréhensible de constater que pour un montant de 650000 F CFA, une Commune ne soit pas capable après deux ans de sensibilisation et d'interpellation parfois par les autorités administratives, de bénéficier d'un financement de 44 000 000 F CFA
Difficultés rencontrées *:* Désinvolture et désintéressement des différents exécutifs municipaux que se sont succédés à la tête de la Commune pour la mise en œuvre des activités du PNDP
Recommandations *:* La CRP continuera à interpeller le Maire pour finaliser la mobilisation de la contribution attendue de la Commune pour la réalisation de son microprojet.
AC103 : Approvisionnement en eau, Bot Makak
Etat d'avancement *:* Les travaux restent en cours en cours.
L'entreprise CODIPRO a réalisé ses six (06) puits et a finalisé les travaux objet des réserves des différentes missions de suivi contrôle sur le terrain. La Commune, le prestataire, le sectoriel et les populations riveraines bénéficiaires directes sont tombés d'accord du niveau de service rendu. Il reste au Maire de convoquer la réception des ouvrages en tenant à la CRP, les invitations accompagnées du rapport de pré réception technique de l'Ingénieur du Marché.
Le contrat de l'entreprise "COMMERCAN" pour la réalisation de trois (03) forages a été résilié pour défaillance technique notoire. Un autre prestataire a été recruté pour finaliser la construction des deux forages restant et l'amélioration du niveau de service du forage construit par la précédente entreprise. Le nouvel adjudicataire est en cours de finalisation des formalités administratives pour commencer l'exécution de ses travaux dès janvier 2009.
L'Entreprise HFM a reçu une mise en demeure de livrer ses deux puits. Ce délai est expiré et le Maire a été invité à prendre ses responsabilités en résiliant ce contrat, l'entreprise ayant manifestement fait preuve de défaillance technique et de refus de collaborer avec les partenaires à la mise en oeuvre de ce projet.
Observations *:* La fluctuation du niveau de la nappe d'eau pendant l'intersaison, causant le tarissement de certains puits a amené l'équipe de suivi contrôle à demander à l'entreprise Codipro, d'approfondir le fonçage dans la nappe pour les puits concernés.
Le Maire a été appuyé par la CRP pour le montage d'une demande de cotation permettant de recruter en urgence, un autre prestataire pour remplacer l'entreprise COMMERCAM.
De même il a été invité à procéder de la même manière pour remplacer l'entreprise HFM défaillante pour la construction de deux puits. Il est à noter que cette dernière incapable de suivre les recommandations des différentes missions de suivi contrôle, a décidé de démonter ses pompes et partir. Rappelons que L'Entreprise HFM a travaillé en marge de tout contrôle et les recommandations qui lui ont été faites pour améliorer son travail n'ont pas été suivies
Recommandations *:* Il a été vivement recommandé au Maire, de suivre son microprojet et de sévir pour amener les prestataires à livrer leurs travaux avant la fin du mois de janvier 2009, les chantiers accusant déjà plus d'un an de retard.
AC103 : Approvisionnement en eau, Minta
Etat d'avancement *:* Les travaux ont commencé avec l'entreprise "Rex International" mais les premiers forages réalisés n'ont pas été satisfaisants
Observations *:* Une mise en demeure de reprendre les forages avec un Atelier de forage capable d'exécuter correctement les travaux, a été adressée à l'entreprise, Elle a expiré et le Maire se réserve toujours de résilier le contrat malgré l'interpellation des cadres de la CRP à ce sujet.
Difficultés rencontrées *:* Recrutement d'un prestataire amateur ne disposant ni de financements nécessaires pour réaliser les travaux, ni d'expertise encore moins du matériel de travail notamment d'un Atelier de forage essentiel pour ce type de travaux.
Recommandations *:* Le Maire a été relancé par les cadres de la CRP, de procéder à la résiliation de ce contrat où de rapatrier les fonds du Programme car son hésitation sème le doute sur sa bonne fois de faire réaliser lesdits travaux dans la transparence.
AC106 : Electrification rurale, Bibey
Etat d'avancement *:* Le microprojet n'est pas fonctionnel suite à de nombreuses chutes de poteaux.
Observations *:* Il est à noter que le prestataire dont le retenue de garantie est toujours bloquée, n'à pas toujours normaliser la ligne suite aux recommandations qui lui ont été faites dans ce sens notamment, le remplacement des poteaux contractuels (36 simples et 13 jumelés de classe C), la repose du câble 4 x 25 mn suivant les règles de l'art, et le remplacement des compteurs défectueux
Difficultés rencontrées *:* Le prestataire ne bouge pas malgré de nombreuses relances de la CRP et promesses d'exécution des travaux de ce dernier.

Recommandations *:* Le Maire, las d'attendre le prestataire, a saisi la CRP qui en retour, a transmis la doléance du Maire en proposant à la CNC la résiliation de son contrat
Cependant il été rappelé au la CRP qu'on ne peut pas parler de résiliation d'un marché réceptionné et qu'il serait indiqué de parler de la saisine de la retenue de garantie.
La formulation de cette correspondance avec les termes appropriés fait problème et la CRP a sollicité la CNC pour rédiger la proposition à soumettre au Maire pour signature

AC106 : Electrification rurale, Ebebda

Etat d'avancement *:* Le prestataire a pu reprendre le travail après une longue période d'interruption de faite du refus de AES SONEL d'interrompre la fourniture d'énergie sur la ligne pour permettre au prestataire de progresser dans ses travaux. Un décompte vient de lui être payé, permettant de finaliser les travaux.
Observations *:* Il s'agit du renforcement d'une ligne existante, ce qui implique des interruptions de fourniture d'énergie sur la ligne pour permettre au prestataire d'avancer dans ses travaux.
Le Maire a finalement obtenu de AES SONEL après de longues discussions, la possibilité d'interrompre la fourniture d'énergie sur la ligne pour permettre au prestataire de continuer ses travaux.
Par ailleurs pendant cette attente, une des artères retenues dans le projet notamment celle conduisant vers la sous préfecture d'Ebebda a été construite par le BIP Le Maire a été interpellé pour que les quantités, objet des prestations pour l'artère en question soient re-orientées vers une autre direction dans le territoire de la Commune.
Recommandations *:* Il été demandé au Maire de signer un ordre de service de reprise des travaux au prestataire après cette interruption et à ce dernier, d'établir un nouveau chronogramme permettant le suivi de ce chantier.

AC106 : Electrification rurale, Mbangassina

Etat d'avancement *:* Les travaux sont terminés en attendant leurs validations par la DP MINEE et AES SONEL avant leur réception provisoire.
Observations *:* La Commune a adressé une correspondance à AES SONEL, l'invitant à une descente pour la validation des travaux. Cette correspondance attend encore une suite de la part de cet opérateur
Difficultés rencontrées *:* Vol de câbles à deux reprises sur le chantier, ce qui a retardé la finalisation des travaux du prestataire.

AC106 : Electrification rurale, Olanguena

Etat d'avancement *:* L'élaboration du microprojet communal réorienté est finalisée et le projet a été validé au dernier CPAR du mois de décembre 2008.
Observations : En effet, des financements ont été mobilisés dans le BIP 2008 pour réaliser les travaux d'électrification partielle sur le nouvel itinéraire retenu pour le microprojet communal, après le changement du premier itinéraire du fait d'un double emploi avec un projet PADC similaire. .Suite aux rencontres que le Maire a eus avec le DP MINEE et le Sous--Directeur des travaux neufs au MINEE, il a été convenu que le microprojet communal soit engagé, les études du projet MINEE seront réalisées à la suite et le marché y afférent ne sera passé qu'à la suite.

AC106 : Electrification rurale, Bondjok

Etat d'avancement *:* Les travaux sont achevés
Observations *:* La réception du lot n° 2 de l'axe "Ngate "attendue s'est finalement faite en décembre 2008 après levée définitive des réserves formulées lors de la pré réception technique
Recommandations *:* Il été recommandé aux populations de se rapprocher de l'opérateur AES SONEL pour se brancher. En outre il a été constaté des branchements sauvages .Le Maire a été interpellé pour mettre un terme à ces opérations hors normes qui, non seulement peuvent être à l'origine des accidents, et des pannes sur les lignes construites, mais participent à l'utilisation abusive de l'énergie sans facturation.

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Deuk

Etat d'avancement *:* Les travaux sont en cours malgré le retard et tirent vers la fin pour la plus part.
Observations *:* L'ingénieur du marché a évalué les travaux réalisés entre temps et a monté des décomptes qui ont été payés aux prestataires à l'effet d'une finalisation urgente des travaux **Difficultés rencontrées** *:* (i) Supercherie dans l'élaboration de certaines lettres commandes avec diminution des quantités par rapport à la convention de cofinancement et aux offres financières de certains prestataires, ce qui a causé des malentendus avec les prestataires lorsque la CRP a procédé au redressement desdites lettres commandes.
(ii) tentative inattendue d'annulation d'une partie des marchés de certaines entreprises par le maître d'ouvrage suite aux récriminations faites sur leur choix alors qu'il avait lui même accepté lors d'une réunion présidée par le Préfet de Mbam et Inoubou de les laisser finaliser leurs travaux.
Cette position de dernière heure du maître d'ouvrage qui allait encore retarder la finalisation des travaux n'a pas été acceptée par le Programme.
Recommandations *:* Les prestataires concernés ont signé des engagements de finaliser les travaux de leurs contrats initiaux avant la réception provisoire intégrale de toutes leurs prestations attendues et le Maire a été invité à les accompagner dans ce sens.

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Elig Mfomo

Etat d'avancement *:* Les travaux restent toujours en arrêt malgré qu'ils se situent au niveau de la finalisation des enduits, des VDR, des plafonds et de l'électricité entre autres.
Observations *:* l'Entreprise " Mimboe " a introduit un décompte qui lui a été renvoyé pour mise à jour des corrections proposées. Ce décompte est revenu à la CRP sans titre de paiement, ce qui ne permet encore pas le

paiement sollicité. L'entreprise a été invitée à venir compléter son dossier, mais cette dernière ne se presse pas pour venir compléter son dossier à la CRP. Quant à l'Entreprise " Nopat «, son silence inquiète le Programme.

Difficultés rencontrées *: :* L'échec de tous les conciliabules entre le Maire et les prestataires et les promesses vagues de reprise des travaux de ces derniers, sont constatés du fait de la mésentente totale entre le Maire et ces derniers.

Recommandations. Le Maire a été interpellé pour procéder à la résiliation des contrats des prestataires surtout qu'une mise en demeure leur avait déjà été administrée.

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Bafia

Etat d'avancement *:* Les trois (03) lots de construction d'un bloc de deux salles de classes équipées dans chacune des écoles publiques de Goufan I, Donnekenng I et Tsekani II sont réceptionnés. La fourniture des tables bancs correspondant aux deux lots du groupe BBTC n'est pas encore finalisée.

Observations *:* Le prestataire a sollicité le paiement d'un décompte équivalent à la fourniture de 269 tables bancs alors qu'il avait déjà reçu une avance de paiement équivalent à 493 tables bancs. Après saisine du MINEPAT par le prestataire pour le paiement de ce décompte, le Programme a sollicité l'arbitrage du Préfet du Mbam et Inoubou qui a mis en place une commission chargée de vérifier l'effectivité de la livraison des tables bancs par le Groupe BBTC dans les écoles publiques et collèges de la commune de Bafia. Cette commission a effectué son travail et a rendu son rapport. Elle a constaté qu'un total de 544 tables bancs étaient reconnues livrées par le Groupe BBTC.

La Commission a reconnu que le Groupe BBTC soit fondé de demander le paiement de 51 tables bancs supplémentaires par rapport au paiement déjà reçu. Le prestataire invité à produire un décompte équivalent pour paiement n'a pas daigné le faire jusqu'en fin d'année.

Difficultés rencontrées *:* Une coopération difficile avec le prestataire dont le seul mode de contact avec le Programme est les exploits d'huissier.

Recommandations *:* Le contrat de ce prestataire mérite d'être résilié puisque tous pourparlers visant à sortir de l'impasse sont restés vains. Le Maire a bénéficie de l'appui du programme dans ce sens.

AC113 : Aménagement piste rurale, Makak

Etat d'avancement *:* Le Maire a finalement attribué le Marché à un prestataire qui est en cours de finalisation des formalités administratives avant le démarrage des travaux.

Observations *:* Persistance de malentendus entre le Maire et le Président de la Commission de passation des marchés, ce qui a considérablement retardé le processus de recrutement d'un prestataire

Recommandations *:* Il a été demandé au Maire, d'amener le prestataire de finaliser l'enregistrement de son contrat pour commencer le travail le plus tôt possible.

AC201 : Construction marché, Mengueme

Etat d'avancement *:* Après le passage d'une Commission mise sur pied pour une évaluation globale du projet suite aux divers dérapages constatés dans sa mise en œuvre et dont ni la CRP encore moins ladite Commission ne disposent toujours pas de rapports formels de suivi des recommandations formulées à l'endroit des différentes parties prenantes au projet, le Maire a fait parvenir à la CRP, une correspondance faisant état d'une réinstallation des Ets Messe Service au chantier notamment en date du 08 novembre 2008. Ils ont lancé la fabrication des parpaings dit-il. Ainsi, 9 tonnes de ciment, des fers à béton, deux tas de gravier et 6 voyages de sable ont été déposés à Mengueme, deux camions de sable ont été versés à Mvambot, et rien n'a s été fait sur le site de Pont So'o.

Observations *:* La commission d'évaluation globale du projet commise sur le terrain avait recommandé entre autre que l'entreprise déploie trois équipes sur les trois sites.

On note des arrêts prolongés des chantiers et des reprises timides des travaux pour marquer sa présence sur le terrain quand le Maire interpelle le prestataire. Entre temps, un nouvel Ingénieur du marché notamment le Délégué Départemental des Travaux Publics du Nyong & So'o a été désigné pour suivre les chantiers de Mengueme. Cette désignation fait suite à la demande du Maître d'ouvrage formulée auprès du Délégué Régional des Travaux Publics du Centre, suite à l'affectation de l'Ingénieur du Marché.

Difficultés rencontrées *:* Tentative nourrie, mais repoussée par les cadres techniques du Programme de changer la consistance des travaux suite à la demande de changement du site de construction du Marché de Mengueme par le Maire.

Recommandations *:* Il serait nécessaire pour sauver le projet que le Maire résilie ce contrat, ce d'autant plus que d'une part, les recommandations de la Commission mise sur pied ne sont pas suivies et que d'autre part justement, le vrai problème est que le prestataire ne dispose pas d'une capacité financière lui permettant d'exécuter lesdits travaux après avoir distrait l'avance de démarrage à lui accordée, laquelle l'a été avec des cautions bancaires dont l'authenticité effective demeure sujet à caution .

AC201 : Construction marché, Ngoumou

Etat d'avancement *:* Les travaux ont repris après résiliation du contrat de l'entreprise "Inagel " et attribution du Marché à un autre prestataire notamment "Thom's Cameroun" pour le reliquat des travaux à hauteur de 24 238 657 F CFA qui a déjà reçu un décompte, lui permettant de livrer son marché dans le délai d'un mois contractuel convenu.

Observations *:* Les travaux n'ont pas pu être livrés au mois de décembre 2008 comme prévu. Ils ont même connu un arrêt momentané à cause de l'utilisation du site pour accueillir le Comice Agropastoral de la Région du

Centre du 10 au 12 décembre 2008. Ils ont repris aussitôt et devraient être livrés au cours du mois de janvier 2009.

Difficultés rencontrées: Résiliation du contrat de l'entreprise « Inagel » suite à son incapacité constaté

Recommandations *:* Le Maire a été interpellé de tout faire pour suivre l'entreprise et livrer les travaux au cours du mois de janvier 2009, étant entendu que la réception du projet prévue avant le Comice agro pastoral de décembre 2008 n'a pas été respectée.

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Nkom-Ekouda/Monatélé

Etat d'avancement *:* Le microprojet a été réceptionné à titre provisoire

Observations *:* Des réserves techniques ont été émises sur les risques de tarissement du puits en saison sèche du fait d'une formation rocheuse rencontrée au fond du puits, le fonçage en terrain sec et dans la nappe n'ayant pas dépassé les dix mètres La commission de réception a décidé de payer le prestataire pour le fonçage effectivement réalisé en terrain sec et dans la nappe, en plus il a été décidé de lui payer rien que son net à percevoir auquel il devra être soustrait la retenue de garantie et la caution de bonne fin en attendant que la saison sèche s'achève pour voir si le puits ne tarit pas du faite de sa profondeur récusée par les bénéficiaires.

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Château bloc 2; 3 & 5/Mfou

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Ndong Nkongoa/Mfou

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Awae II & III Ndagueng I/Mfou

AL103 : Approvisionnement en eau potable,Nkolmefou I Ekok I & II/Mfou

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Koudou Mindzomo château/Mfou

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Zalom Ngoun Mendong/Mfou

AL103 : Approvisionnement en eau potable,Ekodo I & II/Mfou

AL106 : Electrification rurale, Ekid Mekoe/Mfou

AL106 : Electrification rurale,Mfou village/Mfou

Etat d'avancement *:* Les virements des quotes parts des bénéficiaires et du Programme ont été effectués dans les comptes conjoints ouverts à cet effet. Les DAO ont été élaborés et l'appel d'offres lancé pour le recrutement des prestataires

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Sep II/Akoeman

Etat d'avancement *:* Le prestataire a commencé le fonçage sur un site et a rencontré une formation rocheuse difficile à traverser par les outils ordinaire. Le deuxième site connaît encore des disputes entre les membres de la communauté et le consensus ne s'est pas encore dégagé

Recommandations *:* Le Maire a été interpellé pour appuyer la communauté à résoudre ces problèmes en leur rappelant que seule les études géophysiques déterminent en définitive l'emplacement des puits à construire dans les communauté et ceci indépendamment des sites convenues dans les requêtes de financement.

AL103 : Approvisionnement en eau potable, Sep I/Akoeman

Etat d'avancement *:* Le prestataire a commencé les fonçages et la fabrication des buses sans se référer à l'Ingénieur du Marché. Après arrêt des travaux sur la demande d'une mission de suivi contrôle, l'Ingénieur du marché a finalement été saisi pour suivre le chantier et les travaux ont repris. Cependant, la rencontre d'une formation rocheuse et les exigences des populations font qu'ils avancent à pas de tortue.

Recommandations *:* Il a été recommandé au prestataire, de concilier les exigences de l'Ingénieur et des bénéficiaires mais que les études de prospection de l'existence d'une nappe d'eau soient la seule condition qui détermine finalement le lieu d'implantation du puits querellé.

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Nkolakoa/Akoeman

Etat d'avancement *:* Le Microprojet a été réceptionné à titre provisoire.

Recommandations *:* La Communauté a été invitée à rendre opérationnel, un comité d'entretien par site des ouvrages construits et de mobiliser une épargne pour pallier aux éventuels dysfonctionnement de leurs ouvrages.

AL106 : Electrification rurale, Ntouessong VIII & IX/Soa

AL113 : Aménagement des pistes rurales, Ntoutmevom, Soa administratif/Soa

AL202 : Construction magasin de stockage, Nkometout 1/Soa

Etat d'avancement *:* Les virements ont été effectués dans les comptes conjoints

Observations *:* Le Maire a finalement achevé le montage des DAO et ces derniers ont été examinés et adoptés par la Commission de passation des Marchés .ils seront déposés à l'ARMP pour validation en début janvier 2009 pour le lancement de l'appel d'offre après accord de cet organisme

AL106 : Electrification rurale, Emana Ezezang Ngomo Triengo/Monatélé

Etat d'avancement *:* Le tronçon du projet situé à Emana a connu un problème de connexion à une source à cause du refus d'un privé de laisser le raccordement s'opérer à la fin de son réseau.

Observation*s :* L'échec des négociations a amené le Maire à proposer la même extension dans un autre tronçon dans la même Communauté. Un calage des quantités a été fait dans ce sens.

Recommandations *:* La CRP a informé le Maire qu'il s'agit là, d'un cas de changement de la consistance des travaux et que dans les procédures des marchés publics, cela n'est pas possible. Il devra donc monter une nouvelle requête qui tienne compte de cette réorientation après avoir rapatrier les fonds du Programme qui lui seront rétrocédés après approbation de la nouvelle requête au COMES

AL106 : Electrification rurale, Awae Fala/Akoeman

AL106 : Electrification rurale, Melen/Akoeman

AL106 : Electrification rurale Bifindi/Akoeman
AL106 : Electrification rurale, Akoeman-Ndonko
Etat d'avancement *:* Les travaux n'ont pas encore démarré du fait qu'il s'agit des lignes de BT qui doivent prendre leur source sur la MT construite dans le cadre du microprojet communal mais non fonctionnel à ce jour
Observations *:* Des contacts sont en cours entre la DR MINEE, et AES SONNEL pour qu'une solution soit trouvée pour la réhabilitation de la ligne MT construite, ce d'autant plus que les travaux avaient régulièrement été suivis et réceptionnés par la DR MINEE et AES SONEL, ce dernière ayant la charge de l'entretien des lignes reversées dans leur patrimoine après réception et mise en service
AL106 : Electrification rurale, Song Nlend Peslipan/Dibang
Etat d'avancement *:* Les travaux n'ont pas entièrement été réalisés conformément aux prescriptions du Marché. Le prestataire " Bisso Graphics " n'a pas encore remédié aux réserves de la mission de suivi technique du 06 juillet 2007 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en date du 07 février 2008.
Observations *:* Le prestataire déclare avoir réalisé entre temps, quelques travaux sur le terrain et sollicite un décompte.
Recommandations *:* La CRP et l'Ingénieur du marché descendront dans les tous prochains jours pour valider les travaux exécutés. En cas d'insuccès, il sera tout simplement conseillé au Maire de résilier ce contrat pour incapacité notoire de l'entreprise.
AL106 : Electrification rurale, Dibang Mapubi Dibang/Dibang
Etat d'avancement *:* Le microprojet a été réceptionné provisoirement en l'absence du prestataire ce dernier ayant disparu après son dernier paiement et la ligne construite est déjà exploitée par AES SONEL qui a effectué les branchements réguliers des ménages
Recommandations *:* Il a été recommandé aux populations de mettre en place un comité de vigilance pour protéger la ligne contre le vandalisme.
AL106 : Electrification rurale, Mom Dibang Lissegue Makek Mandjap/Dibang
Etat d'avancement *:* Microprojet partiellement fonctionnel à cause d'une panne récurrente du transformateur posé au lieu dit Makek
Recommandations *:* Il a été recommandé au prestataire, d'acquérir un transformateur neuf, l'amener au site avant de descendre celui en panne.
AL106 : Electrification rurale, Monabo/Monatélé
Etat d'avancement *:* :La source de connexion de la ligne à construire n'est pas encore identifiée du fait que celle principale d'où la connexion doit être opérée a été vandalisée.
Observations *:* Le Maire est en pourparler avec AES SONEL pour le rétablissement de la ligne avant que le prestataire ne commence son travail.
Recommandations *:* Il a été recommandé au prestataire de ne pas commencer les travaux avant les assurances de connexion de la ligne au réseau AES SONEL.
AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires, Ekonong/Akoeman
AL107 : Constructions/équipement/infrastructures scolaires, Ngon/Akoeman
Etat d'avancement *:* Les travaux sont en cours mais avance timidement
Recommandations *:* Il a été recommandé au Maire de mettre ces prestataires en demeure conformément à la procédure du fait du retard qu'ils accusent.
AL201 : Construction marchés, Communauté de Fegmimbang I/Akono
Etat d'avancement *:* Microprojet réceptionné à titre provisoire
AL301 : Aménagement bas fonds, Otibili Nachtigal/Batchenga
Etat d'avancement : Il s'agit du microprojet *d'*Aménagement d'un espace Agro Sylvo pastoral : volet amélioration de la fertilité des sols dans la communauté de Otibili Natchigal
AL301 : Aménagement bas fonds, Ebangminala
Etat d'avancement *:* Il s'agit du microprojet d'Aménagement d'un espace Agro Sylvo pastoral : volet production fourragère et mise en défens des parcours et compensation en fumier animale dans la communauté de Ebang Minala
AL301 : Aménagement bas fonds, Ndji
Etat d'avancement *:* Il s'agit d'un microprojet d'Aménagement d'un espace Agro Sylvo pastoral : volet ouverture d'un couloir de passage de bétail et mise en défens d'un parcours naturel dans la communauté de Ndjii
Observations *:* Les comptes conjoints des communautés bénéficiaires ont été ouverts, les Conventions de cofinancement signées et le complément des contributions des communautés attendu de la Commune a été viré dans les comptes conjoints, le Programme a aussi viré sa quote part. La sélection des consultants pour la mise en ouvre de ces projets a débuté et les prestataires pressentis identifiés.
Recommandations *:* Finaliser la contractualisation dans les meilleurs délais
B2101 : Equipements des communes en matériels informatiques et outils de gestion
Etat d'avancement *:* Le matériel informatique a été distribué à toutes les communes concernées en décembre 2007. Seule la commune de Yaoundé II n'est pas rentrée en possession dudit matériel.
Observations *:* Le Maire de Yaoundé II a été invité à se rapprocher de la CPP afin de retirer son outil informatique, ce qui n'as pas toujours fait.

Recommandations *:* La CRP suggère que la CNC donne une non objection pour que ce matériel soit remis à une autre commune.

B2102 : Prise en charge des A gents communaux

Etat d'avancement *:* Dix (10) Agents communaux ont été recruté cette année et leur prise en charge est effective dans les communes de Monatélé, Elig-Mfomo, Batschenga, Akoeman, Deuk; Mfou, Mengang, Bondjock, Endom, et Ngoumou.

Observations *:* Les dossiers des autres Agents communaux suivent leur cours dans les communes

Difficultés rencontrées *:* Difficultés de faire siéger les Commissions communales de passation des marchés par les Maires, réticence de quelques Préfets à viser les contrats déjà élaborés, et enfin dilatoire entretenu par certains Maires pour poursuivre la procédure telle que laissée par leurs prédécesseurs

Recommandations *:* Les uns et les autres ont été sensibilisés sur le bien fondé de ce recrutement qui vise entre autre l'amélioration de l'assiette fiscale des communes pour un meilleur encadrement des populations

B2202 : Renforcement des capacités des personnels des Commissions Communales de Passation des Marchés

Etat d'avancement *:* Les Commissions Communales de passation des Marchés des 16 communes de 2007 ont été formées du 29 septembre au 03 octobre 2008 à Mbalmayo.

Observations *:* Etaient invités en outre, les Maires des communes concernées

B2203 : Coaching des communes

Etat d'avancement *:* Quatre coachs ont été recrutés et mis à la disposition de sept(07) communes. Il s'agit respectivement du coach « Agir » dans les communes de Batchenga, Mengang et Ombessa, du coach 'CPDD » dans les communes de Dibang et Bibey, du coach « VIPOD » dans la commune de Ngambe-ikar et du coach ASAFRO dans la Commune de Monatélé. Une réunion de prise de contact et de lancement des activités desdits coachs a eu lieu à la CRP. Elle regroupait les Maires des sept communes, les Secrétaires Généraux, les Receveurs Municipaux et les coachs. Leur mandat a été clarifié.

Observations *:* Des missions de suivi de leurs prestations ont eu lieu dans les Communes de Dibang, et de Batchenga. Cette activité est bien accueillie par les communes.

Recommandations : Il est important que cette activité soit répandue dans les autres communes. Rappelons d'ailleurs que trois dossiers de recrutement des coachs avaient été déclarés infructueux et la relance de la procédure tarde au niveau de la CNC. La CRP suggère que cette sélection soit transférée aux CCPM.

En outre, le vendredi 11juin 2008 à l'hôtel AZUR, la CRP a organisé conjointement avec la CNC, un Atelier de formation des Maires de la Région du Centre sur le thème « Vision et leadership ». Les principaux objectifs étaient de les sensibiliser sur :

- Les connaissances, les aptitudes et les attitudes d'un Maire, leader du développement;
- La nécessité d'avoir une vision de développement en début de mandat ;
- La bonne gestion financière et la bonne gouvernance

A la fin de la formation, un document de référence donnant les détails sur les questions de leadership, de vision et de gouvernance, a été remis à tous les Maires de la Province.

Dans la synthèse de l'évaluation de ladite formation, la Maires relèvent que Ces ateliers méritent d'être multipliés. Mais, il aurait été judicieux d'augmenter le nombre de jours et d'élargir la participation au receveurs municipaux et secrétaires généraux de mairie

Le vendredi 11juin 2008 à l'hôtel AZUR, la CRP a organisé conjointement avec la CNC, un atelier de formation des Maires de la Province du Centre sur le thème « Vision et leadership ». Les principaux objectifs étaient de les sensibiliser sur :

- Les connaissances, les aptitudes et les attitudes d'un Maire, leader du développement;
- La nécessité d'avoir une vision de développement en début de mandat ;
- La bonne gestion financière et la bonne gouvernance

A la fin de la formation, un document de référence donnant les détails sur les questions de leadership, de vision et de gouvernance, a été remis à tous les Maires de la Province.

Dans la synthèse de l'évaluation de ladite formation, la Maires relèvent que Ces ateliers méritent d'être multipliés. Mais, il aurait été judicieux d'augmenter le nombre de jours et d'élargir la participation au receveurs municipaux et secrétaires généraux de mairie

De plus, une réunion de sensibilisation a eu lieu à l'hôtel de ville de yaoundé. Elle regroupait les Députés, les Maires le personnel communal (SG et RM). L'objectif de cette réunion était de les informer et de les sensibiliser sur le mise en œuvre et les résultats du Programme dans la Région.

C1101 : Formation des OALs

Etat d'avancement *:* Elle a eu lieu à Mbandjock du 20 au 30 juillet 2008 et a connu la participation de 18 OALs dont deux représentants par OAL, six (06) Maires ou leurs représentants et six (06) agents communaux

Observations *:* Les recommandations de cet Atelier notamment les diverses innovations apportées dans la démarche de planification sont suivies rigoureusement par les cadres de la CRP.

Recommandations. Il est important qu'un accent soit mis dans le suivi accompagnement des communautés

C1201 : Définition des Unités de planification

Etat d'avancement *:* Les Ateliers de découpage techniques des communes en communautés ont eu lieu dans le reste des communes éligibles aux activités du Programme en 2008.

Observations : Le découpage effectué dans ces communes éligibles en 2008 a donné un total de UPP Toutes les communes de la Région du Centre sont desormais découpées en UPP donnant un total de 1109 UPP, conformément au plan de couverture approuvé par le CNOP

C1202 : Sélection des OALs

Etat d'avancement : Les CCPM placées auprès des communes éligibles en 2007 ont sélectionné les OALs après constitution de la shut list au niveau de la CRP. La CRP attend le déclenchement par la CNC, du processus de recrutement des OALS pour les communes de 2008

Observations : Lenteur dans le processus de sélection par les CCPM au niveau de certaines communes.

Recommandations : La CRP devra améliorer sa stratégie d'accompagnement des communes à la sélection des OLAs afin de diligenter cette activité. il serait souhaitable qu'au préalable, la CNC déclenche le processus à temps afin d'éviter de continuer le retard accusé

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes

Etat d'avancement *:* Les seize (16) OAL qui accompagnaient les dix-huit (18) communes bénéficiaires du PNDP dès 2006 ont terminés leurs activités sur le terrain. Des missions d'évaluation de leurs prestations ont eu lieu lesquelles, ont validé avec les Maires concernés, la fin de leurs contrats. Le payement du reste de leur 10% et en cours à la CRP.

La formation des COMES a eu lieu et les sessions en vu de l'approbation des PDL et des requêtes de financement des microprojets élaborés ont été tenus dans toutes les Communes éligibles aux activités du Programme dès 2006.

Les OALS des communes de 2007, ont pour la plus part achevé la planification locale et le rédaction des premières moutures des PDL. Ces PDL ont été lus en Atelier et les observations ont été faites pour leur mise à jour. Il manque pour compléter ce tableau, les moutures des PDL des Communes de Ngomedzap, Mbandjock, Dzeng, et Obala dont le recrutement des OALs ne s'est fait qu'en décembre 2008. Des moutures des PDL de deux autres PDL en retard dans leur calendrier sont attendu. Il s'agit de ASAFRO dans la commune de Ngog-Mapubi et PRODEPAD dans la Commune d'Akonolinga .Des missions de la CRP suivent régulièrement les travaux des OALs sur le terrain.

C20202 : Stage/ voyage d'études

Etat d'Avancement : La RRFC a participé au séminaire sur l'intégration du genre dans les organismes de développement au Ghana. En outre la CRP a reçu au cours de l'année qui s'achève six (06) stagiaires sur les sujets suivants: montage et suivi des projets, suivi évaluation des projets, planification, comptabilité et secréterait.

D1103 : Fonctionnement CPAR

Etat d'avancement *:* Le CPAR en vue de l'approbation des microprojets de deuxième génération des communes de 2004, 2005 et 2006 a eu lieu en deux sessions en décembre 2008. Il y a eu approbation de vingt (20) microprojets et de dix sept (17) PDC à l'exception de celui de la Commune de Elig-Mfomo

Observations *:* Le PDC présenté par le Maire a été validé par le Conseil municipal d'Elig-Mfomo lors de la session du COMES d'approbation des requêtes communautaires et des PDL. Il est attendu que le Maire soumette ce PDC au secrétariat du CPAR pour approbation lors de sa prochaine session.

D1104 : Fonctionnement CPAC/COMES

Etat d'avancement *:* Les Ateliers de formation des COMES suivies de sessions d'approbation des PDL et des requêtes communautaires se sont tenues dans toutes les communes de 2007. Tous les PDL et requêtes présentées ont été approuvés et corrigées par les OALs.

D1202 : Fonctionnement des Groupes Thématiques

Etat d'Avancement : Une plate forme régionale d'échange d'expérience a été créée par la DR MINEPAT. La CRP Centre prend régulièrement par aux réunions.

Observations : Des groupes thématiques de réflexion ont été mis en place. La CRP et le PADDL Centre animent le groupe thématique intitulé « développement communal ». Une première réflexion sur ce thème a eu lieu au PADDL sur la collaboration avec les prestataires de service. Il est prévu que la CRP reçoivent en janvier 2009, la réunion du groupe thématique. Le sujet portera sur le diagnostic institutionnel communal et le coaching des communes. Ce même mois, la CRP organisera la réunion de la plate forme.

Outre cette collaboration avec les partenaires au développement au niveau de la plate forme régionale, la CRP a pris part au Comité de Coordination et d'orientation (CCO) de la région du Centre à Mbalmayo présidé par le Gouverneur de la Région. Les Préfets et les délégués régionaux ont été informés de la mise en œuvre et des résultats du programme avec mise en évidence des microprojets à problèmes afin de susciter leurs éventuelles interventions pour le déblocage des difficultés

D3201 : Missions suivi et supervision

Etat d'avancement *:* Au cours de l'année qui s'achève, des missions de supervision de la CRP ont porté sur le suivi et la réception des microprojets sur le terrain, le lancement et le suivi des interventions des OALS de 2006 et 2007 sur le terrain, le suivi des microprojets à problème ainsi que la formation des Conseils Municipaux Elargis aux Sectoriels.

Recommandations : La CRP intensifiera ces missions au cours de l'année 2009 pour améliorer davantage ses prestations sur le terrain.

Site 05 : Cellule Provinciale e l'Extrême-Nord

Site : 05 - Extrême-Nord

AC000 : Appui financier aux communes

Etat d'avancement : Dans cette activité il est question de présenter les préalables au financement des microprojets communaux. Ceux-ci portent sur l'élaboration des référentiels de MP et l'identification des sectoriels pour le montage des MP des conseils municipaux.

Au cours de l'année 2008, les référentiels de construction de salle de classe et des équipements scolaires ont été élaborés et validés par les délégués régionaux concernés.

Les référentiels de construction de centre de santé sont entrain d'être finalisés.

Les signatures des contrats programmes avec certaines délégations régionales de ministères ont permis d'utiliser les sectoriels pour le montage des requêtes.

Globalement, au cours de cette année 2008, 03 MP communaux sont en cours (Yagoua, Moutourwa, Gobo), la passation de marché est en cours dans une commune (Kousséri), 02 requêtes approuvées sont en attente de financement,

05 requêtes sont en cours de finalisation et en attente d'approbation par le CPAP (Kar hay,Tokombéré, Kaélé, Mora, Logone birni).

Observation : A la fin de cette année 2008, 11 communes sur les 12 dont les PDC ont été capitalisés ont engagé véritablement le processus de financement d'un MP.

Le détail de ces microprojets est présenté ci après :

AL000 : Appui financier aux communautés

Etat d'avancement : Globalement, au cours de cette année 2008, 01 convention a été signée (Diguidim Tchoffi), 05 conventions en cours de signature, 11 requêtes approuvées mais contribution partiellement mobilisées, 02 requêtes en cours d'élaboration (Gazayaka, Blabine hourgo).

Observation : Les coûts des requêtes validées ont été revus à la baisse, il a notamment été retiré les frais de Contrôle et de Montage de la requête qui seront supportés par la ligne prévue à cet effet. Pour les salles de classe, le coût de latrines a été revu à la baisse.

Intitulé microprojet	Etat d'avancement	Observations	Difficultés	Recommandations
Communes				
Approvisionnement en eau potable Logone Birni	Le contrat programme pour l'étude de ce microprojet d'hydraulique a été signé en décembre entre le PNDP EN et le Délégué départemental de l'Energie et de l'Eau du Logone et chari. Le montage de la requête est prévue s'achevée le 05 janvier 2009.	Le démarrage de cette étude a retardé du fait qu'au départ, le maire souhaitait réhabiliter le réseau d'eau potable de la ville de Logone birni appartenant à la CAMWATER. Après plusieurs mois, celle ci s'est prononcée défavorablement à cette action.		
Approvisionnement en eau potable Makary	La requête de financement pour la réalisation de puits et de forages dans certains villages de la commune de Makary a été approuvée à la 3e session du CPAR du 19 novembre 2008. La convention de cofinancement entre le PNDP et la commune est en cours de préparation.	Il y a une lenteur de la commune pour l'ouverture du compte joint puis le transfert des fonds réservés au MP dans ce compte.	- Indisponibilité des fonds du PNDP EN	Approvisionnement des comptes MP du PNDP EN par la CNC (fonds C2D) et la KFW.
AC103 : Approvisionnement en eau potable Kaélé	Les observations sur la première mouture de la requête d'extension du réseau d'adduction d'eau potable de la ville de Kaélé déposées au niveau de la CRPEN en fin décembre 2008 sont en cours.	Au vu des difficultés qu'éprouvait la commune à financer cette étude, le PNDP EN a fait un avenant au contrat en vue de prendre en charge entièrement le financement de cette étude.	Lenteur du montage de cette requête liée en partie à l'indisponibilité des résultats des études antérieures sur le réseau à étendre	Un cadre de concertation entre le PNDPEN et la CAMWATER régional doit être mis en place.

Intitulé microprojet	Etat d'avancement	Observations	Difficultés	Recommandations
AC103 : Approvisionnement en eau potable kousséri	La convention de cofinancement d'un montant de 81 113 850 F CFA entre le PNDP et cette commune a été signé le 08 octobre 2008 en vue de la réalisation de 8 points d'eau. L'avis d'appel d'offres lancé le 18 novembre 2009 cours jusqu'au 19 janvier 2009 date du dépouillement des offres.	La part de contribution du PNPD pour cette convention est supportée par les fonds C2D.	Calage de la fin processus de passation de marchés avec la période indiquée pour la réalisation des forages et des puits qui se situe autour des mois d'avril et mai dans cette région du pays.	Il a été recommandé au maire d'étaler l'avis d'appel d'offres sur le délai maximum de 60 jours. Ce qui permettra de faire coïncider le démarrage des travaux approximativement avec cette période.
Constr/réhabilit/equipement CSI Tokombéré	Le montage de la requête de financement pour la construction d'un centre de santé dans la commune de Tokombéré est en cours de finalisation par le sectoriel commis par cette étude. Cette requête sera soumise à la validation du CPAR lors de la prochaine session en janvier 2009.	Le montage de cette requête accuse un grand retard. Cette requête fait partie des 3 requêtes pilotes dont 2 ont déjà été approuvées par le CPAP. Le maire a pris beaucoup de temps pour accepter préfinancer cette étude.	- Déblocage tardif de l'avance de démarrage au sectoriel - Indisponibilité du sectoriel qui est délégué départemental des travaux publics	- Financement du montage des requêtes par le PNDP; - Confier le montage des requêtes aux consultants individuels
AC106 : Electrification rurale Moutourwa	Le processus de passation du marché d'extension de l'électricité dans la ville de Moutourwa a aboutit en décembre avec la sélection de l'entreprise CATELI agréée par AES SONEL. Parallèlement, le contrôleur des travaux a été sélectionné. Les travaux qui vont porter sur la mise en place de 1,247 km de Moyen Tension et de 5,633 km de Basse Tension ont effectivement démarré sur le terrain le 23 décembre 2008 par le piquetage et le calage des quantités.			

Intitulé microprojet	Etat d'avancement	Observations	Difficultés	Recommandations
AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire Kar-Hay	L'étude pour la construction de salles de classe dans certains villages de la commune de Mouvouldaye est en cours de finalisation en cette fin d'année 2008.	Le montage de cette requête est lent. Au vu des difficultés qu'éprouvait la commune à financer cette étude, le PNDP EN a fait un avenant au contrat en vue de prendre en charge entièrement le financement de cette étude.	Difficultés de la commune à préfinancer l'étude	
AC107 : Construct°/équipment infrastr scolaire Moulvoudaye	La requête de financement pour la construction des salles de classe dans la commune de Mouvouldaye a été approuvée à la 3e session du CPAR du 19 novembre 2008. La convention de cofinancement entre le PNDP et la commune est en cours de préparation.	Il y a une lenteur de la commune pour l'ouverture du compte joint puis le transfert des fonds reservés au MP dans ce compte.	- Indisponibilité des fonds du PNDP EN	Approvisionnement des comptes MP du PNDP EN par la CNC (fonds C2D) et la KFW.
Construct°/équipment infrastr scolaire Yagoua	Le processus de passation du marché de construction et équipement de 09 salles de classe dans la commune de Yagoua a aboutit en décembre avec la sélection de 03 entreprises. Parallèlement, le contrôleur des travaux a été sélectionné. Le contrat du marché a été signé le 30 décembre 2008.			

Intitulé microprojet	Etat d'avancement	Observations	Difficultés	Recommandations
Aménagement des pistes rurales Mora	Le contrat programme pour l'étude de ce microprojet d'aménagement d'une partie de la voierie de Mora a été signé en novembre entre la commune et le Délégué départemental de l'Urbanisme et Habitat du Mayo Sava. La requête qui est en cours de finalisation sera prête pour la prochaine session CPAR de janvier 2009.	Le démarrage de cette étude a été retardé du fait de la production tardive de la délibération du conseil municipal soumettant ce MP au financement PNDP.		
Construction de marchés Gobo	Le processus de passation du marché de construction de 08 boutiques et autres aménagements dans le marché de Gobo a aboutit en décembre avec la sélection de 03 entreprises. Parallèlement, le contrôleur des travaux a été sélectionné. Le contrat du marché a été signé le 30 décembre 2008.			
Communautés				
Approvisionnement en eau potable Djiguidim_Tchoffi	La requête de financement de cette communauté de la commune de Ndoukoula porte sur la construction de 4 puits. La communauté a financé le contrat établi avec le chef de service provincial de l'Hydraulique et de l'assainissement le 18 juin 2008. Le 27 août 2008, la requête a été approuvée par le CPAC de Ndoukoula. La convention de cofinancement a été signée entre le PNDP, la commune et la communauté le 08 octobre 2008 et la contrepartie de la communauté mobilisée et versée dans le compte conjoint.		- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP	
Approvisionnement en eau potable Amchoulga	C'est en fin d'année 2008 que cette communauté de la commune de Makary a entièrement mobilisé sa contrepartie pour la construction de 3 puits et l'a versée dans le compte conjoint ouvert à cet effet. En rappel, la validation de la requête a eu lieu le 27 août 2008.		- Lenteur de la mobilisation de la contrepartie de la communauté - Indisponibilité de la contrepartie du PNDP	

Intitulé microprojet	Etat d'avancement	Observations	Difficultés	Recommandations
Approvisionnement en eau potable Mogom	Après la validation le 27 août 2008 de la requête de financement de 04 puits équipés de pompes à motricité humaine dans cette communauté de la commune de Kar hay, seule la moitié de la contrepartie est disponible en cette fin d'année 2008.		- Incapacité de la communauté à mobiliser sa contrepatie	
AL103 : Approvisionnement en eau potable Gazayaka	La requête de financement pour la construction d'un forage et la réhabilitation d'un autre dans cette communauté de la commune de Tokombéré est en cours de montage.	Le niveau d'avancement du montage de la requête permet d'organiser une session CPAC d'approbation en mi janvier 2009.		
Approvisionnement en eau potable Blangouaré	La requête de financement pour la construction de 02 puits dans cette communauté de la commune de Mora a été approuvée le 20 novembre 2008. La contrepartie de la communauté n'est pas encore disponible.		- Lenteur dans la mobilisation de la contrepartie de la communauté.	
Constr/équipement infrastructure scolaires Titing	Le MP de cette communauté de la commune de Moutourwa qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée le 11 novembre 2008. La contrepartie de la communauté étant mobilisée, la convention de cofinancement est en cours de préparation.		- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP.	
Constr/équipement infrastructure scolaires Moudawa	Le MP de cette communauté de la commune de Moutourwa qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le 27 août 2008. Mais jusqu'à présent la communauté n'a pas entièrement mobilisé sa contrepartie.		- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP et la communauté.	

Intitulé microprojet	Etat d'avancement	Observations	Difficultés	Recommandations
Constr/équipement infrastructure scolaires Sir	Le MP de cette communauté de la commune de Mogodé qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le 27 août 2008. Mais jusqu'à présent la communauté n'a pas entièrement mobilisé sa contrepartie.	Le changement de maire de la commune suite à la reprise des élections en octobre 2008 a pertubé l'élan de mobilisation engagé avec l'ancien exécutif municipal.	- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP et la communauté.	La commune doit apporter un soutien à la communauté pour la mobilisation de sa contrepartie
Constr/équipement infrastructures scolaires Kila	Le MP de cette communauté de la commune de Mogodé qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le 27 août 2008. Mais jusqu'à présent la communauté n'a pas entièrement mobilisé sa contrepartie.	Le changement de maire de la commune suite à la reprise des élections en octobre 2008 a pertubé l'élan de mobilisation engagé avec l'ancien exécutif municipal.	- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP et la communauté.	La commune doit apporter un soutien à la communauté pour la mobilisation de sa contrepartie
Constr/équipement infrastructures scolaires Dompya	Le MP de cette communauté de la commune de Gobo qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le 27 août 2008. Mais jusqu'à présent aucune contrepartie de la communauté n'est mobilisée.	La construction des latrines est prévue en régie par les communautés.	- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP et la communauté.	
Constr/équipement infrastructures scolaires Nouldaïna	Le MP de cette communauté de la commune de Gobo qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le 27 août 2008. Mais jusqu'à présent la communauté n'a pas entièrement mobilisé sa contrepartie.	La contrepartie en espèces disponible se trouve dans un compte d'épargne. La construction des latrines est prévue en régie par les communautés.	- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP et la communauté.	

Intitulé microprojet	Etat d'avancement	Observations	Difficultés	Recommandations
Constr/équipement infrastructures scolaires Poukébi_Goudjoing	Le MP de cette communauté de la commune de Kaélé qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le 27 août 2008. La contrepartie de la communauté a entièrement été mobilisée en décembre 2008. La convention de financement est cours de préparation.	La construction des latrines est prévue en régie par les communautés.	Indisponibilité de la contribution du PNDP.	
Constr/équipement infrastructures scolaires Dabou_Ourlago	Le MP de cette communauté de la commune de Kar hay qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le 11 novembre 2008. Mais jusqu'à présent la communauté n'a pas entièrement mobilisé sa contrepartie.	La contrepartie en espèces disponible se trouve dans un compte d'épargne. La construction des latrines est prévue en régie par les communautés.	- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP et la communauté.	
Constr/équipement infrastructures scolaires Guissia	Le MP de cette communauté de la commune de Kar hay qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le11 novembre 2008. Mais jusqu'à présent aucune contrepartie de la communauté n'est mobilisée.	La construction des latrines est prévue en régie par les communautés.	- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP et la communauté.	
Constr/équipement infrastructures scolaires Bodo	Le MP de cette communauté de la commune de Makary qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée depuis le 27 août 2008. La contrepartie de la communauté a entièrement été mobilisée en décembre 2008. La convention de financement est cours de		Indisponibilité de la contribution du PNDP.	

Intitulé microprojet	Etat d'avancement	Observations	Difficultés	Recommandations
	préparation.			
Constr/équipement infrastructure scolaires Kassa wara	Le MP de cette communauté de la commune de Mora porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines, il a été approuvé le 20 novembre 2008. Mais jusqu'à présent la communauté n'a pas entièrement mobilisé sa contrepartie.	La contrepartie disponible est en nature et se trouve sur le site.	Lenteur dans la mobilisation de la contrepartie de la communauté.	
Constr/équipement infrastructures scolaires Zamala_Badam	Le MP de cette communauté de la commune de Ndoukoula qui porte sur la construction et équipement de 02 salles de classe avec latrines a été approuvée le 10 novembre 2008. La contrepartie de la communauté étant mobilisée, la convention de cofinancement est en cours de préparation.		- Indisponibilité de la contrepartie du PNDP.	
Foyers Communautaires Boboyo	Le microprojet qui sera réalisé dans cette communauté de la commune de Kaélé concerne la construction d'un centre d'alphabétisation. Le 10 novembre 2008, la requête a été approuvée. Mais la contrepartie attendue de la communauté n'est pas encore mobilisée.		- Mobilisation timide de la contrepartie de la communauté.	

Intitulé microprojet	Etat d'avancement	Observations	Difficultés	Recommandations
Construction magasin stockage Blabine_Hourgo	Il s'agit d'une demande de financement de la construction d'un magasin de stockage dans la communauté Blabine de la commune de Mora. Le draft de la requête est en lecture à la CRP EN et sera soumise à la session CPAC de janvier 2009.			

B2201 : Renforcement capacité élus locaux (CEFAM et Autre) CPP Extrême Nord

Etat d'avancement :

Sensibilisation et information et signatures des protocoles d'accord avec les communes 2008

Au cours de l'année 2008, la CPPEN a effectué les missions de prise de contact et d'information avec les autorités de 12 nouvelles communes : Koza, Bourha, Mindif, Djiguilao, Kolofata, Goulfé, Datchéka, Kalfou, Maga, Wina, Darak et Gazawa. Au cours de ces prises de contact, des informations sur la situation actuelle des communes ont été recueillies et les protocoles d'accord ont été présentés aux maires. A la fin de l'année, tous les 12 maires ont pu signer les protocoles d'accord avec le PNDP.

Atelier d'imprégnation des maires et des parlementaires de la région de l'Extrême Nord

Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation, la CRP Extrême Nord a organisé un atelier à l'attention des maires et des autorités administratives. Au cours de cet atelier de deux jours (10 et 11 Avril 2008), 05 préfets (sur les 06 invités) et 44 maires (sur les 48 invités) ont été informés et imprégnés des procédures et mécanismes en vigueur au PNDP. Les travaux dudit atelier qui étaient animés par les cadres de la CPP et le chef de service provincial des communes et modérés par un consultant recruté pour la circonstance étaient placés sous la supervision générale du Gouverneur de la région de l'Extrême Nord et sous la coordination du Coordonnateur de la CPP Extrême Nord. C'est au cours de cet atelier que les maires ont élus leurs 10 représentants du CPAP.

Les parlementaires étant indisponibles en avril, ce n'est que le 3 juin 2008 qu'un atelier a pu être organisé à leur intention. Mais vu la convocation de la session parlementaire de juin, il n ' y a que 05 parlementaires qui ont pu être informés et imprégnés des mécanismes et procédures du PNDP.

B2202 : Renforcement capacité personnel/commiss° communal CPP Extrême Nord

Etat d'avancement : La Cellule Régionale du PNDP Extrême Nord en collaboration avec l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a organisé en 2008 deux seminaires à l'intention de 35 CCPM de l'Extrême Nord en vue de renforcer leurs capacités en matière de passation de marché selon les directives simplifiées de la Banque Mondiale et le Code national de passation.

Le premier séminaire a eu lieu du 9 au 19 Janvier 2008, dans les sites de Maroua, Yagoua et Kousseri où 91% des membres des 24 CCPM et les maitres d'ouvrages (maires) ciblés ont pris part au soit 153 personnes.

Le deuxième séminaire s'est déroulé à Maroua en octobre 2008 avec la participation de 70 membres de 12 CCPM soit un taux de participation de 84 %.

Les directives simplifiées de la banque mondiale ont été déroulées par un consultant international (1er séminaire) et par le SPM (au 2e séminaire) à raison de deux jours par site. Le contenu de la formation a porté sur les modules suivants :

- Introduction à la gestion fiduciaire ;
- Parties prenantes et responsabilités ;
- Planification ;
- Passation des marchés des biens travaux et services de consultants ;
- Gestion financière.

La formation sur le Code National de passation des marchés d'une durée de deux jours par, site également a été dispensée par deux cadres de l'ARMP et s'est articulée autour des modules ci après :

- Modes et procédures de passation des marchés publics ;
- Les opérations courantes dans les commissions de marché ;
- Le montage des dossiers d'appels d'offres et des demandes de cotation.

En plus de la CPPEN, l'équipe d'animation du séminaire a été appuyée par le SPM et le RFC.

Observation : Le 1er séminaire devrait se tenir initialement en décembre 2007, mais du fait de l'indisponibilité des formateurs, il s'est tenu en début d'année 2008.

Seule une commune invitée n'a pu participer à ces séminaires car l'exécutif communal n'est pas encore mis en place.

A la fin des séminaires, chaque commune a été dotée d'un paquet minimum constitué de documents ci dessus :

- Manuel de procédures de passation des marchés ;
- Recueil des fiches d'acteurs du système camerounais des marchés publics ;
- Guide du soumissionnaire ;
- Cahiers des clauses administratives générales ;
- Manuel des procédures de suivi de l'exécution des marchés ;
- Dossier type d'appel d'offres des marchés de travaux ;
- Dossier type d'appel d'offres des marchés de fourniture ;
- Registre des procédures et contentieux
- Code National est absent de cette liste.

A tous les participants ont été distribués les documents ci après :
- Circulaire du PM relative à l'application du code des marchés publics
- Document de formation de l'ARPM sur les procédures de passation des marchés
- Document de formation de la Banque Mondiale sur les procédures de passation des marchés
- Manuel des travaux pratiques

B2203 : Coaching des communes
Etat d'avancement : Les activités de coaching ont débuté en novembre 2008 et sont en cours d'exécution par l'OAL CAFIPASSE pour les communes de Kousséri et de Makary et par l'OAL CAPROVI pour les communes de Maroua Ier, Mokolo et Mogodé.
Observation : Le processus de sélection des coaches a commencé en janvier 2008 avec la proposition de la liste restreinte des coaches constituées de 12 OAL qui avaient été formés sur les cinq modules préalables au coaching dispensés par le CEFAM en 2006 (9) et en 2007 (3). En mars 2008, il s'en est suivi une formation de ces présélectionnés conjointement avec le PADDL EN.
La sélection des coaches a abouti au 3e trimestre 2008.

Difficultés rencont :
- Délai de réponse long des correspondances entre la CPPEN et la CNC. Il y a eu des mois d'échanges avec la CNC sur le choix de la méthode et les documents de sélection des coaches à utiliser.

C1101 : Formation des OALs
Etat d'avancement : L'atelier de formation des OAL de la province de l'Extrême nord à la démarche de planification participative locale et communale a eu lieu à Yagoua du 15 au 27 juillet 2008. Au cours de cet atelier, le PNDPEN a renforcé les capacités en matière de planification locale et communale de 17 élus locaux, 6 personnels communaux, 46 personnels d'OAL et 17 OAL. Cette formation s'est déroulée en 3 phases :
- une phase théorique où ont été déroulés les modules sur l'élaboration des PDL, des PDC, le suivi évaluation participatif, la comptabilité simplifiée, la maintenance des ouvrages, la prise en compte des aspects socio environnementaux, l'approche participative de la lutte contre contre le VIH/SIDA (par le responsable du GTP EN), la collecte et le prétraitement des données GPS par le cartographe de la MIDIMA).
- une phase pratique dans 5 communautés de la commune de Yagoua au cours de laquelle les participants scindés en 5 équipes ont déroulés les outils développés lors de la phase théorique;
- une phase de restitution des travaux de terrain où les participants ont pu relever les lacunes des équipes et les difficultés rencontrées sur le terrain.
Observation : A la fin du 3e trimestre, la CPPEN a reçu des 17 OAL le rapport de restitution de cette formation aux autres membres de leur structure.

C1201 : Définition des unités de planifications
Etat d'avancement : Après les missions d'explication sur la méthodologie de découpage des UPP effectuées au premier trimestre 2008, la CRPEN a reçu progressivement jusqu'en fin d'année la liste des UPP de chacune des 12 nouvelles communes de 2008.
Difficultés rencont : - Accompagnement lâche des communes au découpage des UPP. Le nombre élévé de communes 2007 couvertes et les activités qui y sont actuellement menées n'ont pas permis à la CRPEN d'accompagner les nouvelles dans cette activité sur le terrain.

C1202 : Sélection des OALs
Etat d'avancement : En 2008, le processus de sélection des OAL a abouti dans 22 communes sur 23 engagés.
La sélection est bloquée à l'étape de négociation de contrat dans la commune de Kousséri.
Observation : Le processus de sélection a commencé en janvier par l'invitation des OAL dans toutes les communes concernées. Son aboutissement a été progressif dès le mois d'août avec les premières communes soit un minimum de 8 mois. Les dernières communes ont abouti en novembre en raison de la reprise du processus dans ces communes dues certaines irrégularités.
Les contrats de 04 OAL (Moutourwa, Yagoua, Bogo et Tokombéré) sont financés sur fonds KFW tandis que les autres seront financés sur fonds C2D.
Difficultés rencont : - Faible appropriation de la procédure de recrutement par les CCPM et faible niveau des membres de certains Sous Commissions d'Analyse des Offres.
- Retard dans l'arbitrage de la sélection des OAL
(Il a fallu deux mois pour l'obtention de la non objection aux résultats des CCPM);
- Coïncidence de la fin de sélection avec la pleine saison des pluies. Ce qui a conduit à retarder la signature des contrats.
Recommandations : Pour les prochaines communes la CRPEN doit consacrer au moins une journée par CCPM/SCAO au rappel de la procédure et des principales étapes avant le début effectif des opérations de sélection.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Maroua II

Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL GIC ADER.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 11 novembre 2008 et les activités de terrain ont débuté le 11 décembre 2008 dont 01 UPP a été déjà couverte.
Difficultés rencont : -Faible implication du maire;
- Participation dégressive des populations aux réunions

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Gobo
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL SANA LOGONE
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 8 octobre 2008 mais démarrage le 1er décembre avec 03 équipes.
10 UPP ont actuellement été couvertes pour 20 attendus.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Kaï-Kaï
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL SANA LOGONE
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 16 octobre 2008, la préparation de terrain a débuté le 26 novembre 2008 et le début des travaux de terrain le 3 décembre 08 avec 04 équipes.
13 UPP ont été couvertes sur 42.
Observation : La fin des opérations de planification est prévue à la fin de février 2009.
Difficultés rencont : Problème de mobilisation dans certaines UPP

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Yagoua
Etat d'avancement : Contrat mis en oeuvre par l'OAL CERAD.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 15 novembre 2008, mais ce n'est que le 10 décembre 2008 que les travaux ont commencé avec l'atelier de lancement suivi du 14 décembre 2008 par le démarrage effectif des activités de planification sur le terrain.
A la fin de cette année, 05 UPP sur 40 prévues ont été couvertes
Observation : 03 équipes de planification de 05 personnes chacune dont un opérateur GPS
Difficultés rencont : Problèmes de logistiques et virement tardif de l'avance de démarrage

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Mokolo
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL PI PNVRA.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 1er novembre 2008.
Les travaux ont étés lancés le 09 décembre 2008 avec 07 équipes de 4 personnes pour couvrir les 42 UPP.
Actuellement 08 UPP ont été couvertes. La fin de couverture est prévue pour mi février 2009.
Observation : 1re tranche de paiement de la phase I a été payée.
Difficultés rencont : - Problème de choix des lieux de rencontre dans certaines UPP
- Faible participation des femmes dans les zones musulmanes

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Waza
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CADEPI.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 1er octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Kaélé
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL ADIE.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 08 octobre 2008. La période de sensibilisation et de collecte des données de base s'est étalée du 1er au 11 novembre 2008.
Le lancement officiel a eu lieu le 27 novembre 2008.
05 équipes de 4 personnes ont lancé les travaux de terrain le 29 novembre 2008.
A l'heure actuelle, 25 UPP ont été couvertes et 10 PDL déjà élaborés.
Observation : Pointage des infrastructures au GPS non réalisée.
Difficultés rencont : - Eloignement de certains villages satellites du village central de l'UPP;
- Oubli de certains villages dans la liste des UPP

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Moulvoudaye
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL GIC APD.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 22 octobre 2008.
Les activités ont commencé par la préparation du 10 au 13 novembre. Les travaux ont commencé sur le terrain le 17 novembre 2008 avec 02 équipes de 04 personnes chacune.
Actuellement, 11 UPP sur 19 ont été couvertes poour l'élaboration des PDL.
Aussi la formation sur le suivi évaluation participatif a été exécutée dans 03 UPP
Observation :
Difficultés rencont : - Eloignement de certains villages satellites du village central de l'UPP
- Insécurité liée à la présence des coupeurs;

- Indisponibilité de certains membres de l'équipe du fait du paludisme
Recommandations :

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Moutourwa
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL GEFRADER.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 14 novembre 2008.
Le démarrage a eu lieu le 12 novembre 2008. 07 équipes de 04 personnes pour 19 UPP ont été déployées sur le terrain.
Actuellement 07 UPP ont été couvertes.
Observation :
Difficultés rencont : - Eloignement de certains villages satellites de l'UPP du village central.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Ndoukoula
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL ALD Consult.
L'ordre de service de démarrage a été notifié le 31 octobre 2008.
Le démarrage des activités a eu lieu le 6 décembre 2008 par 04 équipes de 4 personnes.
11 UPP sur 11 déjà couvertes pour la planification
Observation :
Difficultés rencont : - Difficulté de mobilisation de certaines populations
- Faible implication des autorités municipales aux activités

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Maroua III
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL INSTRAD.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 28 novembre 2008.
Les activités ont été lancées le 16 décembre 2008.
Observation : La 1re tranche de la 1re Phase a été payée à l'OAL
Difficultés rencont : - Faible participation des femmes dans certaines zones notamment peules
- Indisponibilité des populations dans la matinée car populations proches de Maroua
Recommandations : Animation de groupes de femmes par une femme et à l'écart des hommes

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Mogodé
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CEDC.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 19 décembre 2008.
Le lancement des opérations de planification a eu lieu en décembre 2008.
Actuellement 01 UPP a été couverte.
Observation : 02 équipes de 05 personnes ont été constituées.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Makary
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL BIOCONCEPT.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 18 décembre, ce qui a permis à l'OAL de faire la collecte des données de base.
Le démarrage des opérations de planification est prévu en janvier 2009.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Meri
Etat d'avancement : Contrat exécuté par le SAILD
L'ordre de service de démarrage a été notifié le 31 octobre 2008 et le lancement de la planification a eu lieu du 4 au 5 décembre 2008 en présence des forces vives de la commune.
02 UPP sur les 22 actuellement couvertes.
Observation : Retard de 02 semaines.
02 équipes de planificateurs de 06 personnes pour couvrir les 22 UPP.
Le programme établi prévoit la fin des planifications le 22 février 2009, soit 1 mois avant la fin contractuelle.
1re tranche du contrat perçue.
Difficultés rencont : - Influence négative de certains chefs de villages qui limite la participation d'une franche de la population;
- Indisponibilité des populations

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Logone Birni
Etat d'avancement : Contrat exécuté par le SAILD
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 23 octobre 2008 et le lancement de la planification a eu lieu du 1er au 2 décembre 2008 en présence des conseillers, élites, autorités administratives, exécutif municipal.
04 UPP sur les 23 actuellement couvertes.
Observation : 02 équipes de 06 personnes chacune mise en place pour les 23 UPP.
Fin de la planification prévue le 22 février 2009.

Tranche de démarrage perçue
Difficultés rencont : - Existence des villages fictifs
- Mauvais libéllé de certains noms inexacts villages
- Allongement des travaux du fait de la mésentente entre les deux ethnies principales de la commune
- Indisponibilité des populations;
- Participation dégressive des populations dans certaines UPP
Recommandations : - Organiser des ateliers de lancement officiel où est présenté les différentes UPP et les villages qui les composent.
- Sensibilisation des populations lors de la préparation

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Mozogo

Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL ENVIRO PROTECT.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 24 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté le 10 décembre 2008 avec les séances d'information et de sensibilisation des autorités administratives, traditionnelles et municipales.
Collecte des données de base en cours
Observation : 04 équipes de planification composée de 04 personnes pour les 33 UPP.
Tranche de démarrage de la phase I perçue.
Retard dans le chronogramme.
Difficultés rencont : Inaccessibilité à certaines UPP de Montagne
Insécurité liée à la présence régulière des coupeurs de route.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Bogo
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL PI PNVRA.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 06 novembre 2008.
Les travaux ont été lancés avec 03 équipes de 4 personnes en décembre 2008.
Actuellement, 03 UPP ont été couvertes sur les 20 attendus.
Difficultés rencont : - Faible sensibilisation des populations au processus;
- Faible participation des femmes

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Kar-Hay
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL INSTRAD.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 20 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Maroua I
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL GIC APD.
L'ordre de service de démarrage a été notifié le 22 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Pette
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CADEGIE.
L'ordre de service de démarrage a été signé le 17 décembre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Mora
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CAPROVI.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 31 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.

C1203 : Exécution contrats OAL pour PDL/PDC/requêtes Tokombéré
Etat d'avancement : Contrat exécuté par l'OAL CADEPI.
La notification de l'ordre de service de démarrage a été signée le 23 octobre 2008.
Phase de terrain a débuté en décembre 2008.

C2201 : Formation, atelier et seminaires
Etat d'avancement : Formation du CPAP
L'atelier de formation du CPAR s'est tenu du 5 au 6 juin à Kaélé. Ce sont 9 maires, 2 députés, 2 représentants de la société civile et les représentants de tous les ministères sectoriels qui ont été imprégnés sur les attributions du CPAP, sur le rôle doit jouer chacun et sur l'évaluation / approbation des requêtes et PDC.
Au cours de cette formation, les élus locaux et les représentants de la société civile ont procédé à l'élection du Président et du Vice président du CPAP.
Le président est le maire de Dargala tandis le vice président est le maire de Guéré.

Formation des CPAC

En 2008, le PNDP EN a formé et installés officiellement les membres de 09 CPAC des communes disposant au moins une requête communautaire de financement de microprojet.

Dans un premier temps, du 25 au 26 août 2008 se sont tenus simultanément les formations de 7 CPAC.

Dans un deuxième temps en novembre a été organisé les formations des 2 derniers CPAC.

Ont participé à cette formation 225 membres sur 246 attendus soit un taux de participation de 92%.

Les participants suivant les départements se présentaient comme suit:

32 sur 33 pour le Logone et Chari (Makary) ;

47 sur 49 pour le Mayo-Kani (Kaélé, Moutourwa) ;

47 sur 49 pour le Mayo Danay (Kar hay, Gobo) ;

59 sur 66 pour le Mayo Tsanaga et le Diamaré (Mogodé et Ndoukoula).

40 sur 49 pour Mora et de Tokombéré dans le Mayo Sava.

C2301 : Atelier mise à niveau logiciel TOMATE

Etat d'avancement : Atelier de mise à jour de TECPRO / TOMPROJET

Du 17 au 27 mars 2008 Mbalmayo, le RRSE a pris part à l'atelier national sur la finalisation du cadre des résultats du Programme, la mise à jour des logiciels de suivi évaluation et l'élaboration des chronogrammes.

D1103 : Fonctionnement CPAP

Etat d'avancement : En début juillet 2008, le CPAR Extrême Nord a été constaté officiellement par arrêté du gouverneur de la région.

Au cours de l'année, deux sessions ont été tenues en août et une troisième en novembre 2008 à l'issue desquelles 06 requêtes communales ont été approuvées.

D1104 : Fonctionnement CPAC

Etat d'avancement : Mise en place des CPAC

Pour les premières communes, à la fin de cette année 2008, 09 arrêtés préfectoraux de constatation de la composition des CPAC ont été signés, à savoir : Mogodé, Ndoukoula, Kar hay, Moutourwa, Makary, Mora, Tokombéré, Gobo et Kaélé.

Observation : La CRPEN a adopté la stratégie de mise en place des CPAC en deux temps. Dans un premier temps, les 09 communes concernées par le montage de requêtes communautaires. Dans un deuxième temps, après l'élaboration des premiers PDL, les 14 autres communes seront concernées.

D1201 : Mise en oeuvre convention collaboration partenaire

Etat d'avancement : Elaboration des contrats programmes avec les délégations provinciales sectorielles

La CRPEN a signé les contrats programmes avec 04 délégations régionales à savoir : Travaux Publics, Santé Publique, Energie et Eau et Education de Base.

Dans le cadre de l'exécution des 04 contrats programmes en cours, la CPPEN a signé des contrats de services avec les sectoriels des délégations concernées pour le montage des requêtes et l'élaboration des référentiels de micro projet.

Pour ce qui est du contrat - programme avec PADDL EN /GTZ, il reste la rencontre entre la CRPEN et le PADDL EN dont le but était d'intégrer et d'harmoniser les différents amendements proposés par les deux hiérarchies et sortir la mouture finale. En mars 2008, la CPPEN a organisé conjointement avec le PADDLEN un atelier de formation des coaches. A la fin de l'atelier, une DP conjointe pour la sélection des coaches a été élaborée.

Coordination avec les partenaires

PADC

Au cours de l'année, la CRPEN a tenu deux réunions de concertation avec le PADC. Les résultats du découpage des unités de planification participative réalisées avec l'appui de la CRPEN dans certaines communes ont été partagés de même que la liste des MP à financer par le PADC.

Observation : L'élaboration du contrat programme avec la DPMINEP est en cours.

La non objection pour la signature d'un accord de partenariat avec la MIDIMA a été obtenue. La signature est prévue pour début 2009.

Un projet de convention avec la CRTV Maroua est aussi en cours.

D1301 : Atelier semestriel de bilan & programmation

Etat d'avancement : Du 1er au 5 septembre 2008, l'équipe de la CPPEN a participé à Bafoussam à l'atelier semestriel de revue et de programmation des activités du PNDP organisé par la CNC Une série de recommandations pour l'amélioration de la qualité des microprojets, la mobilisation des ressources et la bonne

gouvernance au sein du Programme ont été prises lors de cet atelier. Une lettre du Coordonnateur National a été adressée à la CPPEN afin d'assurer la mise en application desdites recommandations.
Observation :

D1302 : Réunion mensuelles suivi prestataires et OAL
Etat d'avancement : Au cours de l'année 02 réunions mensuelles avec les OAL ont pu se tenir en novembre et en décembre 2008.

D2102 : Achat Matériel informatique
Etat d'avancement : Au cours de l'année, le plan de passation de marchés des équipements complémentaires a été mis en exécution par une commission ad hoc d'acquisition des biens et services ayant permis la livraison à la CRP EN des consommables informatiques et quelques matériels informatiques complémentaires notamment :
- 02 ordinateurs portables;
- 02 ordinateurs fixes dont un serveur;
- 02 imprimantes;
- 02 scanners;
- etc

D2103 : Achat Matériel et mobilier de bureau
Etat d'avancement : Au cours de l'année, le plan de passation de marchés des équipements complémentaires a été mis en exécution par une commission ad hoc d'acquisition des biens et services ayant permis la livraison à la CRP EN des mobiliers et matériels de bureau complémentaires notamment :
- vidéo projecteur et fax
- splits
- téléviseurs et lecteurs DVD
- sur tenseurs et de rallonges
- moquettes et rideau
- lits picots et moustiquaires
- réfrigérateurs
- petit équipement de cuisine

D2105 : Travaux réhabilitation
Etat d'avancement : Durant une partie des mois d'août et de septembre, il y a eu des travaux d'aménagement du local abritant la CPPEN. Ces travaux ont permis d'améliorer le cadre de travail où désormais certains cadres ne sont plus doublés dans des bureaux.

D2201 : Prise en charge consultants fonctionnaires
Etat d'avancement : Le personnel fonctionnaire n'accuse aucun arriéré de salaire en 2008.
Observation : Au cours du 2e semestre 08, la prise en charge des fonctionnaires s'est faite au niveau de la CPPEN.

D2202 : Prise en charge des consultants privés
Etat d'avancement : Le compromis entre la KFW et la CNC sur le paiement des salaires du personnel privé a été trouvé en juin 2008. Ainsi en juillet, la situation des 7 mois d'arriérés de salaires de 2008 ont été régularisés. Depuis lors, le personnel consultant privé connaît une prise en charge régulière.
Toutefois, il demeure encore 4 mois d'arriérés de salaires de l'année 2007 au personnel consultant privé.

D2203 : Prise en charge Personnel d'appui
Etat d'avancement : Le personnel d'appui qui accusait aussi des arriérés de salaires au 1er semestre est rentré dans ses droits au début du 3e trimestre 2008. Cependant, quelques mois d'arriérés de salaires de l'année 2007 demeurent pour certains.

D2213 : Frais de télécommunication/internet
Etat d'avancement : L'exécution du plan de passation de marchés 2008 a permis à la CRP EN :
L'acquisition et l'installation Autocommutateur pour les communications internes;
La mise en place d'une connexion Internet par V-SAT
La mise en place d'un réseau informatique.

D3101 : Elaborat° du PTBA
Etat d'avancement : L'atelier d'élaboration du PTBA 2009 a regroupé les différentes unités de gestion du PNDP (Adamaoua, Nord, Extrême nord, Sud, Centre, Ouest et CNC), les partenaires financiers (CAA), le MINEPAT et s'est étalée du 30 novembre au 6 décembre 2008 à Kribi.
Il a été question au cours de cet atelier de définir une stratégie pour aboutir à une fin heureuse de la 1re Phase du PNDP et de préparer la 2e phase qui passe par l'atteinte des valeurs cibles de la 1re phase, la satisfaction du cadre

des résultats, l'amélioration de la performance en terme de qualité et temps d'exécution des MP et la bonne gouvernance.

L'atelier s'est déroulé suivant l'articulation ci après :

- Finalisation des projets de PTBA de chaque unité de gestion
- Présentation des projets de PTBA en plénière suivie de commentaires, débats et recommandations
- Ajustement des PTBA des unités de gestion et présentation en plénière des PTBA ajustés.

Le principal résultat produit obtenu pour le PNDP EN et les autres unités de gestion a été l'élaboration du PTBA 2009 qui doit encore être validé par le Comité National d'Orientation et Pilotage.

Observation : Au cours de l'atelier, les participants ont été informés de l'introduction par le gouvernement auprès de la Banque Mondiale de la requête de prorogation de la Phase I jusqu'au 30 septembre 2009 et de l'initiation par la Banque Mondiale d'un programme de pré évaluation de la Phase II du PNDP.

L'atelier a aussi permis aux participants de participer à la réflexion en cours à la CNC sur :

- la maîtrise d'ouvrage déléguée des MP ;
- le mode opératoire de la sélection des OAL

D3102 : Elaboration chronogrammes activités

Etat d'avancement : Les chronogrammes trimestriels et mensuels d'activités ont été régulièrement réalisés de manière participative et réajustés au fur et mesure dans l'année.

D3201 : Missions de suivi et de supervision

Etat d'avancement : Les missions effectuées dans la région au cours de l'année 2008 ont permis de :

- participer aux séminaires de formation des CCPM ;
- superviser la sélection des OAL, l'exécution de leur contrat;
- identifier et faire la reconnaissance des sites microprojets communaux et communautaires pour le montage des requêtes ;
- superviser le montage des requêtes; la sélection des entrepreneurs et contrôleurs;
- amorcer la mise en place du SIG dans la CPPEN ;
- sensibiliser les nouvelles communes sur le guide de découpage des unités de planification participative ;
- informer et prendre contact avec les communes de 2008 ;
- justifier les pièces comptables

D3308 : Fonctionnement du SGI

Etat d'avancement : Les rapports périodiques d'activités ont été régulièrement élaborés par la CRPEN notamment :

- 2 rapports trimestriels;
- 1 rapport semestriel;
- 1 rapport annuel

L'archivage électronique des résultats obtenus par les cadres et des produits des prestations (requêtes, rapports d'études) obtenus a été réalisé sur disque dur externe et sur les CD.

D4101 : Signalétique PNDP

Etat d'avancement : C'est en cette année 2008 que la CRP EN a finalement acquis une enseigne lumineuse PNDP au niveau de ses locaux et des plaques indicatrices au niveau de certaines grandes artères de la ville de Maroua.

D4105 : Couverture médiatique activité

Etat d'avancement : Certaines activités déroulées au cours de cette année ont connu une couverture médiatique par la radio et la télévision (CRTV) notamment les séminaires de formations des CCPM, l'atelier d'imprégnation des élux locaux, l'atelier de formation des OAL, les sessions du CPAP.

D4115 : Abonnements média

Etat d'avancement : L'abonnement au quotidien national Cameroun Tribune, a été fait au mois de mars de cette année 2008.

Site 07 : Cellule Provinciale du Nord

AC000 : appui financier aux communes

Etat d'avancement:
Les activités de la Cellule Provinciale du Programme pour le Nord se poursuivent normalement. Les fonds C2D mis à la disposition a permis de financer tous les Micro-projets en instance à Pitoa,Guider,Lagdo ,Barndaké et Touboro .

Observations:
Nous notons des retards dans l exécution des MP dus à la rupture de stock du ciment et d autres matériaux de construction sur le marché.
Le chantier de Nakong à Barndaké a connu aussi quelques difficultés de libération des lieux par les occupants.

Recommandations:
Actualiser les prochaines requêtes en tenant compte des coûts des matériaux

AC106 : Electrification rurale : Béka
Etat d'avancement :
Le microprojet de la commune de Béka concerne l'électrification de cette ville et financé sur fonds PPTE.
Le réseau électrique est construit et le câble déroulé sur trois mille (3000) mètres.
Par ailleurs, le groupe électrique est disponible sur le site. La construction de l'abri groupe est achevée. La pré réception technique a estimé que les travaux de réalisation de l'abri groupe na sont pas satisfaisants.
L'Entreprise abandonnant le chantier malgré la mise ne demeure a contraint le maître d'ouvrage à résilier le marché. Le sectoriel a estimé le coût des travaux restant à 3 750 000 Francs CFA. Il a été demandé au maire de relancer la sélection pour achever les travaux. Le processus est ainsi relancé par le maire. Le prestataire sélectionné a achevé les travaux qui ont été réceptionnés.

Observations :
Le marché de IMACOM a été résilié.

AC106 : Electrification rurale : Figuil
Etat d'avancement :
Le microprojet de la commune de Figuil concerne l'électrification du village Lam et financé sur fonds IDA.
Le réseau basse tension est entièrement construit. La construction de l'abri du groupe électrogène est achevée et le groupe installé et fonctionnel
Le projet est achevé réceptionné provisoirement et fonctionnel

Observations :
La Commune a inscrit une ligne de fonctionnement du réseau électrique dans son budget 2008.
On constate un manque d'engouement de la population à se connecter et à optimiser le fonctionnement de ces installations.
Recommandations :
Programmer une rencontre avec le maire et la population pour trouver une solution pour optimiser son fonctionnement.

AC107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Lagdo
Etat d'avancement:
Le microprojet de la commune de Lagdo qui concerne la construction des salles de classes dans certaines localités de la commune a été reparti en 3 lots.
Les travaux de construction des salles de classe dans les communautés de Gouna et Bamé entrepris par l'établissement DAMOZA pour le lot N° 2 sont achevés et réceptionnés définitivement. Ces salles de classe sont fonctionnelles.
Les travaux de construction du bloc administratif du lycée de Lagdo et la construction de quatre (04) salles de classe (lot 1 dudit microprojet) exécutés par OBED NET sont également achevés et réceptionnés provisoirement.
Les salles de classe sont fonctionnelles depuis la rentrée scolaire.
Concernant le Lot 3 pour la livraison des tables bancs, la Lettre commande est finalement passé et attribué avec un grand retard car le maire n'avait pas pu lancer le marché compte tenu des moyens financiers limités pour le fonctionnement de la Commission. A ce jour les équipements ont été livrés, réceptionnés et mis en service.

Observations:

AC113 Aménagement des pistes rurales : Commune de Guider

Etat d'avancement
Les travaux de réhabilitation de la route Mindjiwa –Windé Loué avec construction d'un pont sur le Mayo Mindjiwa et financés sur fonds PPTE ont été réceptionnés définitivement le 30 juin 2007.
Observations:
On note une bonne tenue des ouvrages d'arts construits sur ce tronçon (pont et autres buses et dalots) pendant la dernière saison pluvieuse.
Toutefois, les culées subissent les effets d'affouillement.

Recommandations :
Le nouvel exécutif de la commune de Guider doit continuer à veiller à la protection des culées et à l'entretien de cette route par le comité de gestion.

AC201 : Construction complexe commercial à: Pitoa
Etat d'avancement:
Le marché de construction du complexe commercial de Pitoa attribué à l'entreprise Hamadou Bouba a été résilié. Le taux d'exécution estimé est de l'ordre de 25% selon une équipe technique composée des ingénieurs de la Délégation Provinciale des Travaux Publics et des cadres de la CPP Nord. Une évaluation des travaux restant a été faite .Le marché pour la sélection d un nouveau prestataire est lancé

Observations:
IL y a eu un retard dans la sélection d un nouveau prestataire
Recommandations :
Les opérations de sélection doivent s'accélérer pour voir le microprojet achevé.

AC201 : Construction marché : Touroua
Etat d'avancement:
Le microprojet communal de Touroua concerne la construction d'un marché communal et il est financé sur fonds PPTE.
Les travaux démarrés le 28 Décembre 2007 sont achevés et le microprojet réceptionné provisoirement.
Les boutiques et les hangars ont été attribués aux commerçants qui se déploient lentement à leur occupation. Les nouvelles installations du marché sont belle et bien fonctionnelles.

AL000 : Appui financier aux communautés
Etat d'avancement:
Les objectifs de financement des microprojets communautaires de la CRP sont de 36 microprojets. Toutes les requêtes montées sont approuvées par les CPAC et les marchés sont lancés Lagdo, Guider, Béka et Pitoa. Le processus a abouti pour certains et sont d'ailleurs en cours d'exécution Quant à Tcholliré, les marchés attribués sont réceptionnés sauf celui de Djaba dont les travaux sont suspendus à cause de lé saison non propice aux travaux hydrauliques.

Recommandations:
Boucler le processus de sélection et démarrer tous les travaux.

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Nioua
Etat d'avancement:
Les puits réalisés par SOCAC dans les communautés de Nioua sont fonctionnels. Toutefois les deux pompes à exhaure manuelle sont hors d'usage. Les usagers utilisent les puisettes pour s'approvisionner en eau.

Recommandations:
Procéder à la réparation des pompes. Redynamiser les comités de Gestion des Points d'Eau.

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Guidjiba
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux puits réalisés par l'établissement DJALLO sont achevés et réceptionnés.

Recommandations:
Organiser et Redynamiser les comités de Gestion des Points d'Eau.

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Gamba
Etat d'avancement:
Les deux puits réalisés dans les communautés de Gamba sont réceptionnés provisoirement et fonctionnels.

Recommandations:
Redynamiser les comités de Gestion des Points d'Eau.

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Hormbali
Etat d'avancement:
Les deux puits réalisés dans les communautés de Hormbali sont réceptionnés provisoirement et fonctionnels.

Recommandations:
Créer et Redynamiser les comités de Gestion des Points d'Eau.

AL103 : Approvisionnement en eau potable : Communauté de Djaba
Etat d'avancement:
Les travaux de construction de trois (03) puits dans cette localité ont été suspendus pour cause de saison non propice.

Recommandations:
Les travaux doivent reprendre afin de procéder au captage en période d'étiage.

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Ouro Kessoum
Etat d'avancement:
Les travaux de construction du centre de santé de Ouro Kessoum sont achevés, réceptionnés définitivement et et la structure sanitaire est fonctionnelle.

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Pelgué
Etat d'avancement:
Le bâtiment abritant le centre de santé de Pelgué a été réceptionné définitivement et la structure sanitaire est fonctionnelle.

AL105 : Construction/réhabilitation/équipement CSI : Communauté de Poussane
Etat d'avancement:
Le bâtiment abritant le centre de santé de Poussane a été réceptionné provisoirement et ce centre est fonctionnel.

AL106 : Electrification rurale : Communauté de Djaouro Douri

Etat d'avancement:
Le contrat initial dont l'adjudicataire est l'Entreprise Wolarbé a été résilié. Les travaux restants ont été réévalué et le coût a excédé l'enveloppe disponible. Il revient ainsi au Bénéficiaire de compléter les fonds. Le maire de la Commune de Lagdo s'est engagé à travers sa Commune à apporter sa contribution et relancer l'Appel d'Offres.

Observations:
Le maire a obtenu l'adoption du conseil municipal lui autorisant de financer l'excédent du coût du microprojet.

Recommandations:
Le maire doit déclencher le processus de sélection à partir de la liste des prestataires agréés par AES/Sonel.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Sabongari

Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Sabongari sont achevés. La réception définitive a été effectuée et les salles sont fonctionnelles.

Observations:
Les deux salles de classe sont équipées et fonctionnelles.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Sakdjé

Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Sakdjé sont achevés et la réception provisoire est intervenue le 09 Décembre 2007.La réception définitive a eu lieu

Observations:

Ces salles de classes sont fonctionnelles. Pendant la saison pluvieuse, il a été constaté des suintements dans une salle de classe. Le bâtiment étant encore sous garantie, le prestataire a été rapidement saisi et les anomalies corrigées. La réception définitive des travaux a été prononcée.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Badjengo

Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe au CES de Badjengo sont achevés et le bâtiment a été réceptionné définitivement. Les salles de classes sont fonctionnelles.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de RAM

Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de RAM sont achevés et le bâtiment réceptionné définitivement. Les salles de classes sont fonctionnelles.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Tongo

Etat d'avancement:
Les travaux de construction de deux salles de classe dans la communauté de Tongo sont achevés et la réception définitive effectuée.

Observations:
La procédure de sélection d'un prestataire devant livrer les tables bancs a été effectuée par la communauté et les tables bancs livrés et réceptionnés.

AL107 : Construction/équipement/infrastructures scolaires : Communauté de Tchamba

Etat d'avancement:
Les travaux de construction du bloc administratif au CES de Tchamba sont achevés, réceptionnés provisoirement

Observations:
Les travaux ont avancé à un rythme très lent, plusieurs mises en demeure ont été adressées au prestataire d'achever les travaux.

AL113 : Aménagement des pistes rurales : Communautés de Riao-Djanga-Ouro Bobowa

Etat d'avancement:
Les travaux de réhabilitation de la route Riao-Djanga-Ouro Bobowa ont démarré au mois de février 2007 et sont achevés le 28 juin 2007. La réception provisoire a été effectuée le 30 juin 2007. La reception définitive a eu lieu au cours de cet année.

Observations:
Le passage des véhicules ou tout autre moyen de locomotion a été effectif cette saison pluvieuse qui du reste a connu une forte pluviométrie.

Recommandations:
Le comité de gestion de cette route doit déjà se mettre au travail durant cette saison sèche afin de procéder à l'entretien. Une opération de reboisement avec des espèces à forte absorption d'eau est envisagée. Un enrochement est également nécessaire pour la protection des culées qui subissent des affouillements sérieux.

B2101 : Equipement des communes en matériel informatique et outils de gestion

Etat d'avancement:
La CPP Nord a remis le matériel informatique à quatre communes que sont Figuil, Lagdo, Béka et Tcholliré.

B2102 : Prise en charge des agents communaux

Etat d'avancement:
Le processus de recrutement des agents communaux est lancé dans dix communes de la province du Nord. Cinq (08) communes ont fait aboutir le processus. Ce qui a permis à 4 d entre elle de bénéficier du matériel informatique.

C1202 : Sélection des OALs

Etat d'avancement:
La procédure de découpage en unités de planification des communes de Bibémi, Poli, Madinging Poli,Bastcheo,Gaschiga Ngong Rey-bouba,Garoua I,II et III entrées dans le PNDP en 2007 et 20008 a été effectuée ;
La présélection suite à l'appel à manifestation d'intérêt est faite pour les communes de 2007 et les communes de Touboro et Beka;
Les demandes de proposition ont été retirées par les présélectionnés ;
La sélection des OAL a été faite ;
Les contrats des OALs ont été signés ;
Les OALs ont été introduites dans les différentes Communes.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes CPP Nord

Etat d'avancement:
Les Organismes d'Appui Local (OAL) sous contrat avec le PNDP et devant accompagner les communes du Nord sont à pied d'oeuvre et leurs travaux s'exécutent bien dans l'ensemble.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Béka

Etat d'avancement:
- Le contrat de l'OAL Enapil a été résilié. L'OAL ASDAPE a été sélectionné et se déploie sur le terrain.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Commune de Figuil

L'OAL Gender Lenses a été sélectionné pour l'accompagnement de la commune de Figuil après résiliation du contrat de l'OAL VDD. Cet OAL est sur le terrain depuis le mois de novembre 2006.

Etat d'avancement:
L'état d'avancement des activités est le suivant:
-15 PDL élaborés sur 15 prévus;
-03 thèmes de formation aux responsables des 15 CC ;

Observations:
Les activités en cours d'élaboration connaissent un retard par rapport au chronogramme arrêté. Quoique la facture du prestataire soit payée, celui-ci demeure absent de sa commune d'intervention. Des lettres d'observations et de mise en demeure lui ont été adressées à cet effet.

Recommandations:
Envisager la résiliation de son contrat.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Commune de Guider
L'OAL ENAPIL est chargé de l'accompagnement de la commune de Guider.
L'état d'avancement des activités est le suivant:
Etat d'avancement:
- 61 PDL élaborés sur 61 prévus;
- 62 requêtes de financement montées sur 62 prévues;
- 61 CC légalisés sur 61 prévus;
- 4 modules de formation dispensés aux CC sur 4 prévus aux 61 CC.
- Le PDC est élaboré et approuvé par le CPAP,

Observations:
Les activités de l'OAL sont finalement achevées. Plusieurs lettres de mise en demeure ont été adressées à cet OAL durant sa prestation.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Tcholliré
L'OAL VIPOD est chargé de l'accompagnement de la commune de Tcholliré et à ce jour, l'état d'avancement des activités est le suivant :

Etat d'avancement:
-25 PDL élaborés sur 25 prévus;
-22 requêtes de financement montées sur 26 prévues;
-25 CC légalisés sur 25 prévus;
-04 modules de formation dispensés aux 25 CC sur 04 prévus.

- Le PDC élaboré et validé.

Observations:
On note un retard dans l'exécution du contrat.
L'OAL est en activité sur le terrain et prévoit boucler son contrat avant lé 31 Décembre 2008.

Recommandations:
L'OAL doit remettre son rapport d'achèvement..

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Pitoa
L'OAL APESS a déposé son rapport d'achèvement à la CPP.

Etat d'avancement:
Les résultats de l'accompagnement de la commune de Pitoa se présentent ainsi:
- 33 PDL élaborés sur 33 ;
- 33 CC légalisés sur 33;
- 34 requêtes montées sur 34;
- 04 modules de formations dispensés;
- PDC élaboré et validé par le CPAP.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes : Lagdo
L'OAL GIC ADER est chargé de l'accompagnement de la commune de Lagdo.
L'état d'avancement des activités est le suivant:

Etat d'avancement:
- 33 PDL élaborés sur 33 ;
- 34 requêtes de financement montées sur 34;
- 33 CC légalisés sur 33;
- 4 modules de formation dispensés aux CC sur 4 prévus.

Le PDC élaboré et en attente de validation.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Barndaké

Etat d'avancement:
-13 PDL élaborés sur 13 ;
-02 modules de formation.
Observations:
L'OAL a repris ses activités contractuelles après avoir suspendu celles-ci pour cause de non règlement de ses factures. Actuellement toutes ses factures sont règlées.

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Mayo Oulo

Etat d'avancement:
L'OAL Gender Lenses est chargé de l'accompagnement de cette commune et à ce jour, l'état d'avancement des activités est le suivant :
-20 PDL élaborés sur 36 ;

Observations:
On note un retard dans l'exécution du contrat, ceci est du à l'absence de personnel sur le terrain.
Par ailleurs, on remarque que à cause du manque de personnel, l'OAL est incapable d'assurer l'exécution de deux contrats.
L'absence de cohérence des calendriers empêche le suivi des activités de l'OAL, car lorsque le personnel est sur le terrain à Mayo Oulo, la commune de Figuil est abandonnée.
Des lettres d'observations et de mise en demeure lui ont été adressées à cet effet.

Recommandations:
Envisager la résiliation de son contrat..

C1203 : Exécution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes Touboro

Etat d'avancement:
Le contrat de l'OAL Enapil a été résilié. Suite à la relance de la sélection, l'OAL INSTRAD a été retenu, le contrat a été signé et les équipes sont sur le terrain.

D1201 : Mise en œuvre convention de collaboration

Etat d'avancement:
La CPP Nord a déjà enregistré la signature par 18 maires des protocoles d'accord cadre avec les communes.
Une convention avec la MEADEN est également signée.

D3201 : Missions suivi et supervision
Etat d'avancement:
Les missions de suivi des cadres de la CPP se résument au suivi des activités du Programme que sont le suivi de l'exécution des microprojets, celui des activités des OALs ainsi que celle des agents communaux

Site 10 : Cellule Provinciale du Sud

AC103 : Approvisionnement en eau Djoum

Etat d'avancement : Le microprojet a été résilié. Faire fonctionner régulièrement l'ouvrage et programmer la réception définitive.

Recommandations : Faire fonctionner régulièrement l'ouvrage et programmer la réception définitive.

AC103 : Approvisionnement en eau Mintom

Etat d'avancement : Le microprojet est déjà réceptionné à titre provisoire.

Observations : Pour l'instant, la Commune ne fait pas fonctionner l'ouvrage de façon permanente.

AC103 : Approvisionnement en eau Sangmélima

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 7 forages équipés de pompes à motricité humaine dans quelques communautés de l'ex-Commune Rurale de Sangmélima ont été achevés et le microprojet réceptionné à titre provisoire le 7 décembre 2007.

Recommandations : Programmer la réception définitive.

AC103 : Approvisionnement en eau Mvangan

Etat d'avancement : Le microprojet d'adduction en eau potable (par forage) de la ville de Mvangan a été achevé et réceptionné à titre provisoire le 27 février 2007. Le Comité de Gestion et l'équipe de maintenanciers ont déjà été formés par le prestataire E.I.C.

Recommandations : Programmer la réception définitive.

AC103 : Approvisionnement en eau Akom II

Etat d'avancement : Microprojet résilié. Ce microprojet est en cours de reformulation en vue du lancement d'un nouveau marché de construction de quelques puits forés (grâce au reliquat en compte).

Observations : Le PNDP se propose de rapatrier les fonds y relatifs du compte de ce projet vers le compte spécial du PNDP.

AC106 : Electrification rurale Zoetélé

Etat d'avancement : Le microprojet d'électrification du tronçon Nkilzock - Mbedoumou - Engoutouk - Ndangeng, en réseau monophasé dans la Commune de Zoétélé est déjà résilié.

Recommandations : Le Maire doit saisir l'Autorité chargée des Marchés Publics (Premier Ministre) afin de passer ce marché par la procédure de gré à gré avec AES/SONEL.

AC107 : Construction /équipement/infrastructures scolaires Campo

Etat d'avancement : L'évaluation technico-financière des travaux effectués est finalisée.

Observations : Le PNDP se propose de résilier ce marché au détriment de la Commune de Campo et de rapatrier les fonds y relatifs du compte de ce projet vers le compte spécial du PNDP.

AC201 : Construction marché Ngoulemakong

Etat d'avancement : Le complexe commercial de Ngoulemakong est opérationnel.

Recommandations : Programmer la réception définitive.

AC201 : Construction marché Bipindi

Etat d'avancement : Le marché de construction d'un complexe commercial - gare routière a été finalement attribué à l'entreprise CBTP.

Difficultés rencontrées : Le premier site initialement choisi pour l'implantation du microprojet a été utilisé pour la construction de l'hôtel de ville. Un nouveau site a été choisi, ce qui a entrainé la production d'un certificat de donation de terrain et d'un nouveau plan de masse, puis la soumission des nouveaux plans d'exécution et note de calcul au visa de l'Ingénieur du marché. Tout ceci a contribué à retarder le démarrage des travaux.

AC201 : Construction marché Ma'an

Etat d'avancement : Le marché avait d'abord été résilié, puis à la suite d'une séance de travail avec l'ARMP, le prestataire a été notifié pour la reprise des travaux. Un avenant lui a été notifié à cet effet.

Observations : Ces travaux avancent mais avec un retard sur le calendrier de base révisé.

Recommandations : Programmer la réception provisoire de l'ouvrage.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Biyan
Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine pour le compte de la communauté de Biyan est achevé et réceptionné à titre provisoire depuis le 16 octobre 2008.

Recommandations : Programmer la réception définitive en janvier 2009 tout en veillant à l'effectivité de la mise en place du Comité de Gestion.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Nkoumadjap-Nkolfong

Etat d'avancement : Le marché de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de Nkoumadjap-Nkolfong est pratiquement achevé. Titulaire du marché : Ets MSM.

Observations : L'un des puits est en tombé en panne juste avant l'arrivée de la commission de réception des travaux en décembre 2008.

Recommandations : Corriger le puits en panne et reprogrammer la réception provisoire du microprojet.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Ebamina

Etat d'avancement : Le microprojet de la communauté d'Ebamina n'a pas encore démarré. Il a été reformulé ré-attribué à Ets SAMEL selon la recommandation de l'ARMP.
Observations : Il est désormais question de deux puits à construire et non de 5 sources à aménager. Le nouveau devis est en cours de finalisation en vue du démarrage des travaux.

AL103 : Approvisionnement en eau potable AKEE (Assam-Kouma-Elone-Ebae)

Etat d'avancement : Environ 30% des travaux de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine et d'aménagement d'une source dans la communauté de EBAE-ASSAM-KOUMA-ELONE ou AKEE ont été réalisés. Titulaire du marché : Ets ERICO and BROTHERS BP 15651 Yaoundé.

Observations : Le prestataire accuse déjà un restard non justifié car les travaux ont démarré en sept 2008.

Recommandations : Adresser une lettre d'observation au prestataire par rapport au retard qu'il accuse.

AL103 : Approvisionnement en eau potable NEN (Nyamvende-Ebolboum-Ndjaf)

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine et d'aménagement d'une source dans la communauté de NEN sont en cours de réalisation depuis septembre 2008. Titulaire du marché : Ets ANNEX & CO BP 11415 Yaoundé.

Observations : Le prestataire accuse un retard.

Recommandations : lui adresser une lettre d'observation par rapport au retard.

AL103 : Approvisionnement en eau potable AKOMBEM (Akoatala-Mbeka'aII-*Mv*

Etat d'avancement : Les travaux de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté AKOMBEM sont en cours d'exécution. Titulaire du marché : ETS AKISU BP 7072 Yaoundé.

Observations : Le prestataire accuse déjà un retard.

Recommandations : Adresser une lettre d'observation au prestataire par rapport au retard.

AL103 : Approvisionnement en eau potable MINLA'AMIZIBI

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable pour le compte de la communauté de MINLAMIZIBI est achevé. La réception provisoire est prévue en janvier 2009. Titulaire du marché : ETS PRESTATIONS DE SERVICES BP 211 EBOLOWA.

AL103 : Approvisionnement en eau potable NTOUMINK (Ntoumba-Minkok)

Etat d'avancement : Les travaux de construction de trois puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté NTOUMINK sont presque achevés. ETS ANNEX & CO BP 11415 Yaoundé.

Observations : Il reste quelques corrections à faire en vue de la réception provisoire.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Mebane II-Yen-Kobi

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de MEBANE II-YEN-KOBI vient d'être achevé. Titulaire du marché : ETS MAK BUILDING BP 6522 YAOUNDE.

Recommandations : Programmer immédiatement la réception provisoire du microprojet.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Nnemeyong

Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement de 4 sources d'eau potable pour le compte de la communauté de Nnemeyong est achevé et réceptionné à titre définitif depuis 2006.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Akontangan-Djop-Doum

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine et réhabilitation de 2 puits dans la communauté de AKONTANGAN-DJOP-DOUM-MELEN est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Ebemvock

Etat d'avancement : Le marché d'aménagement de 7 points d'eau potable dans la communauté d'Ebemvock a été finalement résilié depuis le 14 février 2008.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Nyambibete-Nko Mveng

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine et réhabilitation d'un puits dans la communauté de NYABIBETE-NKONG-MVENG est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 19 novembre 2008.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Miatta-Djouze-Abouelon

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de DJOUZE-MIATTA-ABOELON est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 19 novembre 2008. Titulaire : Ets CODIPRO.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Akonetye-MeyosIII-Minkomesseng

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de MEYOS III-MINKO'OMESSENG-AKONETYE est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 14 octobre 2008. Titulaire du marché : Ets MSM BP 4323 Ydé.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Nlomoto (Nkomakak; Nyabitande.

Etat d'avancement : Les deux puits achevés pour le compte de la communauté de Nyabitandé ont été réceptionnés au cours du mois de juin 2007. Ce marché a été finalement résilié le 14 février 2008.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Mebane I-Bidoumba-Alat II

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois (03) puits dans la communauté de : MEBANE I-BINDOUMBA-ALAT II est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : Ets CODIPRO, BP 618 Sangmélima.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Mabiogo

Etat d'avancement : Microprojet de la phase pilote, achevé en 2004 et réceptionné à titre définitif.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Meyos-Obam-Akom-Akak-Eleng

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté d'AKOM-ELENG-MEYOS-OBAM-AKAK est achevé et réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : Ets MONGO NLAM.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Essong-Mfem-Ayene-Alat I

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine et réhabilitation de 2 puits dans la communauté de AYENE-MFEM-ESSONG est achevé et réceptionné à titre provisoire depuis le 18/04/2008. Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES.

Difficultés rencontrées : Le puits d'Essong d'une profondeur d'environ 19 m a vu son débit chuter pendant la période de garantie et le clapet anti retour ne fonctionne pas bien.
Recommandations : Le prestataire a été sommé de rendre fonctionnel ce puits en vue de la réception définitive du microprojet. dans le cas contraire, la procédure de résilisiation sera amorcée.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Endengue-Djoum-Vil-Akombinyem

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux (02) puits et réhabilitation de deux (02) puits dans la communauté de : ENDENGUE-AKOMBINYENG-DJOUM VILLAGE est achevé et a été réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : Ets CODIPRO.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Avebe-Avobengon-Otombong

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de AVEBE-AVOBENGON-OTOMBONG est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 14 octobre 2008. Titulaire du marché : Ets MMZ.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Amvam-Efoulan-Mendoum

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de MENDOUNG-EFOULAN-AMVAM est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 14 octobre 2008. Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Mbouma-Mbomela-Alop-Melen

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté de MBOUMA-MBOMELA-ALOP-MELEN est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 14 octobre 2008. Titulaire du marché : Ets EMYLER et FRERES.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Minko'o-Nkan

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine et réhabilitation d'un puits dans la communauté de MINKO'O-NKAN est achevé réceptionné à titre définitif. Titulaire du marché : Ets CODIPRO, BP 618 Sangmélima.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Akak-Afan

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 3 puits d'eau potable équipés de pompes à motricité humaine dans la communauté d'Akak est enfin achevé et réceptionné à titre définitif.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Nyabessang-Nnemeyong

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de 2 puits d'eau potable pour le compte de la communauté de Nyabessang est achevé et réceptionné à titre définitif depuis 2006. Les 2 puits fonctionnent normalement.

AL103 : Approvisionnement en eau potable Nkongôp-Efoulan II

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de trois puits d'eau potable à Nkongôp-Efoulan II est achevé depuis 2006 et réceptionné à titre définitif.

AL105 : Const/réhabil/équip CSI Nkolafendenk-Mellen

Etat d'avancement : Arrêt des travaux à Nkolafendek depuis la pose des portes par le prestataire Ets MOZA. Les enduits ne sont pas achevés.
Observations : La réaction de la Commune de Djoum est attendue.

Recommandations : La résiliation du marché est à envisager.

AL105 : Const/réhabil/équip CSI Nkolenyeng-Okpweng

Etat d'avancement : Le matériel et les équipements pour le Centre de Santé Intégré de la Communauté Nkolenyeng-Okpweng ont été réceptionnés au cours du mois de juin 2007. Titulaire du marché : Ets MABURIN SERVICES.

AL105 : Const/réhabil/équip CSI Akok

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un Centre de Santé Intégré pour le compte de la communauté d'Akok-Efoulan II est achevé et réceptionné à titre définitif depuis le 07/07/2006.

AL106 : Electrification rurale Assok

Etat d'avancement : Microprojet pilote achevé et réceptionné depuis 2004.

AL106 : Electrification rurale FONABI (Fon- Nkol-Adjap-Bi...)

Etat d'avancement : Le marché d'électrification de la communauté FONABI a été attribué à ETS L'AVENIR. Les travaux sont assez avancés (Tous les poteaux sont placés).

Recommandations : Suivre particulière ce microprojet conjointement avec AES/SONEL.

AL106 : Electrification rurale EOM (Ekombitie-Oveng Otolo Mbe

Etat d'avancement : Le marché d'électrification de la communauté EOM avait été attribué à l'entreprise MSM. Les travaux sont encore au stade des fouilles.

Recommandations : Suivre particulièrement ce microprojet conjointement avec AES/SONEL.

AL107 : *Construction/équipement/infrastructures scolaires* Tya'assono-Minkan Mengale

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle pour le compte de la communauté Minkan mengale est achevé et réceptionné définitivement.
Le microprojet de construction de logements pour maîtres à Tya'assono est achevé et réceptionné à titre définitif depuis l'année dernière.

Recommandations : Renforcer l'APE en vue de la maintenance des ouvrages.

AL107 : *Construction/équipement/infrastructures scolaires* Nsebito-Asseng-Tom-Akom (NATA)

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à deux salles de classe pour le compte de la communauté Nsebito-Asseng-Tom-Akom est achevé et réceptionné définitivement depuis l'année 2006.

Recommandations : Renforcer l'APE en vue de la maintenance des ouvrages.

AL107 : *Construction/équipement/infrastructures scolaires* Messama II-Mfoulakom

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'une école maternelle pour le compte de la communauté Minkan mengale est achevé et réceptionné définitivement.

Recommandations : Renforcer l'APE en vue de la maintenance des ouvrages.

AL107 : *Construction/équipement/infrastructures scolaires* Boucle du Ntem I (Melen II...)

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un bâtiment à deux salles de classe pour le compte de la communauté Melen II est achevé et réceptionné définitivement.

AL107 : *Construction/équipement/infrastructures scolaires* Mvi'ilimengale

Etat d'avancement : Le premier microprojet de la communauté de Mvi'ilimengale est celui de la construction d'un bâtiment à deux salles de classe, microprojet pilote achevé depuis 2004.
Le 2e microprojet de Mvi'ilimengale, d'équipement de l'école publique en puits, latrines et tables bancs est achevé et réceptionné définitivement depuis 2006.

Difficultés rencontrées: Le comité de gestion n'est pas assez opérationnel.

Recommandations : La Commune doit renforcer le processus d'appropriation des microprojets communautaires achevés.

AL107 : *Construction/équipement/infrastructures scolaires* Bouandjo (ADBM)

Etat d'avancement : La construction de l'école maternelle de Bouandjo, exécutée en régie, est achevée et le microprojet réceptionné à titre définitif.

AL107 : *Construction/équipement/infrastructures scolaires* BIMVALOM (Bitsogmam-Mvamedjap-

Etat d'avancement : Le microprojet de construction de deux salles de classe et de réfection d'une toiture dans la communauté BIMVALOM est en cours d'achèvement. Titulaire du marché : ETS NDOWECAM BP 13777 Yaoundé.

Observations : Ce microprojet accuse déjà un retard.

Recommandations : Adresser une lettre d'observation au prestataire au sujet du retard.

AL107 : *Construction/équipement/infrastructures scolaires* BIA-BIA (Soumou-Mekom-Doum O.)

Etat d'avancement : Les travaux de construction de l'école maternelle à deux sections dans la communauté BIA BIA sont en cours d'exécution mais ne sont pas assez avancés (stade élévation des murs). Titulaire du marché : ETS NDOWECAM BP 13777 Yaoundé.

Observations : Ce microprojet accuse un retard.

Recommandations : Adresser une lettre d'observation au prestataire afin d'éviter d'agraver le retard.

AL111 : Foyer communautaire Biboulemam

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un foyer communautaire dans la communauté de Biboulemam est achevé et réceptionné définitivement depuis 2006.

AL201 : Construction marchés Nlomoto (Nkomakak; Nyabitande.

Etat d'avancement : Le microprojet de construction d'un marché à Nkomakak est achevé et réceptionné définitivement depuis 2006.

Observations : Les marchés périodiques sont organisés mais il faut une assistance de la Commune pour appuyer le comité de gestion dans la gestion du marché.

AL304 : Site écotouristique Nkoelon-Mvini

Etat d'avancement : Le microprojet d'aménagement d'un site éco touristique à Nkoelon est achevé et réceptionné à titre définitif depuis l'année 2006.

Observations : Le Comité de gestion fonctionne normalement.

B2101 : Equipement communes en matériel informatique et outil gestion CRP Sud

Etat d'avancement : Les Communes de Ngoulemakong, Bengbis et Zoétélé ont déjà été équipées en outil informatique.

B2102 : Prise en charge des agents communaux CRP Sud

Etat d'avancement : Deux agents communaux sont déjà pris en charge, celui de Bengbis depuis le mois de Décembre 2007 et celui de Zoétélé depuis le mois de février 2008.

B2202 : Renforcement des capacités pers/commissions communales CRP Sud

Etat d'avancement : Six (6) communes ont été formées cette année par l'ARMP sur les procédures de passation des marchés publics, ce qui porte à 21 le nombre total des Communes déjà formées.

C1101 : Formation des OALs CRP Sud

Etat d'avancement : Cinq (5) OALs (soit 14 personnes au total) d'accompagnement des Communes 2007 ont été formés en août 2008, ce qui porte à 31 le nombre total d'OALs déjà formés dans le cadre du PNDP et à 67 le cumul de personnels d'OAL formés.

C1201 : Définition des Unités de planification CRP Sud

Etat d'avancement : Les Communes 2007 ont été découpées en 108 UPP au total, ce qui porte à 315 le cumul d'UPP déjà définies dans la Province du Sud.

C1202 : Sélection des OALs CRP Sud

Etat d'avancement : Etat d'avancement : Six (06) OALs d'accompagnement des Communes 2007 sont déjà connus. Il s'agit de :

- ADECOL pour la Commune de Meyomessala,
- PLANET SURVEY pour la Commune de Lolodorf,
- ATIPAD pour la Commune de Mvengue
- CAIPE pour la Commune de Biwong-Bane
- CEPFILD pour la Commune de NIETE.
- CPDD pour la commune de Mengong.

C1203 : Execution contrat des OALs/PDC/PDL/requêtes CRP Sud

Etat d'avancement : Le bilan de l'exécution des contrats des OALs d'accompagnement des Communes 2006 est le suivant :

- 107 PDL élaborés et validés par les CPAC/COMES ;
- 428 formations statutaires réalisées ;
- 6 PDC en cours de finalisation ;
- 107 requêtes communautaires élaborées.

Pour ce qui est des Communes 2007, les 108 PDL sont en cours d'élaboration.

C2201 : formation/atelier/seminaire CRP Sud

Etat d'avancement : Les CPAC de Bengbis, Sangmélima, Mintom, Meyomessi, Bipindi et Olamze ont été formés au cours de l'année.
Observations : La formation du CPAC de Kye-Ossi reste attendue.

C2301 : Atelier mise à niveau logiciel TOMATE CRP Sud

Etat d'avancement : Le RPSE a pris part à l'atelier de validation du cadre des résultats et de mise à jour du SGI tenu à Mbalmayo du 17 au 27 mars 2008.

Le CPT a participé à l'atelier d'arrêt de compte 2007 et de mise à jour du SGI, tenu à Mbalmayo du 20 au 30 mars 2008.

C2501 : Formation des accoucheuses traditionnelles CRP Sud

Etat d'avancement : Dans le cadre du PDPP, l'activité formation des accoucheuses traditionnelles a été entièrement exécutée. 60 au total ont été formées.

C2502 : Format° enseig niv 1&2 aux tech ORA et appr minori CRP Sud

Etat d'avancement : 45 enseignants au total ont été formés au techniques ORA et d'apprentissage des minorités.

C2503 : Format° pygmées aux soins élémentaires de santé CRP Sud

Etat d'avancement : Au total 6 pygmées ont été formés aux soins élémentaires de santé.

C2504 : Accompagnement des cté par OALs ds la meo PDPP CRP Sud

Etat d'avancement : Les OALs recrutés pour l'accompagnement des Communes dans le cadre du PDPP sont :

1- ATIPAD pour les Communes de Djoum et Oveng;
2- CAGE de DEVELOPPEMENT pour la Commune de Mintom;
3- PLANET SURVEY pour les Communes de Campo et Lokoundjé;
4- RAPID pour les Communes de Bipindi et Lolodorf;
5- FODER pour les Communes d'Akom II et Nyete.

Ces OALs ont déjà démarré leurs activités sur le terrain.

C2505 : Fonctionnement plate forme de mise en oeuvre PDPP CRP Sud

Etat d'avancement : Toutes les 9 plates formes et comités techniques ont déjà été mis en place et certaines (Plate forme de Djoum en l'occurrence) fonctionnent normalement tandis que d'autres attendent les moyens prévus avant de commencer.

Par ailleurs, les décisions préfectorales ont déjà été prises pour formaliser toutes les plates formes.

C2506 : Appui à la citoyenneté des peuples pygmées CRP Sud

Etat d'avancement : Au total, 285 cartes nationales d'identité et 430 actes de naissance ont été établis.

D2102 : Matériel informatique CRP Sud

Etat d'avancement : Tous les cadres de la CRP/Sud sont dotés d'outils informatiques. Le RRSE et le CPTR ont acquis de nouveaux ordinateurs.

D3101 : Elaboration du PTBA CRP Sud

Etat d'avancement : Le PTBA 2009 a été élaboré à l'issue de l'atelier tenu à Kribi du 30 novembre au 05 décembre 2008.

D3302 : Enquête annuelle de suivi CRP Sud

Etat d'avancement : L'enquête annuelle de suivi a eu lieu en octobre 2008. Les résultats sont déjà disponibles.

Recommandations : Respecter les différentes étapes de la procédure telles que définies dans le Code des Marchés Publics.

Annexe 3 : Liste des microprojets mis en œuvre (fichier Excel)
